

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35



ประกวดโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2561

งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี) ระยะที่ 1



หัวข้อที่ 1 ข้อมูลโครงการ

หัวข้อที่ 2 ผลสำเร็จของงาน

หัวข้อที่ 3 การบริหารจัดการน้ำ

หัวข้อที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

หัวข้อที่ 5 ปัญหา อุปสรรค

เรื่องเดิม

ด้วยตำบลควนโนรี อยู่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (คลอง LMC) ประชาชนส่วนใหญ่ทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก เช่น ปลูกข้าว ปลูกผัก เกษตรผสมผสาน ปาล์มน้ำมัน ทำสวนยางพารา และเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนเกษตรกรจำนวน 70 ราย ได้เข้าร่วมโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาข้าว) ปี 2560 แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ทำการเพาะปลูก ได้รับน้ำชลประทานจากโครงการฯ ไม่ทั่วถึง

สจจ. 35 ได้รับการร้องขอโครงการจาก องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี จึงได้ลงพื้นที่พิจารณาความเหมาะสม และความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนที่จะจัดทำแผนงานจัดระบบน้ำเป็น 2 ระยะ โดย **ระยะที่ 1 ปี 2561 เป้าหมาย 600 ไร่** และระยะที่ 2 ปี 2562 เป้าหมาย 780 ไร่


วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำและกระจายน้ำในพื้นที่ ม.4 และม.5 ตำบลควนโนรี จำนวน 600 ไร่
2. สนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว)
3. มีทางลำเลียง สำหรับขนส่งเพื่อนำปัจจัยการผลิตและผลผลิต เข้า-ออกพื้นที่การเกษตร
4. เพื่อให้เกษตรกรหันกลับมาทำการปลูกพืชชนิดต่างๆ ตรงตามความเหมาะสมของพื้นที่
5. เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพ และรายได้เพิ่มมากขึ้น


หัวข้อที่ 1 ข้อมูลโครงการ

พื้นที่ดำเนินการ


บ้านหนองครก หมู่ที่ 4 และบ้านตูปะ หมู่ที่ 5 ตำบลควนโนรี อำเภอดงพญาเย็น จังหวัดปัตตานี อยู่ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โดยรับน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 600 ไร่

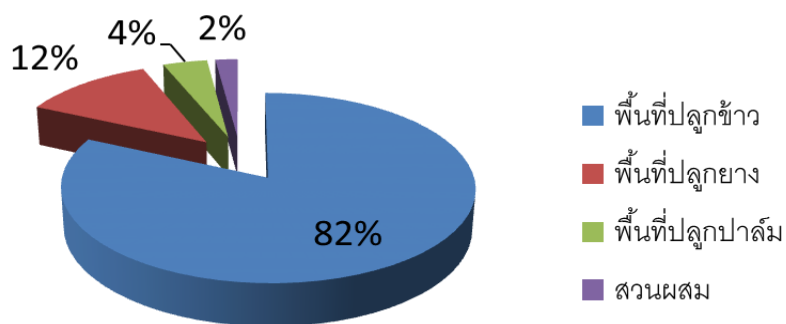

ที่มาข้อมูล : เกษตรตำบลควนโนรี

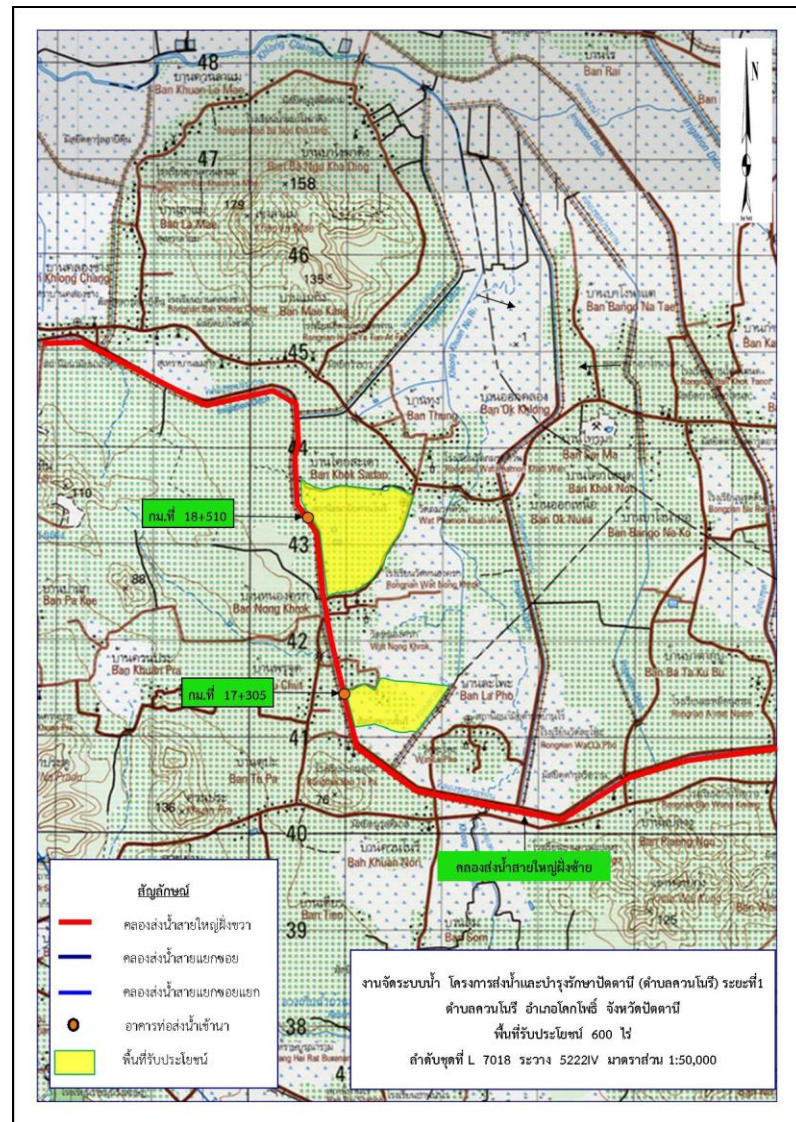

พื้นที่ดำเนินการ

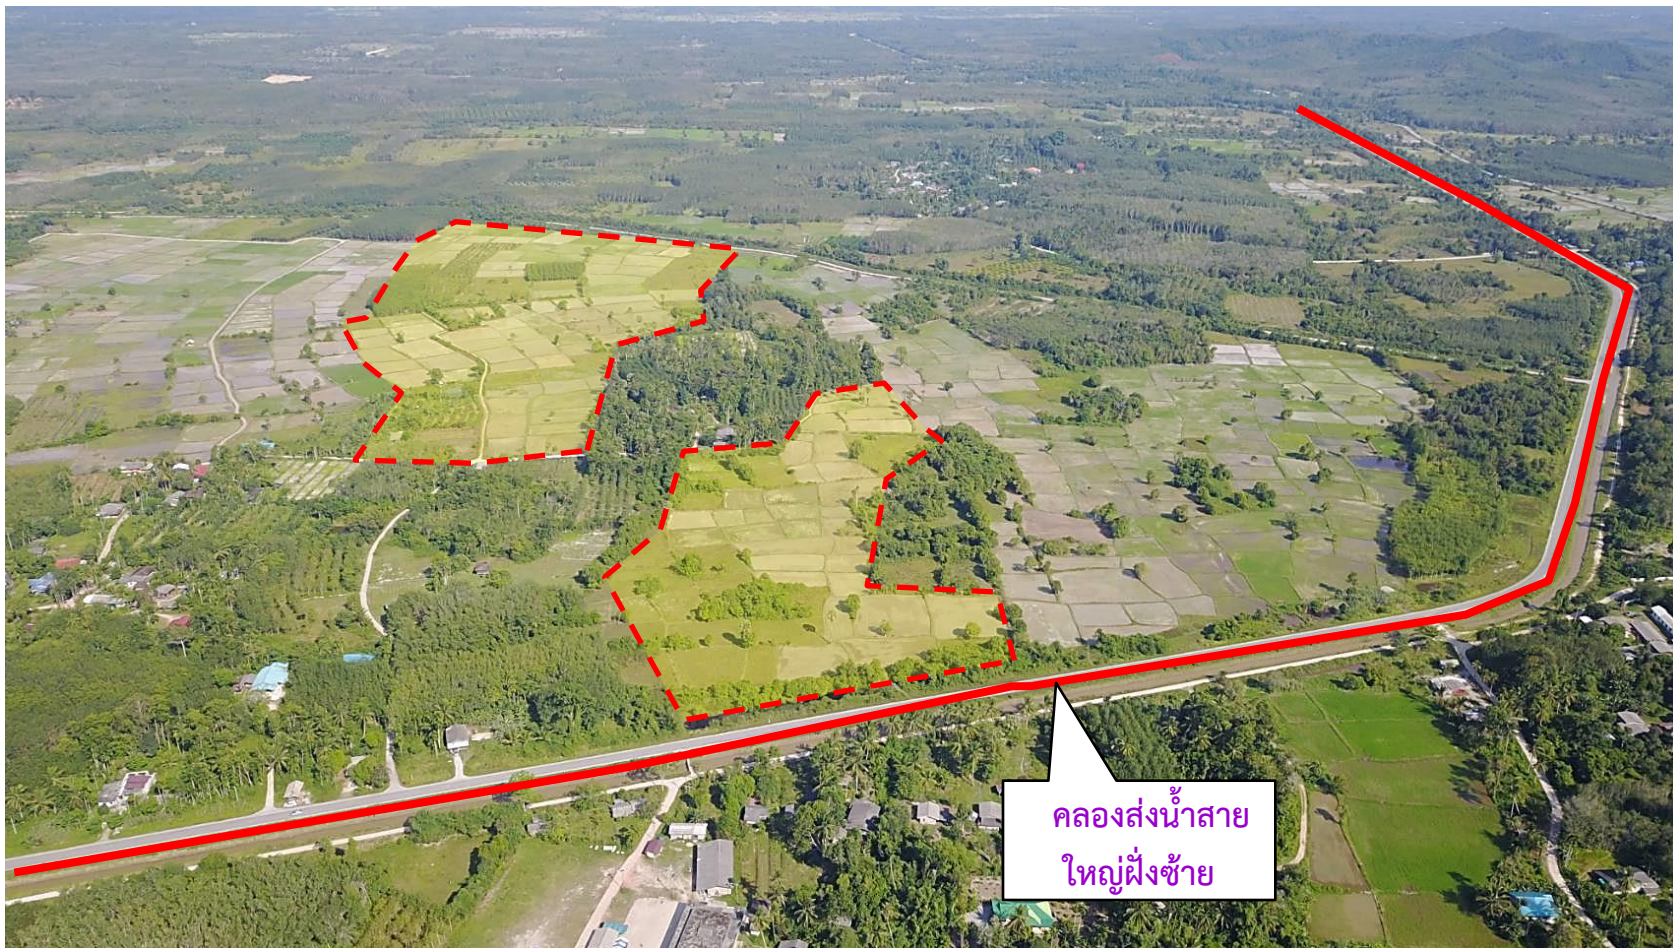


พื้นที่ดำเนินการ




ลักษณะโครงการ

คูส่งน้ำตาดคอนกรีต (L4) ปากคูกว้าง 1.70 เมตร ลึก .060 เมตร ก้นคูกว้าง 0.50 เมตร
ทางลำเลียง กว้าง 2.50 เมตร ความยาวรวม 3,300 เมตร
อาคารประกอบรวม 103 แห่ง
ปริมาณการส่งน้ำ 0.150 ลบ.ม. / วินาที

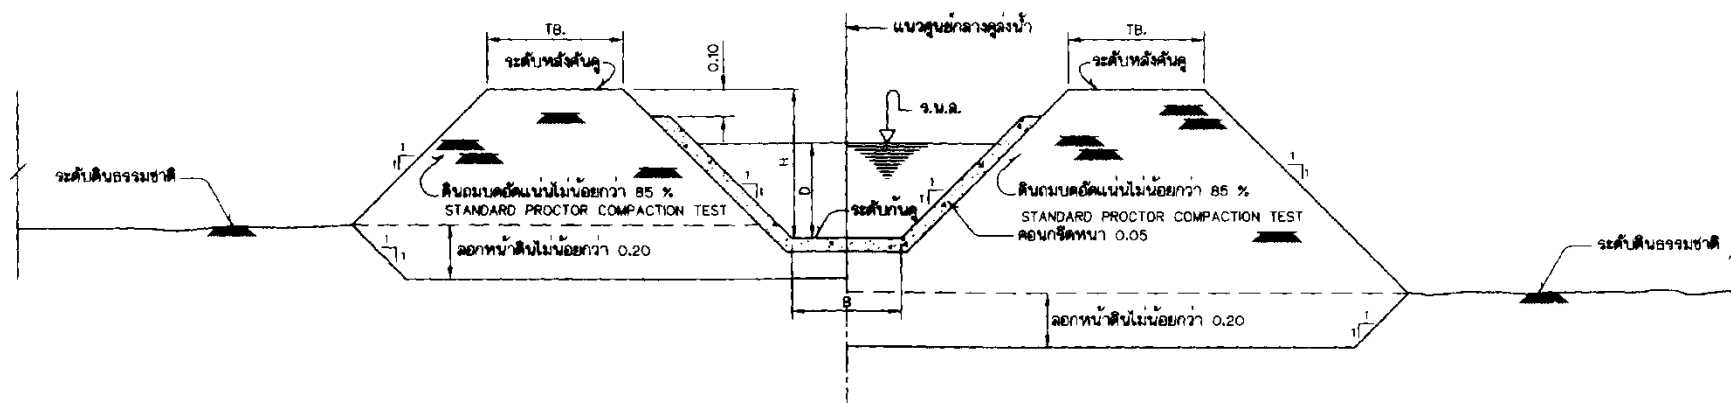

รูปตัดตามขวาง กรณีเป็นดินถม

ลักษณะโครงการ

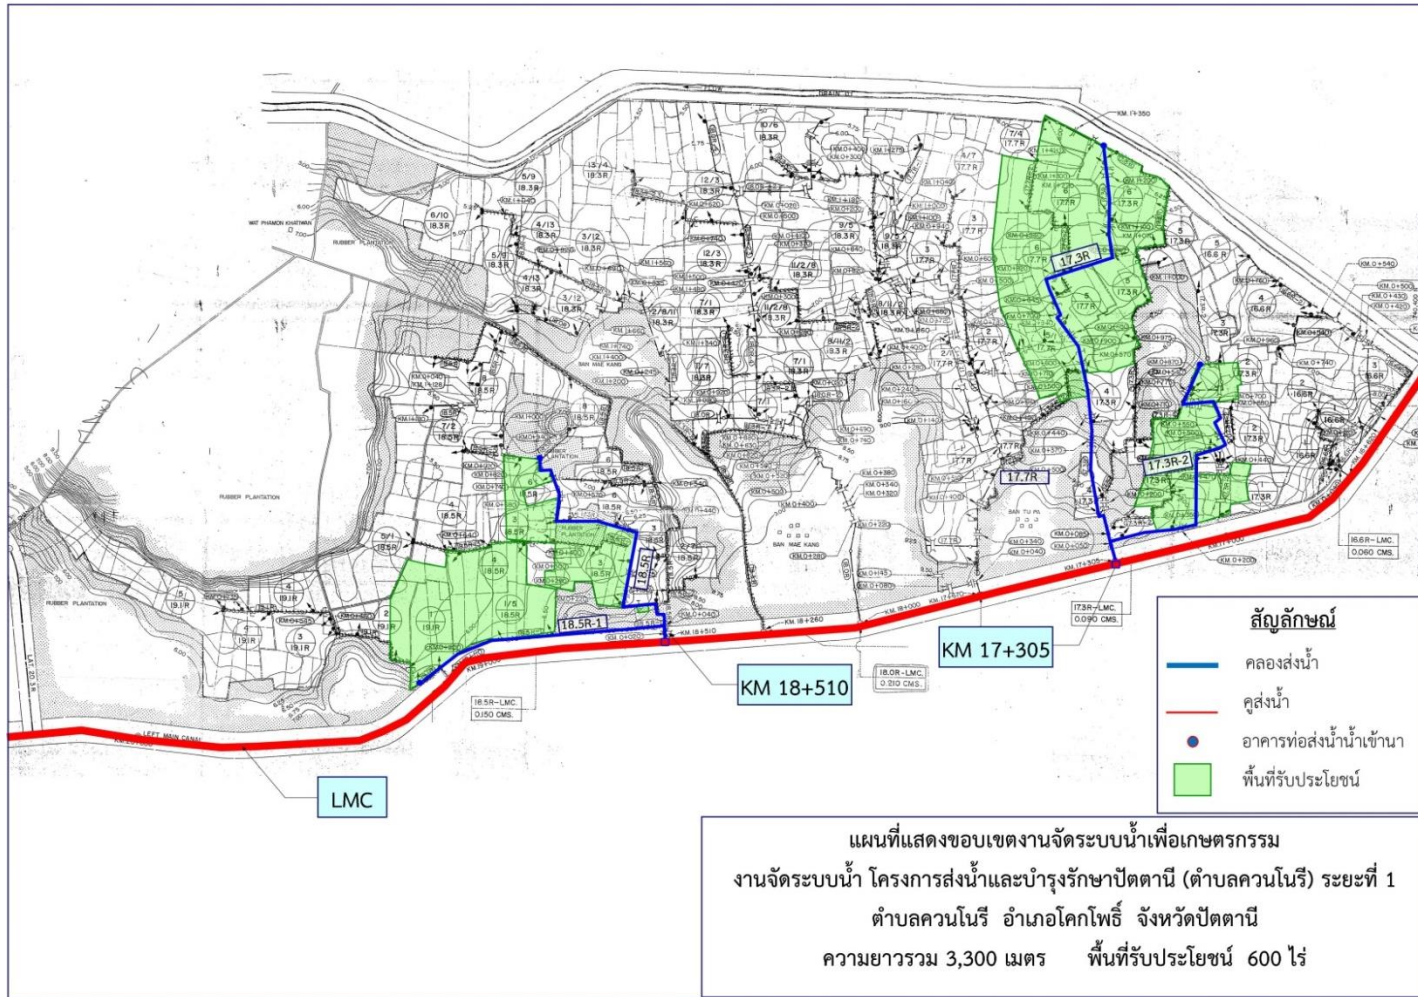

แสดงแนวคูส่งน้ำ
ทั้งหมด 4 สาย
คูสาย 17.3R
คูสาย 17.3R-2
คูสาย 18.5R
คูสาย 18.5R-1


แผนที่แสดงขอบเขตงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม
งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี) ระยะที่ 1
ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ความยาวรวม 3,300 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่

หัวข้อที่ 1 ข้อมูลโครงการ

ลักษณะโครงการ



ลักษณะโครงการ

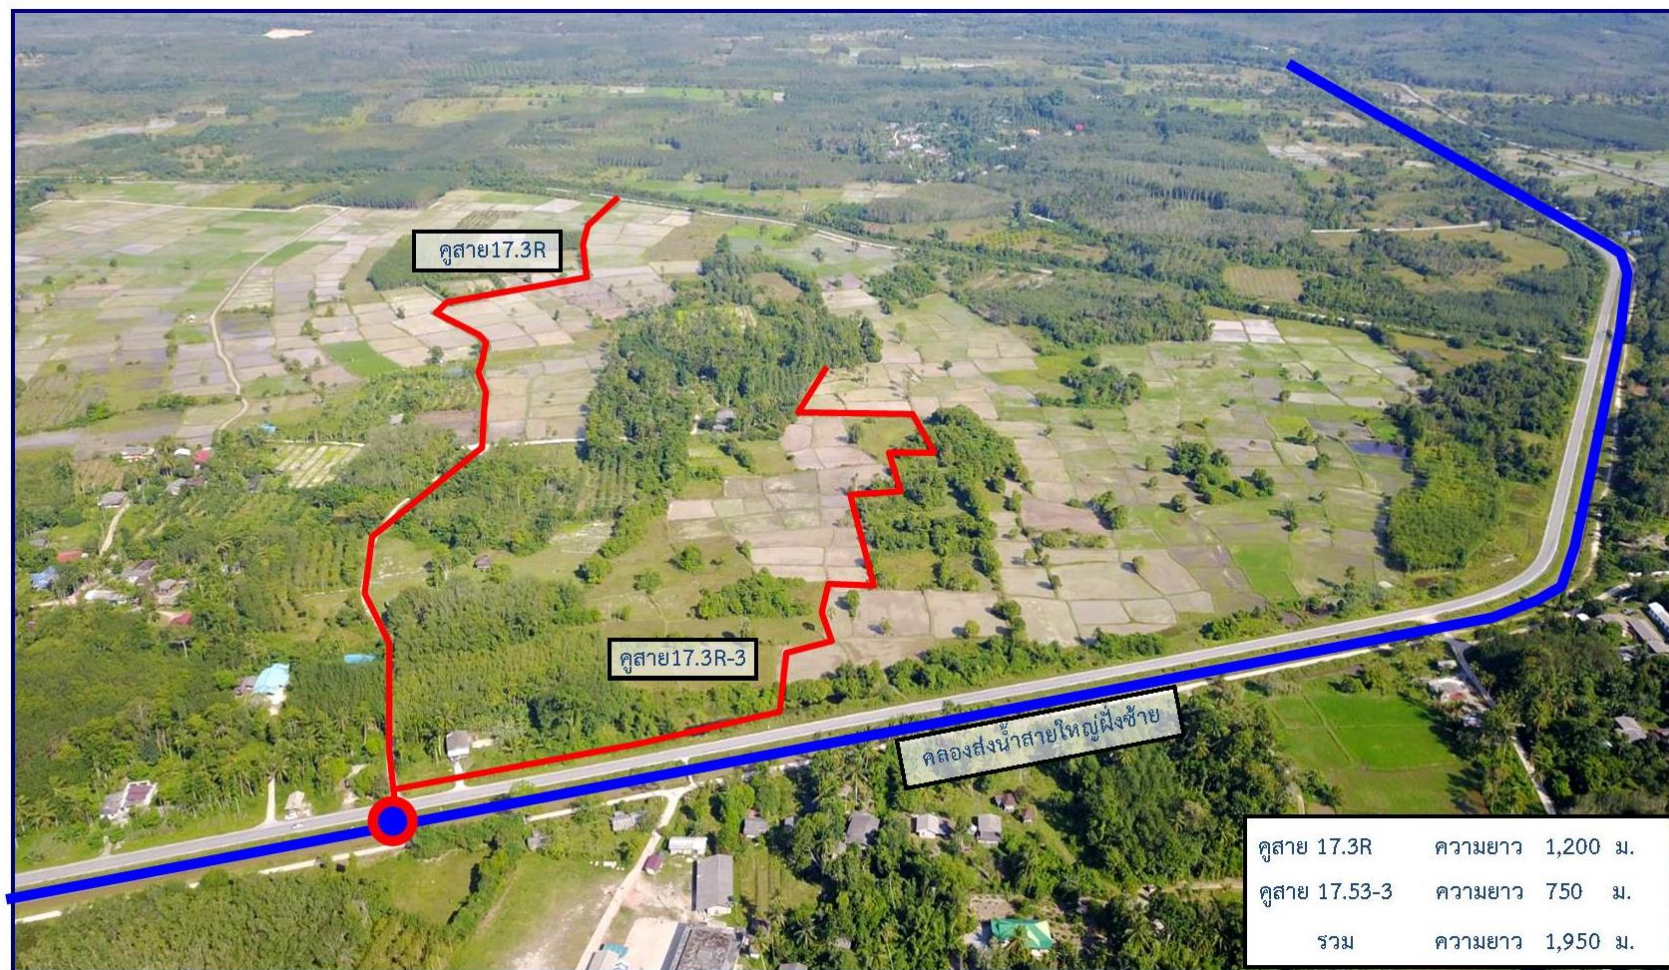

หัวข้อที่ 2 ผลสำเร็จของงาน

ก่อนก่อสร้าง

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)				วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี ๒๕๖๑	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประ กว ด ราคา	วิธี พิเศษ	วิธีตกลง ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี ๒๕๖๑	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติในปี ๒๕๖๑ (เดือน/ปี)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)	
๑	แผนงานและ โครงการจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรม	งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี) ระยะที่ ๑	๖๐๐ ไร่	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-		พ.ย.๖๐	ส.ค.๖๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	


คาดว่าจะลงนาม
ในสัญญา พ.ย 60

หัวข้อที่ 2 ผลสำเร็จของงาน

ก่อนก่อสร้าง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณงานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำปาด (ตำบลควนโนรี) ระยะที่ 1

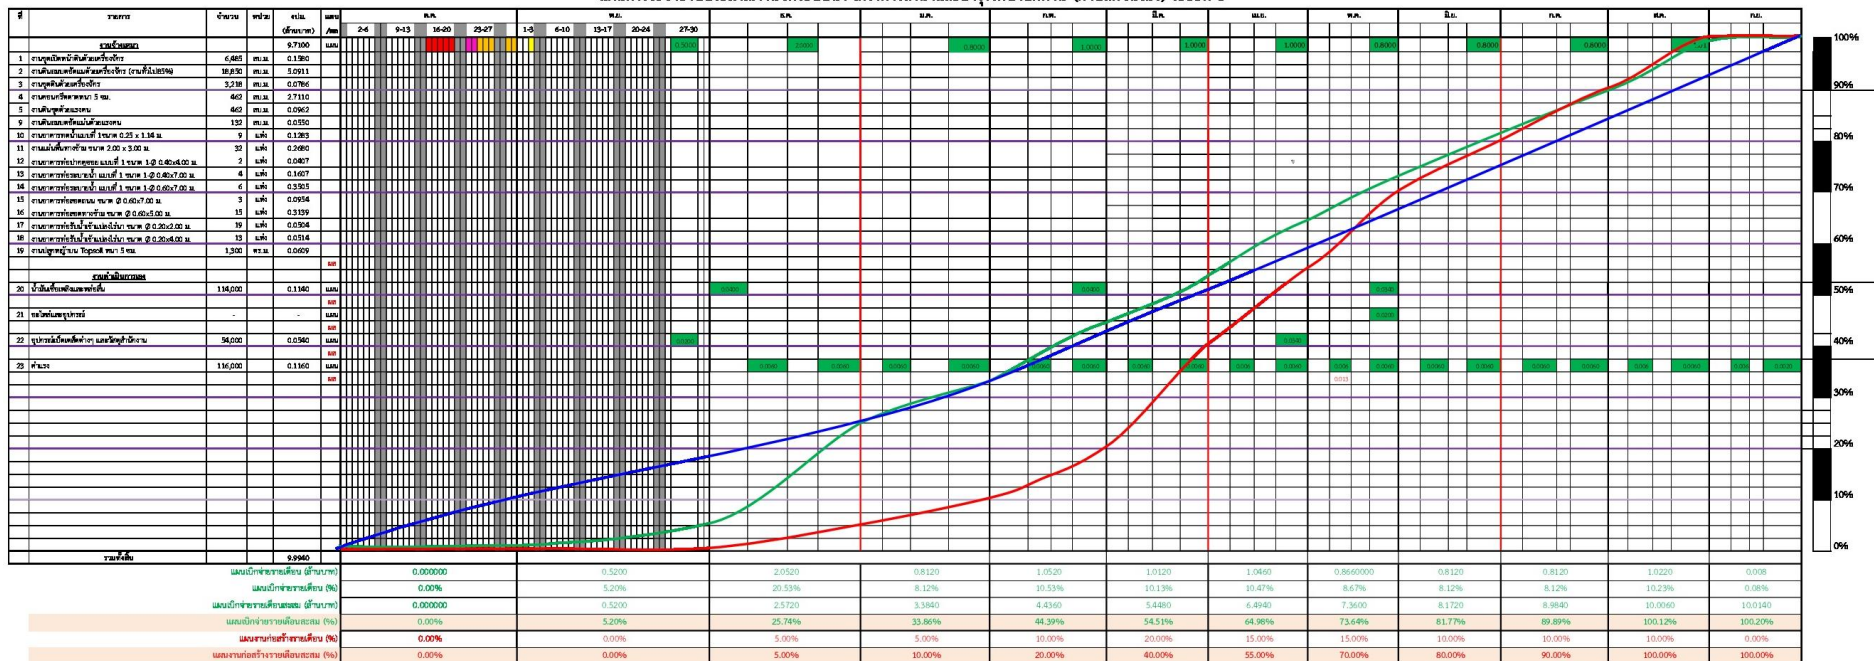

- ตลาดกลาง
- AQ
- TDR-อนุมัติรับราคา
- ลงนามในสัญญาซื้อขายกัน
- วันส่งมอบ - รอประกาศผล
- วันส่งสัญญา
- วันตรวจรับ
- วันเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย


ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย กรมชลประทาน

แผนการดำเนิน

หัวข้อที่ 2 ผลสำเร็จของงาน

ก่อนก่อสร้าง

แผนงานก่อสร้าง และแผนการเบิกจ่าย

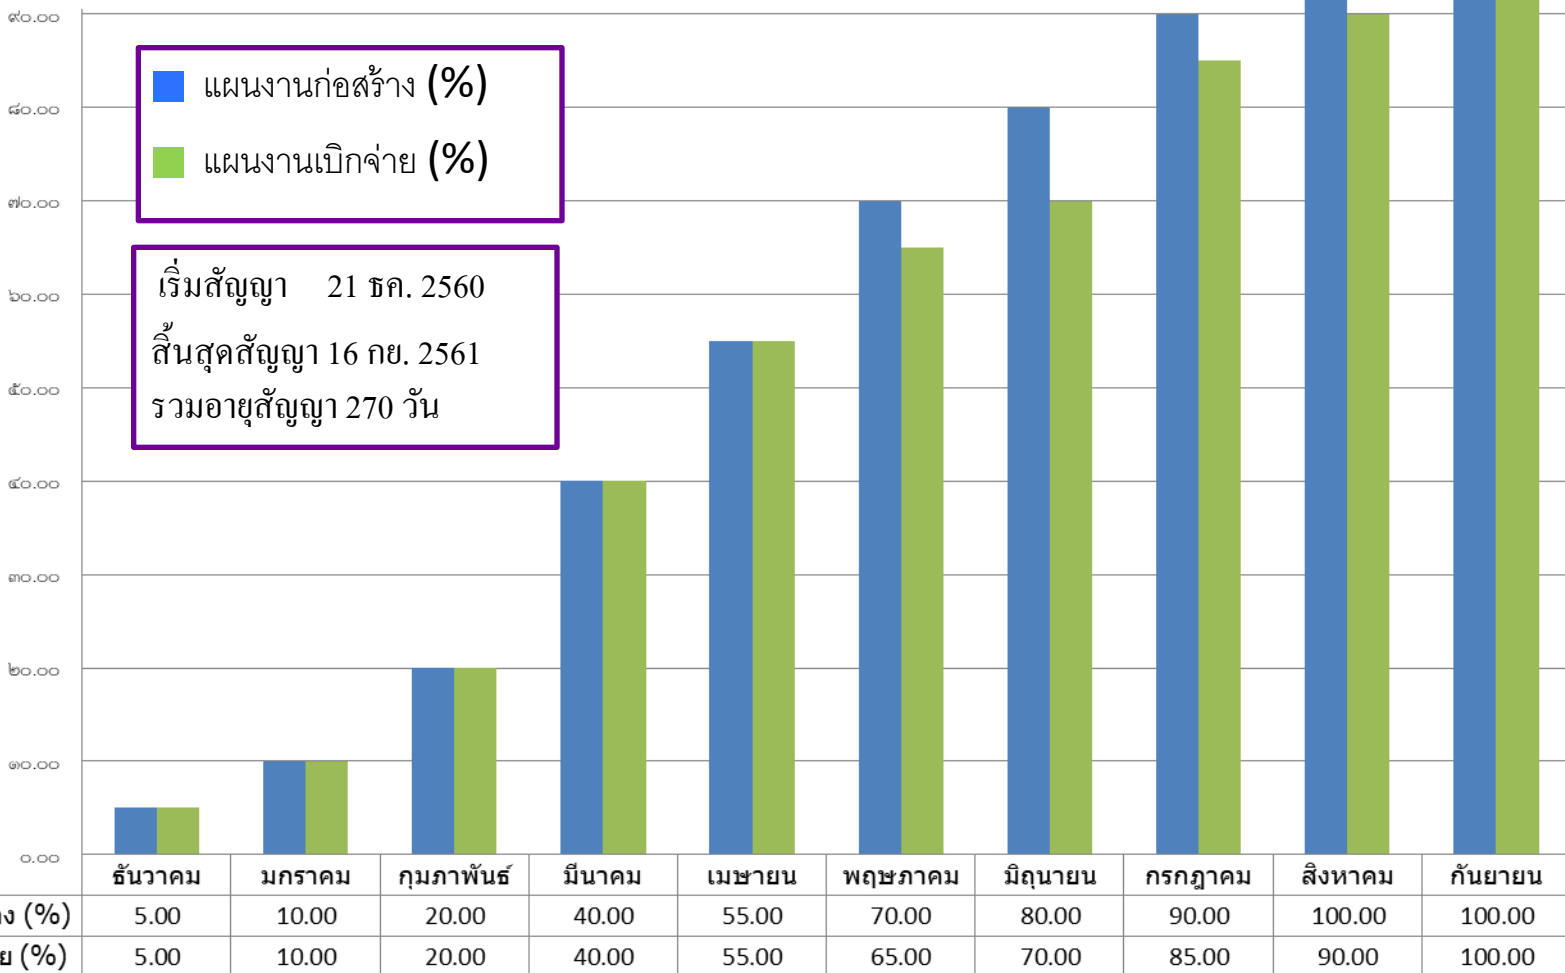

หัวข้อที่ 2 ผลสำเร็จของงาน

ก่อนก่อสร้าง

แผนดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๗ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน

ที่	กิจกรรมการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ	ดำเนินการในเขตพื้นที่	กำหนดการจัดการประชุม		จำนวนเกษตรกร (คน)	หมายเหตุ
				สถานที่	วันที่จัดประชุม		
	การประชุม ชี้แจง และประชาสัมพันธ์ งานก่อสร้างงานจัดระบบน้ำโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม						
	แผนงานสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐						
๑	งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนรัก) ระยะที่ ๑	๒๕๖๐	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก	พฤหัสบดี ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๐	๓๐	
๒	งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี) ระยะที่ ๑	๒๕๖๐	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	ศาลาภายในวัดหนองครก	ศุกร์ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๐	๓๐	
	การประชุม ชี้แจง และประชาสัมพันธ์ งานก่อสร้างงานจัดระบบน้ำโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม						
	แผนงานสนับสนุน โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของรัฐบาล ปี ๒๕๖๐						
๓	โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพระดับแปลงนา (ตำบลบางเขา) ระยะที่ ๒	๒๕๖๐	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	โรงเรียนบ้านบางหัน	จันทร์ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐	๓๐	
๔	โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพระดับแปลงนา (บ้านป่าแดงกลาง)	๒๕๖๐	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี		จันทร์ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐	๓๐	
๕	โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพระดับแปลงนา (บ้านคูแถมบ่อ)	๒๕๖๐	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี		จันทร์ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐	๓๐	
๖	โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพระดับแปลงนา (บ้านตลาดนัดบ่อทอง)	๒๕๖๐	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	เทศบาลตำบลบ่อทอง	พฤหัสบดี ๐๔ มี.ค. ๒๕๖๐	๓๐	
	การประชุม ชี้แจง ระหว่างการก่อสร้างงานจัดระบบน้ำ						
	แผนงานกองทุนจัดรูปที่ดินปีงบประมาณ ๒๕๖๐						
๗	งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบางเขา)	๒๕๖๐	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	โรงเรียนบ้านบางหัน	พฤหัสบดี ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๐	๓๐	
๘	งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (บ้านกูแบชีรา) ระยะที่ ๑	๒๕๖๐	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	มัสยิดบ้านกูแบชีรา	พฤหัสบดี ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๐	๓๐	
๙	งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลดอนรัก) ระยะที่ ๑	๒๕๖๐	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก	พฤหัสบดี ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐	๓๐	
๑๐	งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (บ้านโคกกาเปาะ) ระยะที่ ๑	๒๕๖๐	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน	พฤหัสบดี ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๐	๓๐	

วันที่ 17 ก.พ. 61

ก่อนก่อสร้าง การมีส่วนร่วมของประชาชน

ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และจัดทำบันทึกยินยอมให้ใช้ที่ดิน



วันที่ 28 สิงหาคม 2560

สจจ.35 ได้จัดประชุมชี้แจง และ
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินงาน
จัดระบบน้ำฯ รวมทั้งทำความเข้าใจ และรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนเจ้าของที่ดิน
ก่อนทำบันทึกยินยอมให้ใช้ที่ดินในการ
ก่อสร้าง

- ประชาชนเจ้าของที่ดิน ร้อยละ 80 ยินยอม
ให้ก่อสร้างฯ

หัวข้อที่ 2 ผลสำเร็จของงาน

ก่อนก่อสร้าง การมีส่วนร่วมของประชาชน

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

เขียนที่ ๒๒๕ ศ.๓๐๔-๔๔๔
วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้าพเจ้า นาย สมชาย ธรรมะธรรมะ อายุ ๕๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบล คลองโพธิ์ อำเภอ โพธิ์โพธิ์ จังหวัด ปทุมธานี
บิดาประจำตัวประชาชน เลขที่ ๒-๑๑๐๒-๐๐๕๕-๓๘-๐ รับหมดอายุ ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๖
ออกให้ ณ สำนักงานที่ดิน อำเภอโพธิ์โพธิ์ เป็นเจ้าของที่ดิน ตามโฉนดที่ดิน/น.๒๑ ส.๒๖ นพ. ๕๕๕
เลขที่ ๑๕๕๐๗ หมู่ที่ ๕ ตำบล คลองโพธิ์ อำเภอ โพธิ์โพธิ์ จังหวัด ปทุมธานี
มีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๕ งาน ๕๕ ตารางวา ปัจจุบันใช้ประกอบกิจการ ทำนา ปลูกพืชผัก
ข้าพเจ้ามีความประสงค์

☒ ยินยอมให้โครงการปฏิรูปการจัดการระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓๙ ทำการก่อสร้างงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ในเขตที่ดินของข้าพเจ้า

☐ ไม่ยินยอมให้ก่อสร้างงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมในเขตที่ดินของข้าพเจ้า

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ สมชาย ธรรมะธรรมะ (เจ้าของที่ดิน)
(นายสมชาย ธรรมะธรรมะ)

ลงชื่อ นายสมชาย ธรรมะธรรมะ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง/อปท.)
(นายสมชาย ธรรมะธรรมะ)

ลงชื่อ นายสมชาย ธรรมะธรรมะ (พยาน)
(นายสมชาย ธรรมะธรรมะ)

ลงชื่อ นายสมชาย ธรรมะธรรมะ (พยาน)
(นายสมชาย ธรรมะธรรมะ)

ตัวอย่างบันทึกยินยอม
ที่เจ้าของที่ดินได้ลงชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน

หัวข้อที่ 2 ผลสำเร็จของงาน

ก่อนก่อสร้าง การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการจัดระบบน้ำชุมชน



 กรมชลประทาน รายชื่อคณะกรรมการจัดระบบน้ำชุมชน งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี) ระยะที่ ๑ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓๕ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑		
ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
๑	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี	ประธานกรรมการ
๒	นายย่อง มณีร่ำม	รองประธาน
๓	นายบือราเฮง กะจิ	*
๔	นางละมุน พรหมจันทร์	*
๕	นายวิวัฒน์ แสงบุญ	กรรมการ
๖	นายนาวิ มาโละ	*
๗	นายดอเลาะ มะสุ	*
๘	นายพงศ์ เรืองนัย	*
๙	นายบุญเลิศ ชูช่วย	*
๑๐	นายมนี บุญหมณี	*
๑๑	นายอาดัต คาร์เง็ง	*
๑๒	นายพร พรหมเทพ	*
๑๓	นายอำนาจ บุญเทื่อ	กรรมการ/เลขานุการ

หัวข้อที่ 2 ผลสำเร็จของงาน

ก่อนก่อสร้าง การปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมาย พรบ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

(มาตรา ๖๙ ให้ท้องที่ที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติ ค้นและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นเขตการ

จัดระบบน้ำเพื่อ เกษตรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้)

หน้า ๔๒
เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๒ ก
ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๐



พระราชกฤษฎีกา
ให้ใช้พระราชบัญญัติค่นและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕
บังคับในท้องที่อำเภอเมืองปิตตานี อำเภอชะหรั่ง อำเภอหนองจิก อำเภอยะรัง อำเภอโคกโพธิ์
อำเภอมาบอ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้ใช้พระราชบัญญัติค่นและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อำเภอเมืองปิตตานี อำเภอชะหรั่ง อำเภอหนองจิก อำเภอยะรัง อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอมาบอ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติค่นและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

หน้า ๔๓
เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๒ ก
ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติค่นและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อำเภอเมืองปิตตานี อำเภอชะหรั่ง อำเภอหนองจิก อำเภอยะรัง อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอมาบอ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๕๐"

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ใช้พระราชบัญญัติค่นและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อำเภอเมืองปิตตานี อำเภอชะหรั่ง อำเภอหนองจิก อำเภอยะรัง อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอมาบอ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

หน้า ๔๔
เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๒ ก
ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๐


หมายเหตุ - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกานี้ คือ เนื่องจากกรมชลประทานได้ดำเนินการขุดคลองส่งน้ำสายใหญ่ คลองชอชอ สร้างประตูระบายน้ำ และท่อส่งน้ำในเขตโครงการปิตตานี ในท้องที่อำเภอเมืองปิตตานี อำเภอชะหรั่ง อำเภอหนองจิก อำเภอยะรัง อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอมาบอ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาเสร็จแล้ว แต่ยังคงค่นและคูน้ำสำหรับส่งน้ำจากทางน้ำของประชาชนไปใช้ในการเพาะปลูก สมควรให้ใช้พระราชบัญญัติค่นและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้มีการจัดค่นและคูน้ำอันจะเป็นประโยชน์ในการเกษตรและทำให้เกิดการใช้น้ำเป็นไปโดยประหยัด จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกา
ให้ใช้พระราชบัญญัติค่นและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕
บังคับในท้องที่อำเภอเมืองปิตตานี อำเภอชะหรั่ง อำเภอหนองจิก อำเภอยะรัง อำเภอโคกโพธิ์
อำเภอมาบอ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
พ.ศ. ๒๕๕๐

หัวข้อที่ 2 ผลสำเร็จของงาน

ก่อนก่อสร้าง

การปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมาย

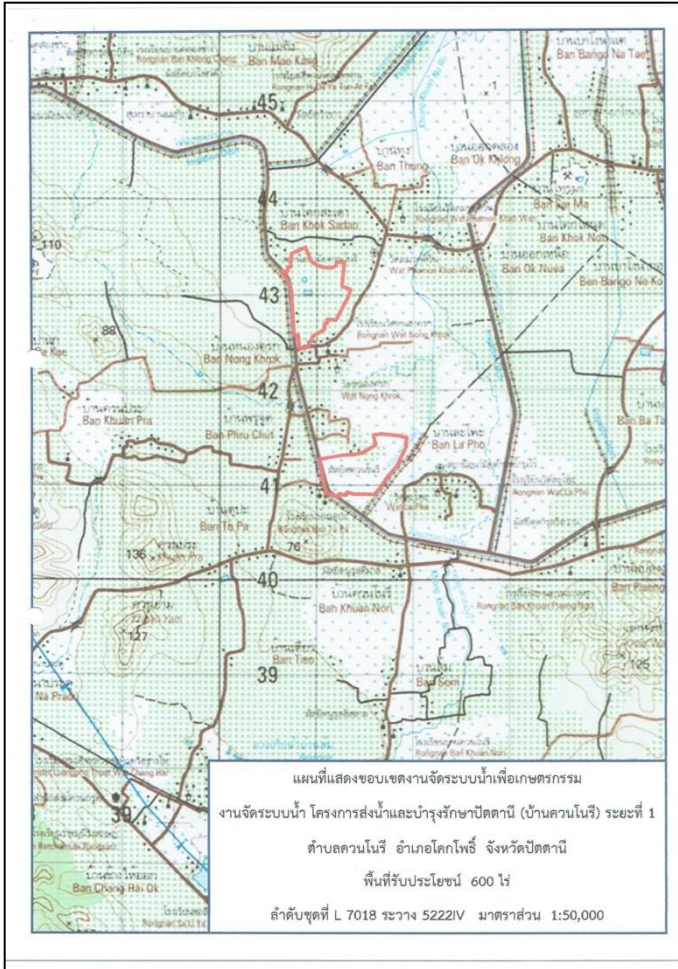

จัดทำขอบเขตงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม
ลงบนแผนที่ 1: 50000 ตาม พรบ. จัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
มาตรา 23

ก่อนก่อสร้าง

การปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมาย



จัดทำแผนผังการจัดระบบน้ำ
เพื่อเกษตรกรรมลงในแบบ
ก่อสร้าง ตาม พรบ.จัดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2558
มาตรา 23


หัวข้อที่ 2 ผลสำเร็จของงาน

ก่อนก่อสร้าง

การปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมาย



ติดประกาศ แผนผังการจัดระบบน้ำ ฯ
ณ ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์

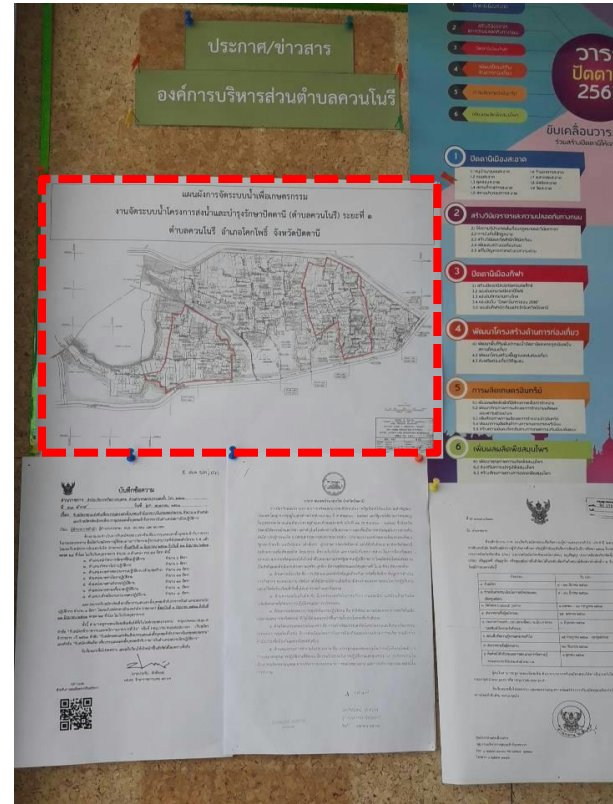

ติดประกาศ แผนผังการจัดระบบน้ำ ฯ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี

หัวข้อที่ 2 ผลสำเร็จของงาน

ก่อนก่อสร้าง

การประเมินค่าที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน

เกษตรกรเจ้าของที่ดิน จำนวน 66 ราย

พื้นที่รับประโยชน์งานจัดระบบน้ำ จำนวน 134 แปลง

- ที่ดินติดคลองชลประทาน 13 แปลง
- ที่ดินได้รับน้ำจากแปลงอื่นและไม่ติดระบบส่ง 97 แปลง
- ที่ดินอยู่ติดระบบส่งน้ำและถูกหักที่ดินในการก่อสร้าง 24 แปลง
- ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่าย 22 แปลง คิดเป็นร้อยละ 91.67
- ต้องชำระ 2 แปลง คิดเป็นร้อยละ 8.33

ต้องชำระเป็นเงินทั้งสิ้น 7,098 บาท

กำหนดถ่ายโอนภารกิจ ให้ อปท. เดือนกันยายน 2561
หลังจากนั้นจะเริ่มทำการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ฯ

แบบฟอร์ม 1

แบบสรุปข้อมูลรายโครงการ ผลที่ได้จากการคำนวณชำระค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน้ำ
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่35 ปีที่งบประมาณค่าก่อสร้าง 2561

งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี) ระยะที่1

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจัดระบบน้ำ	10,000,000.00	บาท
พื้นที่รับประโยชน์งานจัดระบบน้ำ	600.00	ไร่
จำนวนแปลงในเขตพื้นที่รับประโยชน์	134	แปลง (จำนวนแปลงจะต้องเท่ากับที่ระบุในรายการคำนวณ)

1.แปลงที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าใช้จ่าย แบ่งเป็น

1.1 ที่ดินที่อยู่ต้นคลองน้ำ รหัส(1)	0	แปลง	0	ไร่
1.2 ที่ดินติดคลองชลประทาน รหัส(2)	13	แปลง	63.080	ไร่
1.3 ที่ดินรับน้ำมาจากแปลงอื่น รหัส(3)	97	แปลง	417.090	ไร่
และไม่ติดระบบส่งน้ำ				
รวม 1.1+1.2+1.3	110	แปลง	480.17	ไร่

2.แปลงที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องคำนวณชำระค่าใช้จ่าย รหัส(0)

2.1 ที่ดินที่อยู่ติดระบบส่งน้ำ	24	แปลง	77.84	ไร่
และถูกหักที่ดินในการก่อสร้าง				
2.2 ที่ดินที่อยู่ติดระบบส่งน้ำ				
และเป็นปลายคลองน้ำ	0	แปลง	-	ไร่
รวม 2.1+2.2	24	แปลง	77.84	ไร่

ข้อมูลที่ได้หลังจากการคำนวณค่าใช้จ่ายจัดระบบน้ำ เฉพาะแปลงตามข้อ 2 รหัส(0)

1.ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเนื่องจากมูลค่าดินหักแล้วสูงกว่าคิดเป็นร้อยละของแปลงตามข้อ2รหัส(0)	22	แปลง	63.310	ไร่
2. ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจัดทำมูลค่าที่ดินหักแล้วน้อยกว่า	2	แปลง	14.530	ไร่
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละของแปลงตามข้อ2รหัส(0)	8.333	ค่าใช้จ่ายรวม	7,098.00	บาท
		อัตราเฉลี่ย	488.51	บาท/ไร่
2.2 ไม่มีส่วนมูลค่าที่ดินถูกหัก เพราะไม่ได้เสียพื้นที่ก่อสร้าง	0	แปลง		ไร่
	0	ค่าใช้จ่ายรวม		บาท
		อัตราเฉลี่ย		บาท/ไร่

หัวข้อที่ 2 ผลสำเร็จของงาน

ระหว่างการก่อสร้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	รายการ				วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา													
		(ปีงบประมาณ)		ประเภทงาน (จ้างเหมา/ ทำเอง/จ้าง เหมา บางส่วน)		งบประมาณ ทั้งโครงการ (บาท)	วิธีจัดหา	วันประกาศ TOR	วันประกาศ จัดซื้อ-จัด จ้าง	วันเปิดซอง	อนุมัติรับราคา		ลงนามในสัญญา		อายุ สัญญา (วัน)	เริ่มสัญญา	ส่งเข้าทำงาน	สิ้นสุด สัญญา	ผู้ประกอบก ร
											วันที่	วงเงิน (บาท)	วันที่	วงเงิน (บาท)					
๑	งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (บ้านกูแบชีรา) ระยะที่ ๑	๑/๑๐/๖๐	๓๐/๙/๖๑	จ้างเหมา	10,000,000.00	๑๒/๑๐/๕๙	วิธีพิเศษ	๑๖/๑๑/๖๐	๑๖/๑๑/๖๐	๒๐/๑๑/๖๐	๒๐/๑๑/๖๐	9,466,880	๒๐/๑๑/๖๐	9,591,958	270	๒๑/๑๒/๖๐	๒๐/๑๒/๖๐	๑๖/๙/๖๑	พจก. มะชาสัมพันธ์

ลงนามในสัญญา
วันที่ 20 พ.ย. 2560

หัวข้อที่ 2 ผลสำเร็จของงาน

ระหว่างการก่อสร้าง

แผนการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนระหว่างการก่อสร้าง

แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓๕ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน

ที่	กิจกรรมการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ	ดำเนินการในเขตพื้นที่	กำหนดการจัดการประชุม		จำนวนเกษตรกร (คน)	หมายเหตุ
				สถานที่	กำหนดการจัดประชุม		
	การประชุมชี้แจง และประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม (หลักสูตร ๑ วัน)						
	แผนงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)						
๑	ระบบกระจายน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลคลองตันหยง)	๒๕๖๑	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตันหยง	๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑	๓๐	
๒	ระบบกระจายน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลคอนรัก) ระยะที่ ๑	๒๕๖๑	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก	-	๓๐	
๓	ระบบกระจายน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลคอนรัก/ปะกวยรัง)	๒๕๖๑	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑	๓๐	
๔	ระบบกระจายน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบ่อทอง) ระยะที่ ๑	๒๕๖๑	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	เทศบาลตำบลบ่อทอง	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑	๓๐	
๕	ระบบกระจายน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบางเขา)	๒๕๖๑	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	โรงเรียนบ้านดอนนา	-	๓๐	
๖	ระบบกระจายน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลสุโงะ)	๒๕๖๑	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	องค์การบริหารส่วนตำบลสุโงะ	๐๑ มี.ค. ๒๕๖๑		
๗	ระบบกระจายน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลลิปะโฮ้ง)	๒๕๖๑	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะโฮ้ง	๐๒ มี.ค. ๒๕๖๑		
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ (หลักสูตร ๒ วัน)						
	แผนงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑						
๘	งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลคอนรัก) ระยะที่ ๒	๒๕๖๑	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	อาคารประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ สจจ.๓๕	มี.ค. ๒๕๖๑		
๙	งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี) ระยะที่ ๑	๒๕๖๑	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี	มี.ค. ๒๕๖๑	๓๐	
๑๐	งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (บ้านบุค) ระยะที่ ๑	๒๕๖๑	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	มัสยิดบ้านบุค	มี.ค. ๒๕๖๑	๓๐	
๑๑	งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (บ้านกุ่มขี้รา) ระยะที่ ๒	๒๕๖๑	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	มัสยิดบ้านกุ่มขี้รา	เม.ย. ๒๕๖๑	๓๐	
๑๒	งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลทะเล) ระยะที่ ๑	๒๕๖๑	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	องค์การบริหารส่วนตำบลทะเล	เม.ย. ๒๕๖๑	๓๐	

กำหนดแผน
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑

กำหนดแผน
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ระหว่างการก่อสร้าง

ผลการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ระหว่างการก่อสร้าง



วันที่ 24/5/61 จัดเวทีประชาคมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ชี้แจงการทำงาน/รับฟังปัญหา และข้อเสนอ
จากประชาชนในเขตพื้นที่ดำเนินการ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี
จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน



วันที่ 25/5/61 ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ
ของกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายบ้านพร้าว
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน

ระหว่างการก่อสร้าง

ผลการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนระหว่างการก่อสร้าง



ผจจ.35 และเจ้าหน้าที่ ประชุม/วางแผนการทำงาน
ร่วมกับคณะกรรมการจัดระบบน้ำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำ



เจ้าหน้าที่ สจจ.35 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำฯ ร่วมจัดตั้ง
กลุ่มผู้ใช้น้ำ และอธิบายหน้าที่ กฎ กติกา ของกลุ่มผู้ใช้น้ำ

ระหว่างการก่อสร้าง

การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง



ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และกำหนดมาตรฐานไว้อ้างอิงงานก่อสร้าง



งานขุดเปิดหน้าดิน



ระหว่างการก่อสร้าง

การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง



งานถมดินตามแนวก่อสร้างคูส่งน้ำ



งานเกรดเกลี่ยดิน



ระหว่างการก่อสร้าง

การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง



งานตรวจสอบระดับดินถม



เจ้าของที่ดินร่วมชี้แนวเขต และกำหนดตำแหน่งอาคารประกอบ



ระหว่างการก่อสร้าง

การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร



งานทดสอบความแน่นของดินในสนาม



ระหว่างการก่อสร้าง

การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง



งานขุดคูส่งน้ำ



งานตรวจสอบระดับดินขุดท้องคูส่งน้ำ และงานตั้งแบบคาดคอนกรีต



ระหว่างการก่อสร้าง

การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง



งานดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ



ทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slump Test)




ระหว่างการก่อสร้าง

การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง



ตรวจสอบขนาดอาคารประกอบ

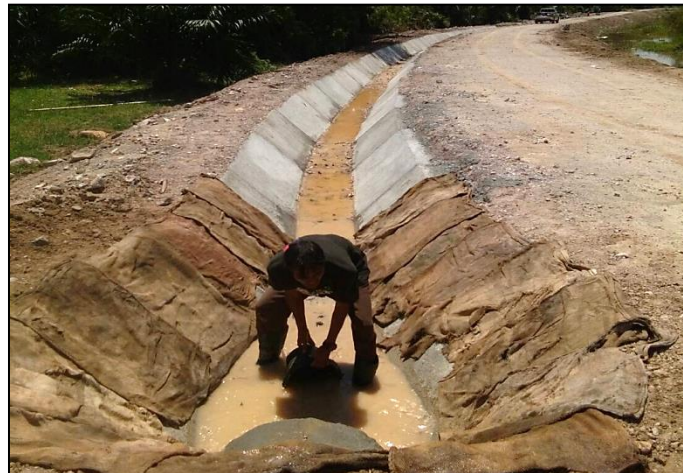

งานบ่มคอนกรีต



ระหว่างการก่อสร้าง

การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง



ตรวจสอบขนาดคูส่งน้ำ



งานแต่งดิน Slope คันคู/ทางลำเลียง



ระหว่างการก่อสร้าง

การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง



งานแต่งผิวทางลำเลียง




งานปลูกหญ้าและติดตั้งบานเหล็กอาคารประกอบ



หัวข้อที่ 2 ผลสำเร็จของงาน

ระหว่างการก่อสร้าง


ร้อยละของผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผน

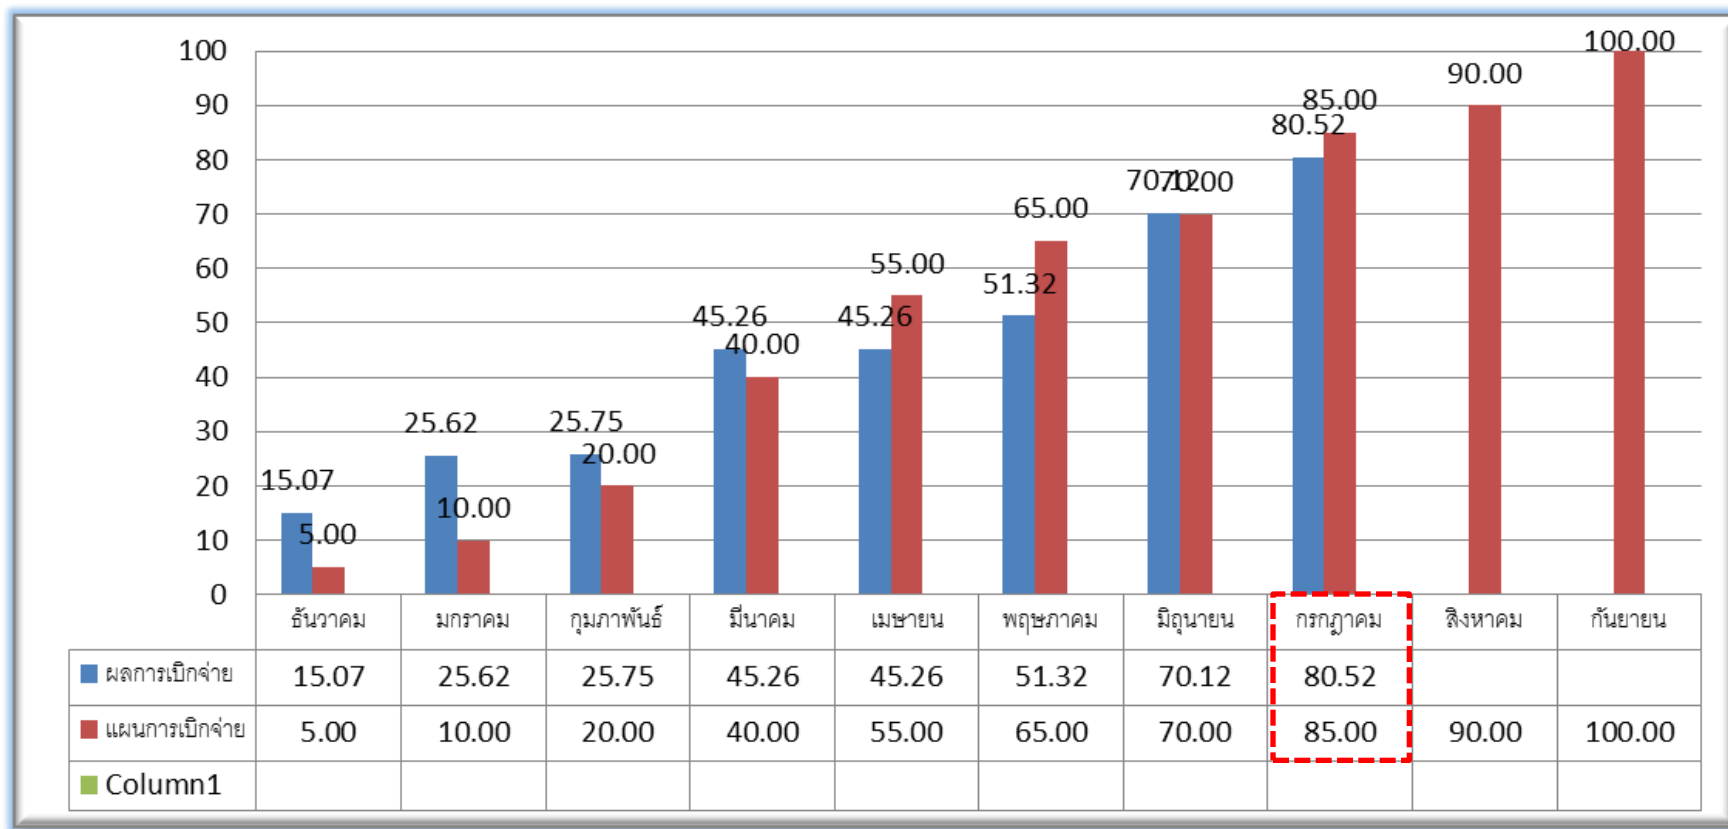

หัวข้อที่ 2 ผลสำเร็จของงาน

ระหว่างการก่อสร้าง

ร้อยละของผลงานเทียบกับแผน

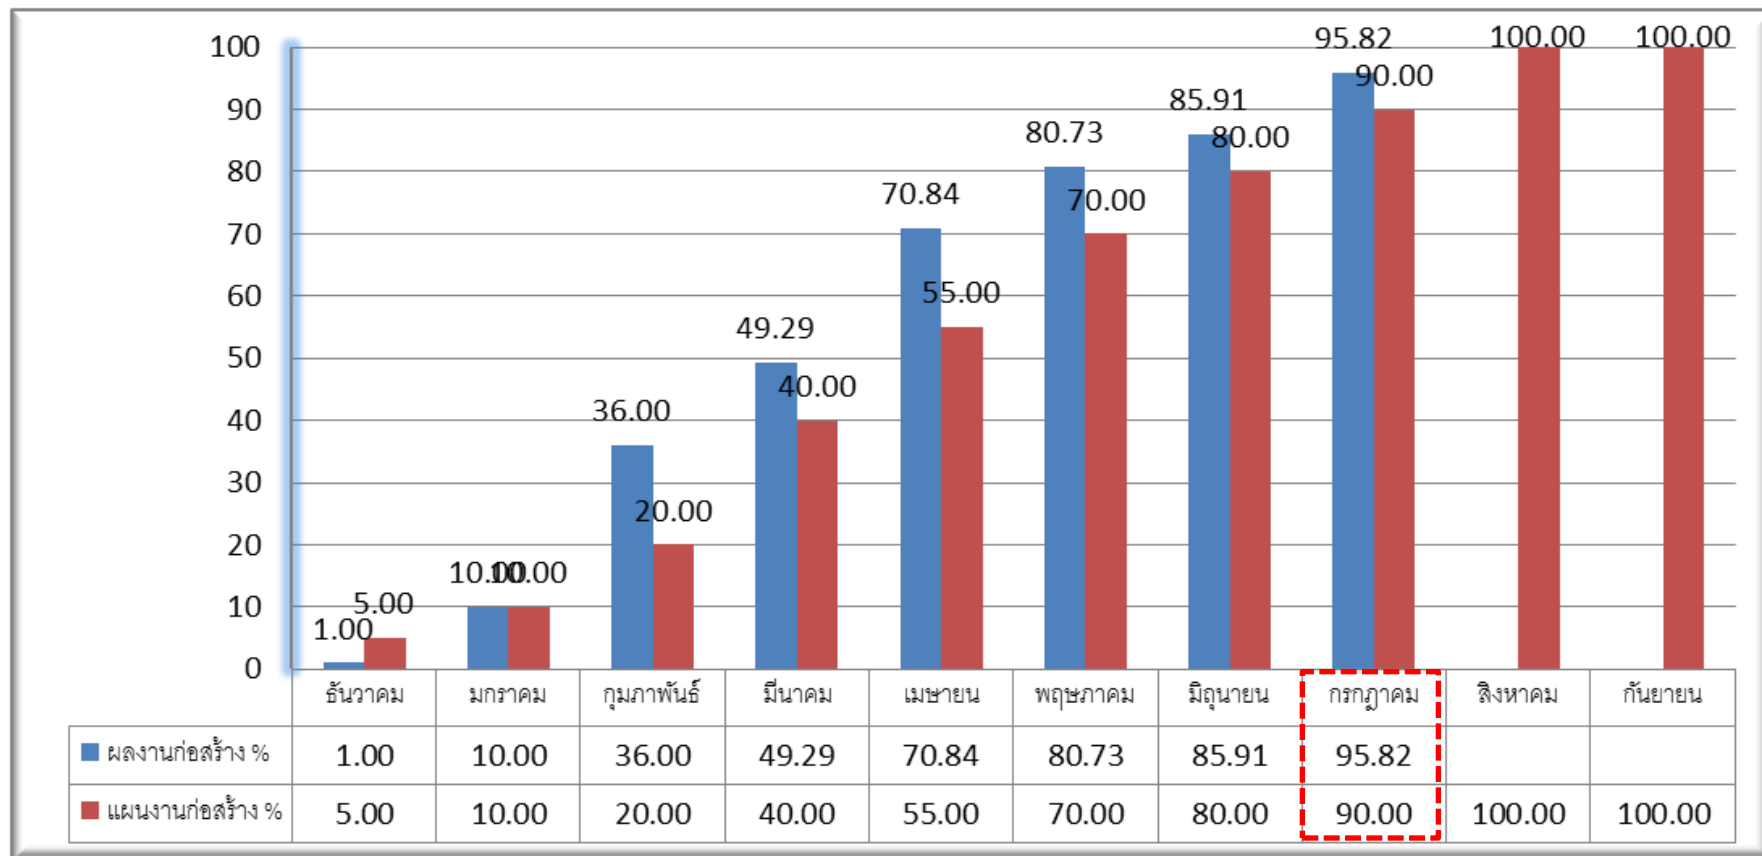


ระหว่างการก่อสร้าง

การแก้ไขแบบก่อสร้าง

งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี) ระยะที่1
ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้าง เนื่องจากแนวคูส่งน้ำที่ก่อสร้างจริงในสนาม
ตรง/ใกล้เคียง ตามแนวคูส่งน้ำในแบบก่อสร้าง

หัวข้อที่ 2 ผลสำเร็จของงาน

ระหว่างการก่อสร้าง

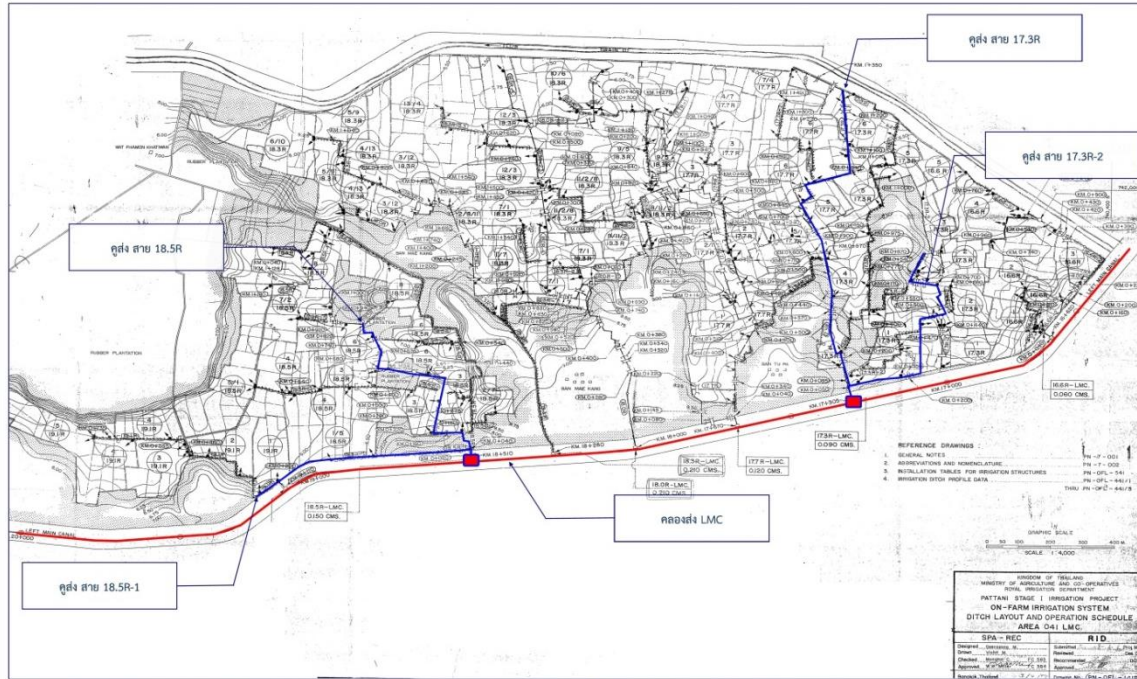

ภาพเปรียบเทียบ
แนวก่อสร้างคูส่งน้ำตามแบบ
กับแนวคูส่งน้ำจริงในสนาม



ระหว่างการก่อสร้าง

การบริหารสัญญางานจ้าง

สจจ.35 ได้มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อควบคุมหรือดำเนินงานต่างๆให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา และรักษาสีทธิประโยชน์ของทางราชการ

หัวข้อที่ 2 ผลสำเร็จของงาน

ระหว่างการก่อสร้าง

การรายงานผลงานและผลเบิกจ่ายออนไลน์และรายงานอื่นๆ

ผลการปฏิบัติงาน-ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบติดตาม ผลการปฏิบัติงาน : การใช้จ่ายงบประมาณ

(ระบบการติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ)

หน้าแรก รายงานต่างๆ คณะทำงาน เอกสารและแบบฯ แผนที่ประมาณการ รายงานสำหรับผู้บริหาร
 Logged in: onfarm17 รายการประมาณการ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่าย Cash Flow Log out

ผลการปฏิบัติงาน

รายการงาน ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35

ข้อมูล ณ วันที่ 12/06/2561

ชื่องาน / ประมาณการ	เป้าหมายทั้งโครงการ (%)			เป้าหมายปีปัจจุบัน (%)			รายงาน ผลงาน ล่าสุด	รายงาน ทั้งหมด
	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง		
(1.45) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำบาดาล (ด้านตอนต้น) ระยะที่ 2	90.00	93.02	3.02	90.00	93.02	3.02	12/06/2561	รายละเอียด
(1.46) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำบาดาล (ด้านตอนต้น) ระยะที่ 1	80.00	87.98	7.98	80.00	87.98	7.98	12/06/2561	รายละเอียด
(1.47) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำบาดาล (บ้าน ภูเขารัว) ระยะที่ 2	90.00	94.88	4.88	90.00	94.88	4.88	12/06/2561	รายละเอียด
(1.48) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายน้ำล้น-ล (บ้านถนนเหลือง)	80.00	97.43	17.43	80.00	97.43	17.43	12/06/2561	รายละเอียด
(1.49) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำบาดาล (บ้าน บุญตบ) ระยะที่ 1	80.00	96.21	16.21	80.00	96.21	16.21	12/06/2561	รายละเอียด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (espresso)

6/12/2018

แผนปฏิบัติงานและการเบิกจ่าย-ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบติดตาม ผลการปฏิบัติงาน : การใช้จ่ายงบประมาณ

(ระบบการติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ)

หน้าแรก รายงานต่างๆ คณะทำงาน เอกสารและแบบฯ แผนที่ประมาณการ รายงานสำหรับผู้บริหาร
 Logged in: onfarm17 รายการประมาณการ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่าย Cash Flow Log out

ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์

ชื่อประมาณการ (1.46) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำบาดาล (ด้านตอนต้น) ระยะที่ 1
 ปีเริ่มต้น 2561 ปีสิ้นสุด 2561

สัปดาห์ ที่งาน	ผลงาน ปีปัจจุบัน (%)	ผลงาน ปีโครงการ (%)	อื่นๆ - ผู้สังเกต	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ
1 10/10/2560	0	0	ผู้ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ และกรม ชลประทานจังหวัดเชียงใหม่	ส่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ		✗
2 17/10/2560	0	0	ผู้ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ และกรม ชลประทานจังหวัดเชียงใหม่	ส่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ		✗
3 24/10/2560	0	0	ผู้ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ และกรม ชลประทานจังหวัดเชียงใหม่	ส่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ		✗
4 31/10/2560	0	0				✗
5 07/11/2560	0	0				✗
6 14/11/2560	0	0	ผู้ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ และกรม ชลประทานจังหวัดเชียงใหม่	ส่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ		✗
7 21/11/2560	0	0	ผู้ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ และกรม ชลประทานจังหวัดเชียงใหม่	ส่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ		✗
8 28/11/2560	0	0	ราชการจังหวัดเชียงใหม่	ส่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ		✗
9 05/12/2560	0	0	ราชการจังหวัดเชียงใหม่	ส่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ		✗
10 12/12/2560	0	0	ราชการจังหวัดเชียงใหม่	ส่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ		✗
11 19/12/2560	0	0	ผู้ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ และกรม ชลประทานจังหวัดเชียงใหม่	ส่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ		✗
12 26/12/2560	0	0				✗
13 02/01/2561	1	1				✗
14 09/01/2561	2	2	なし	なし		✗
15 16/01/2561	8	8	なし	なし		✗
16 23/01/2561	10	10	なし	なし		✗
17 30/01/2561	10	10	なし	なし		✗
18 06/02/2561	10	10	พื้นที่ด้านต้นน้ำของงานส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำบาดาล และพื้นที่ด้านต้นน้ำของงานส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำบาดาล พื้นที่ด้านต้นน้ำของงานส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำบาดาล พื้นที่ด้านต้นน้ำของงานส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำบาดาล	ส่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ		✗
19 13/02/2561	13	13	พื้นที่ด้านต้นน้ำของงานส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำบาดาล และพื้นที่ด้านต้นน้ำของงานส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำบาดาล พื้นที่ด้านต้นน้ำของงานส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำบาดาล พื้นที่ด้านต้นน้ำของงานส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำบาดาล	ส่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ		✗
20 20/02/2561	20	20	พื้นที่ด้านต้นน้ำของงานส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำบาดาล และพื้นที่ด้านต้นน้ำของงานส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำบาดาล พื้นที่ด้านต้นน้ำของงานส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำบาดาล พื้นที่ด้านต้นน้ำของงานส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำบาดาล	ส่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ		✗
21 27/02/2561	26	26	なし	なし		✗
22 06/03/2561	36	36	なし	なし		✗
23 13/03/2561	41	41	なし	なし		✗
24 20/03/2561	46	46	なし	なし		✗
25 27/03/2561	49	49	なし	なし		✗
26 03/04/2561	55	55	なし	なし		✗
27 10/04/2561	59	59	なし	なし		✗
28 17/04/2561	62	62	なし	なし		✗
29 24/04/2561	69	69	なし	なし		✗
30 01/05/2561	71	71	なし	なし		✗
31 08/05/2561	73	73	なし	なし		✗
32 15/05/2561	75	75	なし	なし		✗
33 22/05/2561	78	78	なし	なし		✗
34 29/05/2561	81	81	なし	なし		✗
35 05/06/2561	86	86	なし	なし		✗
36 12/06/2561	88	88	なし	なし		✗

http://bid.rtd.go.th/pbms/agency_weekly_perform.php?pmk_id=152752

1/2

รายงานผลงานก่อสร้าง และอัตรภาพภาพตามความก้าวหน้าของงาน

หัวข้อที่ 2 ผลสำเร็จของงาน

ระหว่างการก่อสร้าง

การรายงานผลงานและผลเบิกจ่ายออนไลน์และรายงานอื่นๆ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓๕ ฝ่ายวิศวกรรม โทร. ๐ ๗๑๔๓ ๗๒๗๙

ที่ สจจ.๔๐/๒๔๖ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน พล.จ. ผ่าน ผส.ป.จ.

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓๕ ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำปีวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามรายละเอียด ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


 (นายสมบุญ ยอดขาว)
 ผจจ.๓๕

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ณ วันที่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่ (1)	รายการ / โครงการ (2)	งบประมาณ (3)			โอน ครั้ง (4)	วันสิ้น (5)	เบิกจ่ายจำนวนเงิน (6)		เบิกจ่ายค่าแรง (7)		ผลการดำเนินงาน (8)				ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข (9)
		โดยงบ ประจำปี (บาท)	งบ เงินอุดหนุน (บาท)	งบ เงินกู้ (บาท)			เบิกจ่าย ค่าแรง (บาท)	เบิกจ่าย ค่าวัสดุ (บาท)	งบ เงินอุดหนุน (บาท)	งบ เงินกู้ (บาท)	งบ เงินอุดหนุน (บาท)	งบ เงินกู้ (บาท)	งบ เงินอุดหนุน (บาท)	งบ เงินกู้ (บาท)	
ปีงบประมาณ 2561															
แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม															
1)	งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำปาด (บ้านขุนน้ำ) ระยะที่ 1	11,850,093.00	8,969,093.00	2,881,000.00	1	2 พ.ย. 60	-	7,218,497.70	-	2,573,953.00	10.00	0.25	90.00	99.40	-
					2	6 ต.ค. 60									
2)	งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำปาด (ตำบลทวนโนรี) ระยะที่ 1	9,750,880.00	9,466,880.00	284,000.00	1	6 ต.ค. 60	-	7,611,870.75	-	239,583.40	10.00	1.54	90.00	95.82	-
3)	งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำปาด (บ้านขุนน้ำ) ระยะที่ 2	5,857,291.00	5,687,291.00	170,000.00	1	6 ต.ค. 60	-	5,687,291.00	-	159,337.30	10.00	0.26	100.00	99.36	-
4)	งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำปาด (ตำบลทวนโนรี) ระยะที่ 2	9,805,828.00	9,520,828.00	285,000.00	1	6 ต.ค. 60	-	7,631,995.50	-	264,733.80	5.00	0.71	95.00	97.15	-
5)	งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำปาด-โคก (บ้านหนองขี้) ระยะที่ 1	11,836,606.00	9,131,606.00	2,705,000.00	1	25 ต.ค. 60	-	9,131,606.00	-	2,334,882.73	10.00	0.21	90.00	99.04	-
					2	6 ต.ค. 60									
ผลรวมทั้งโครงการ		49,100,698.00	42,775,698.00	6,325,000.00	-	-	-	37,281,260.95	-	5,572,490.23	-	-	-	-	-
(1) ลำดับที่ 1 งานราชการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำปาด ปีงบประมาณ 2561							ผลการปฏิบัติงานและโครงการ		96.15						
(2) รายงานโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำปาด ปีงบประมาณ 2561							ผลการเบิกจ่ายโครงการ		87.28						
(3) โดยงบเงินอุดหนุน															
(4) เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาและค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาและค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาและค่าจ้างเหมา															
(5) เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาและค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาและค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาและค่าจ้างเหมา															
(6) ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานและค่าจ้างเหมา และผลการดำเนินงาน และผลการดำเนินงาน															
(7) หมายเหตุ ปัญหาอุปสรรคอื่นๆ ขอให้แจ้งรายละเอียดการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน และผลการดำเนินงาน															
*** ค่าจ้างเหมาและค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาและค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาและค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาและค่าจ้างเหมา															
*** ค่าจ้างเหมาและค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาและค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาและค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาและค่าจ้างเหมา															

รายงานผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ให้ สจจ. และ สขป.17 ทุกวันจันทร์

หัวข้อที่ 2 ผลสำเร็จของงาน

ระหว่างการก่อสร้าง

การรายงานผลงานและผลเบิกจ่ายออนไลน์และรายงานอื่นๆ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓๕ ฝ่ายวิศวกรรม โทร. ๐ ๙๓๔๖ ๐๒๙๙
ที่ สจจ. ๔๐/ ๖๔๘ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผกท.จค.

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓๕ ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


 (นายสมบุญ ยอดขาว)
 ผจจ.๓๕

สำเนา
เรียน ผคป.ปัตตานี
เพื่อโปรดทราบ


 (นายสมบุญ ยอดขาว)
 ผจจ.๓๕

แบบ จค.05

สรุปรายงานการรับ-จ่ายเงินลงทุน กองทุนจัดรูปที่ดิน
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 จังหวัดปัตตานี
โครงการ งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี) ระยะที่ 1
วงเงินงบประมาณ 9,750,880.00 บาท แผนงานปีงบประมาณ 2561
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

รายการ	เอกสารอ้างอิง RM/คชช.๐3/กค		จำนวนเงิน	เบิกจ่าย					รวมทั้งสิ้น
	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ		ค่าครุภัณฑ์	ค่าจ้างช่างชั่วคราว	เงินประกันสังคม ส่วนของนายจ้าง	ค่าตอบแทนโดย วัตถุและ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายอื่น	
ยอดคงเหลือยกมาเจือเงิน มีนาคม 2561									5,531,490.55
รายรับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เบิกเกินเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมยอดยกมา รายรับ และเบิกเกินเงิน									5,531,490.55
รายจ่าย									
เบิกเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประจำเดือน เม.ย 61 จำนวน 2 ราย	2018-3600076311	03.05.2018	-	-	12,618.90	630	-	-	13,248.90
เบิกเงินจากจ้างช่าง พท.มส.ฯพื้นที่ ๓๕ ครั้งที่ 4	2018-3600074258	02.05.2018	-	-	-	-	-	564,961.50	564,961.50
เบิกเงินค่าจ้างช่าง พท.มส.ฯพื้นที่ ๓๕ ครั้งที่ 4	2018-3600071122	03.05.2018	-	-	-	-	27,424.20	-	27,424.20
โอนกลับส่วนกลาง			-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย			-	-	12,618.90	630	13,248.90	564,961.50	605,634.60
									ยอดคงไป 4,925,855.95

ขอรับรองว่าข้อมูลสรุปรายงานการรับ-จ่าย ถูกต้อง ครบถ้วน


 นายสมบุญ ยอดขาว
 ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35
 ลงวันที่ ๖ มิ.ย. ๖1

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ทุกวันที่ 5 ของเดือน

ระหว่างการก่อสร้าง

การรายงานผลงานและผลเบิกจ่ายออนไลน์และรายงานอื่นๆ

ที่ กษ. ๐๓๐๙.๔๐/๕๔๓



สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๕
เลขที่ ๒๔๘๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลสอง
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๓๓๐

๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน หลังสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ ตามแบบ ตผจ.๐๒

เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

ตามที่หนังสือ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ที่ กษ ๐๒๒๔.ป.น/๑๓๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้จัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบฟอร์ม ตผจ.๐๒ นั้น

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๕ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน หลังสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบุญ ยอดขาว)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๕

ฝ่ายวิศวกรรม
โทร. ๐ ๙๓๖๒ ๐๒๑๙๙
โทรสาร. ๐ ๙๓๖๒ ๐๒๑๕๕

60-๓๓๑1 ๓๓๕๕
นายวิชาญ วิชาญ

[illegible]

รายงานผลดำเนินงาน และผลการเบิกจ่าย ให้กับ ชป.ปัตตานี และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

หัวข้อที่ 2 ผลสำเร็จของงาน

หลังก่อสร้าง

การเปรียบเทียบปริมาณงานตามประมาณการและรูปแบบรายการสัญญา

ที่	รายการ	ปริมาณงาน								หมายเหตุ
		ตามประมาณการ/สัญญา				ตามก่อสร้างจริง				
		ความยาว	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ความยาว	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	
1	ก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบ									
	1.1 งานขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร	3,300	ม.	6,484	ลบ.ม.	3,400	ม.	6,681	ลบ.ม.	
	1.2 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	3,300	ม.	17,851	ลบ.ม.	3,400	ม.	19,941	ลบ.ม.	
	1.3 งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	3,300	ม.	3,218	ลบ.ม.	3,400	ม.	3,315	ลบ.ม.	
2	งานคอนกรีตดาด	3,300	ม.	462	ลบ.ม.	3,400	ม.	476	ลบ.ม.	
3	งานอาคารประกอบ			103	แห่ง			103	แห่ง	
4	งานปลูกหญ้า			1,320	ตร.ม.			1,340	ตร.ม.	

หลังก่อสร้าง



งานคูตาดคอนกรีต ทางลำเลียงและอาคารแผ่นพื้นทางข้าม



หลังก่อสร้าง



งานอาคารประกอบ



หลังก่อสร้าง

การทดสอบการส่งน้ำ



วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ สจจ.35 ทำการ
ทดสอบการส่งน้ำร่วมกับ
เกษตรกรผู้ใช้น้ำ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการทดสอบ

ผู้เข้าร่วมทดสอบการส่งน้ำ
มีความพึงพอใจ (ประเมินผล
จากแบบสอบถาม)



หัวข้อที่ 2 ผลสำเร็จของงาน

หลังก่อสร้าง

การทดสอบการส่งน้ำ



กรมชลประทาน

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓๕

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

กรมชลประทาน

รายงานผลประเมิน

ผลการทดสอบการส่งน้ำ และประเมินประสิทธิภาพการส่งน้ำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

บริเวณคูส่งน้ำสาย 18.5R และ 18.5R-1

พื้นที่ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบสำรวจความ
พึงพอใจในการ
ทดสอบการส่งน้ำ



แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลการทดสอบการส่งน้ำ และประเมินประสิทธิภาพการส่งน้ำ ปีงบประมาณ 2561
บริเวณคูส่งน้ำสาย 18.5R และ 18.5R-1
งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (ตำบลควนโนรี) ระยะที่ 1
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35

คำชี้แจง โปรดเติมข้อมูลในช่องว่าง หรือทำเครื่องหมาย ✓ ใน □ ตรงตามความเป็นจริง

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อ - สกุล..... นาง ฉวีมา แสงจันทร์

2. เพศ ☐ ชาย ☒ หญิง

3. อายุ ☐ 20-30 ☐ 31-40 ☐ 41-50 ☒ 51 ปีขึ้นไป

4. ระดับการศึกษา ☐ ประถมศึกษา ☒ มัธยมศึกษาตอนต้น ☐ อนุปริญญา
☐ ปริญญาตรี ☐ ปริญญาโท ☐ สูงปริญญาโท

5. อาชีพหลัก ☒ เกษตรกร ☐ รับจ้างทั่วไป ☐ ค้าขาย
☐ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐ พนักงานเอกชน ☐ อื่นๆ.....

5.1 กรณีอาชีพเกษตรกร ☒ ทำนา ☒ ทำไร่ ☐ ทำสวน
☐ สวนยางพารา ☐ สวนปาล์ม ☐ อื่นๆ.....

ข้อมูลสำหรับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ

ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

1. พื้นที่ทำการเกษตรในเขตโครงการ จำนวน 10 ไร่

2. ลักษณะการถือครองดิน ☒ เป็นของตนเอง จำนวน 10 ไร่
☐ เช่าที่ดิน จำนวน ไร่

3. แปลงเกษตรอยู่ในช่วง ☐ ช่วงแล้งส่งน้ำ ☐ ช่วงกลางฤดูส่งน้ำ ☒ ช่วงปลายฤดูส่งน้ำ

4. แหล่งน้ำหลักที่ใช้ทำการเพาะปลูก ก่อนมีโครงการ ☒ ฝน ☐ คลอง/บึงน้ำธรรมชาติ
☐ น้ำบาดาล ☐ อื่นๆ.....

5. แหล่งน้ำหลักที่ใช้ทำการเพาะปลูก หลังมีโครงการ ☐ ฝน ☐ คลอง/บึงน้ำธรรมชาติ
☒ โครงการงานจัดระบบน้ำ ☐ อื่นๆ.....

6. ปริมาณน้ำที่ใช้ทำการเพาะปลูก

5.1 ก่อนมีโครงการ ☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ/ขาดแคลน

5.2 หลังมีโครงการ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ/ขาดแคลน

7. ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากโครงการ

7.1 ก่อนมีโครงการ พื้นที่เพาะปลูก จำนวน 10 ไร่

7.2 หลังมีโครงการ พื้นที่เพาะปลูก จำนวน 15 ไร่

หัวข้อที่ 2 ผลสำเร็จของงาน

หลังก่อสร้าง

การทดสอบการส่งน้ำ

3

8. พื้นที่ทำการเกษตรขอทานได้รับน้ำ และเดินทางเข้า - ออก สะดวกหรือไม่
☒ สะดวก ☐ ไม่สะดวก

9. กรณีได้รับน้ำ และเดินทางเข้า - ออกสะดวก เนื่องจาก
☒ มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ☐ พื้นที่อยู่ติดโครงการงานจัดระบบน้ำ
☐ พื้นที่อยู่ต่ำ ☒ มีทางลำเลียง
☐ อื่นๆ.....

10. กรณีได้รับน้ำ และเดินทางเข้า - ออกไม่สะดวก เนื่องจาก
☒ ไม่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ☐ พื้นที่อยู่ต่ำมาก
☐ พื้นที่อยู่ห่างไกลโครงการงานจัดระบบน้ำ ☐ ปริมาณน้ำมีน้อย
☐ ไม่มีทางลำเลียง ☐ อื่นๆ.....

11. ทางลำเลียงช่วยเพิ่มความสะดวกในการสัญจรของทนายหรือไม่
☒ ช่วยอำนวยความสะดวกทางการเกษตรได้สะดวกขึ้น
☒ ทำให้ลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้
☒ สะดวกในการสัญจรและประหยัดระยะทางลำเลียงมากขึ้น

12. ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำหรือไม่
☒ เป็น
☐ ไม่เป็น เนื่องจาก.....

13. ความพึงพอใจในการดำเนินงานก่อสร้าง ☒ มากที่สุด ☐ มาก ☐ ปานกลาง ☐ น้อย ☐ น้อยที่สุด

14. ความพึงพอใจในการทดสอบการส่งน้ำ ☒ มากที่สุด ☐ มาก ☐ ปานกลาง ☐ น้อย ☐ น้อยที่สุด

15. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ
เป็นโครงการที่ดี ได้ประโยชน์

ความพึงพอใจของผู้รับประโยชน์จากโครงการ
 ความหมาย ระดับความคิดเห็น 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 = เห็นด้วยน้อย 3 = เห็นด้วยปานกลาง
 4 = เห็นด้วยมาก 5 = เห็นด้วยมากที่สุด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	1	2	3	4	5
1. เป็นโครงการที่จำเป็นและตรงกับความต้องการของเกษตรกร					✓
2. โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม					✓
3. สิ่งก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง					✓
4. ส่งน้ำได้ทั่วถึงพื้นที่ทำการเกษตร					✓
5. ปริมาณน้ำที่ใช้ทำการเพาะปลูกเพียงพอต่อความต้องการ					✓
6. มีทางลำเลียงช่วยให้เดินทาง เข้า - ออก พื้นที่ทำการเกษตรสะดวกขึ้น					✓

ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจของผู้รับประโยชน์จากโครงการ

4

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ	
	ระดับทัศนคติ	การแปลความหมาย
๑) เป็นโครงการที่จำเป็นและตรงกับความต้องการของเกษตรกร	๔.๕๐	มากที่สุด
๒) โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม	๔.๒๕	มากที่สุด
๓) สิ่งก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง	๔.๑๐	มาก
๔) ส่งน้ำได้ทั่วถึงพื้นที่ทำการเกษตร	๓.๙๐	มาก
๕) ปริมาณน้ำที่ใช้ทำการเพาะปลูกเพียงพอต่อความต้องการ	๔.๑๐	มาก
๖) มีทางลำเลียงช่วยให้เดินทาง เข้า-ออก พื้นที่การเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	๓.๙๐	มาก

หมายเหตุ : การแปลความหมาย

คะแนน ๑.๐๐-๑.๘๐ เท่ากับ มีพึงพอใจในประเด็นนี้ น้อยที่สุด ใกล้เคียงความไม่พึงพอใจ

คะแนน ๑.๘๑-๒.๖๐ เท่ากับ มีพึงพอใจในประเด็นนี้ น้อย

คะแนน ๒.๖๑-๓.๔๐ เท่ากับ มีพึงพอใจในประเด็นนี้ ปานกลาง

คะแนน ๓.๔๑-๔.๒๐ เท่ากับ มีพึงพอใจในประเด็นนี้ มาก แต่ยังไม่สมบูรณ์นัก

คะแนน ๔.๒๑-๕.๐๐ เท่ากับ มีพึงพอใจในประเด็นนี้ มากที่สุด โดยไม่ต้องแก้ไขปรับปรุง

สรุป ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมทดสอบการส่งน้ำ
 โดยการทำแบบสำรวจ จำนวน 64 คน

หลังก่อสร้าง

การจัดทำรายงานปิดงาน

- สรุปรายละเอียดผล/รูปการก่อสร้าง
- จัดทำรายงานคำนวณชำระค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน้ำ
- จัดทำแผนผังการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

[illegible]

หลังก่อสร้าง

การถ่ายโอนภารกิจการบริหารจัดการน้ำ

กำหนดการถ่ายโอนภารกิจภายในเดือนกันยายน 2561

หัวข้อที่ 3 การบริหารจัดการน้ำ


การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกับฝ่ายส่งน้ำ/มิกติกากลุ่ม/คณะกรรมการกลุ่ม



วันที่ 11 มิถุนายน 2562

สจจ.35 ได้ประชุมกับเกษตรกรในเขตพื้นที่ดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำฯ โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาปัตตานี เพื่อจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำแต่ละสายคู โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย

ผลการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ทำให้ได้หัวหน้าและรองหัวหน้า ของแต่ละสายคู พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มพื้นฐาน งานจัดระบบน้ำฯ



หัวข้อที่ 3 การบริหารจัดการน้ำ


การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกับฝ่ายส่งน้ำ/มีกติกากลุ่ม/คณะกรรมการกลุ่ม

[illegible]

รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้ (กลุ่มพื้นฐาน)
งานจัดระบบน้ำฯ ตำบลควนโนรี ระยะที่ 1

หัวข้อที่ 3 การบริหารจัดการน้ำ

การประเมินประสิทธิภาพการส่งน้ำ

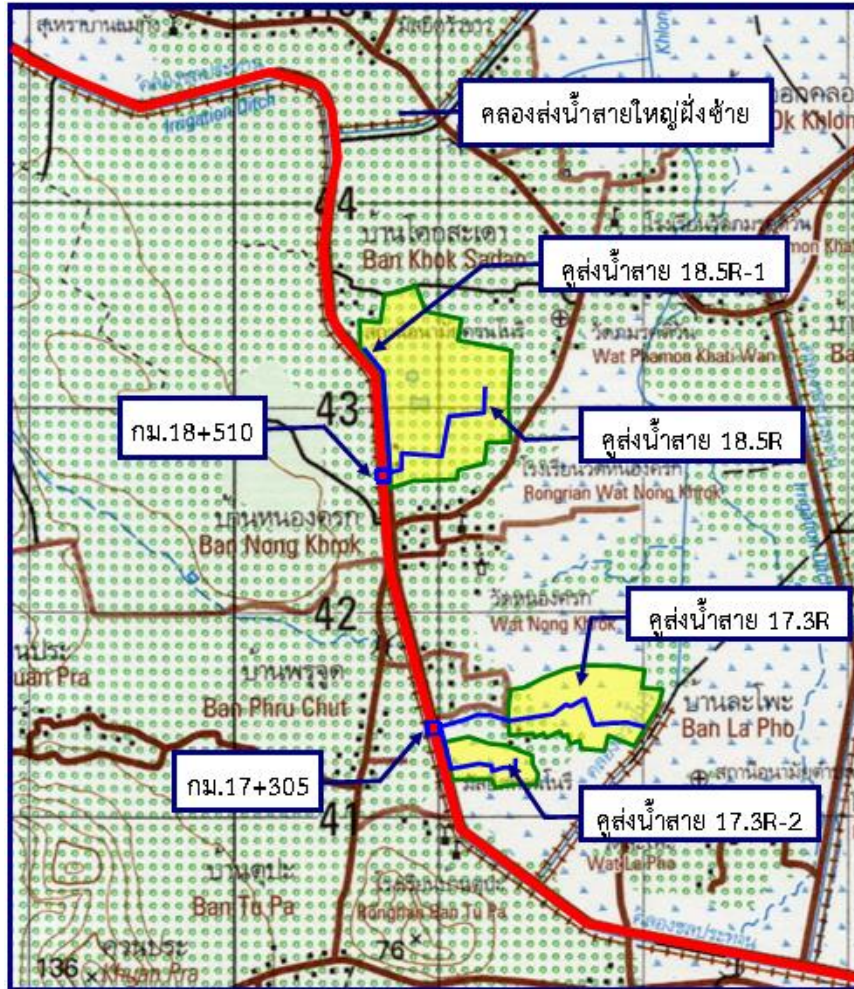

คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย LMC (กม.14+900 ถึง กม.18+080)	ส่งน้ำได้ในอัตรา 4.697 ลบ.ม./วินาที
คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย LMC (กม.18+080 ถึง กม.20+300)	ส่งน้ำได้ในอัตรา 4.473 ลบ.ม./วินาที
คูส่งน้ำสาย 17.3R , 17.3R-2 18.5R , 18.5R-1	ส่งน้ำได้ในอัตรา 0.120 ลบ.ม./วินาที

ในช่วงฤดูการเพาะปลูก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี มีการส่งน้ำอยู่ในคลองส่งตลอดเวลา ทำให้คูส่งน้ำสามารถรับน้ำและส่งไปยังพื้นที่การเกษตรได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูกาลเพาะปลูก

ปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่งน้ำ

- ความยาวของคูส่งน้ำแต่ละสายคูในพื้นที่โครงการ มีความยาวที่เหมาะสม ไม่เกิน 1,500 เมตร
- จำนวนท่อส่งน้ำเข้าแปลงนามีจำนวนเหมาะสมต่อพื้นที่การเกษตร

ดังนั้นในเขตพื้นที่งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี) ระยะที่ 1 มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะส่งน้ำเข้าคูส่งน้ำและกระจายน้ำสู่แปลงนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการน้ำในระดับคูส่งน้ำ/รอบเวร

คูส่งน้ำ 18.5R และ 18.5R-1



หัวข้อที่ 3 การบริหารจัดการน้ำ

การบริหารจัดการน้ำในระดับคูส่งน้ำ/รอบเวร

หน่วย หมุนเวียน ย่อยที่	แปลงเลขที่	พื้นที่ (ไร่)	รวมพื้นที่ (ไร่)	ช่วงวัน - เวลาที่ได้ใช้น้ำ
1	116	2.00	77.72	จ. 8.00 น. - อ.8.00 น.
	117	1.67		
	118	1.81		
	119	2.98		
	120	2.65		
	121	1.68		
	122	1.83		
	123	2.24		
	124	2.45		
	125	2.59		
	127	5.03		
	128	2.14		
	129	2.44		
	130	10.43		
	131	3.39		
	132	2.59		
	133	5.03		
	134	2.14		
2	189	2.44	53.06	อ. 8.00 น. - พ.8.00 น.
	190	10.43		
	189	2.59		
	190	5.03		
	191	2.14		
	47	2.02		
	48	2.02		
	49	2.07		
	53	1.30		
	70	1.23		
	126	2.07	53.06	อ. 8.00 น. - พ.8.00 น.
	3	2.99		
	43	2.56		
	46	2.46		
	50	2.59		

หน่วย หมุนเวียน ย่อยที่	แปลงเลขที่	พื้นที่ (ไร่)	รวมพื้นที่ (ไร่)	ช่วงวัน - เวลาที่ได้ใช้น้ำ
2	51	2.31	53.06	อ. 8.00 น. - พ.8.00 น.
	54	3.09		
	69	3.07		
	200	2.31		
	201	3.39		
	202	2.49		
	203	15.09		
3	106	9.19	37.2148	พ. 8.00 น. - พฤ. 8.00 น.
	107	2.93		
	108	3.14		
	192	4.37		
	196	4.36		
	197	4.06		
	198	4.76		
	199	4.41		
4	55	3.67	59.14	พฤ. 8.00 น. - ศ. 8.00 น.
	56	4.22		
	57	4.23		
	58	2.52		
	59	2.46		
	60	7.71		
	61	11.39		
	62	4.10		
	63	9.93		
	64	1.82		
	65	2.03		
	66	2.91		
	67	2.16		

การบริหารจัดการน้ำในระดับคูส่งน้ำ/รอบเวร

คูส่งน้ำ 17.3R และ 17.3R-3



หัวข้อที่ 3 การบริหารจัดการน้ำ

การบริหารจัดการน้ำในระดับคูส่งน้ำ/รอบเวร

หน่วย หมุนเวียน	แปลงเลขที่	พื้นที่ (ไร่)	รวมพื้นที่ (ไร่)	ช่วงวัน - เวลาที่ได้ใช้น้ำ
1	79	2.86	37.37	จ. 8.00 น. - อ. 8.00 น.
	80	5.81		
	81	2.84		
	82	7.15		
	138	6.96		
	139	4.04		
	140	2.24		
2	202	5.47	46.48	อ. 8.00 น. - พ. 8.00 น.
	70	1.40		
	71	1.80		
	72	4.00		
	73	7.22		
	74	7.31		
	75	3.64		
	76	2.80		
	77	10.07		
	78	2.25		
3	135	2.44	86.24	พ. 8.00 น. - พ. 8.00 น.
	200	3.55		
	16	7.22		
	17	7.31		
	18	3.64		
	19	2.80		
	21	2.25		
	22	2.44		
	23	3.55		
	24	2.90		
	25	4.76		
	34	0.87		
	171	3.32		
	156	3.07		
	157	8.76		

หน่วย หมุนเวียน	แปลงเลขที่	พื้นที่ (ไร่)	รวมพื้นที่ (ไร่)	ช่วงวัน - เวลาที่ได้ใช้น้ำ
3	28	2.82	86.24	พ. 8.00 น. - พ. 8.00 น.
	29	3.18		
	30	4.47		
	31	3.39		
	152	6.94		
	32	8.99		
4	33	3.55	83.47	พ. 8.00 น. - ศ. 8.00 น.
	15	6.48		
	36	4.12		
	37	6.55		
	159	12.22		
	160	2.02		
	161	6.01		
	162	3.67		
	163	2.73		
	164	2.38		
	165	2.44		
	166	5.81		
	169	5.14		
	173	4.66		
	174	4.65		
	176	6.05		
	177	4.26		
	178	4.30		
	180	0.00		
	181	0.00		
	183	0.00		

หน่วย หมุนเวียน ย่อยที่	แปลงเลขที่	พื้นที่ (ไร่)	รวมพื้นที่ (ไร่)	ช่วงวัน - เวลาที่ได้ใช้น้ำ
5	6	2.99	80.58	ศ. 8.00 น. - ส. 8.00 น.
	7	8.15		
	9	5.26		
	10	3.02		
	11	2.78		
	12	6.41		
	13	4.15		
	14	7.48		
	98	3.77		
	99	5.70		
	103	8.49		
	104	4.31		
	105	3.26		
	185	3.12		
	186	4.43		
	187	3.61		
	188	3.65		

การจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ



วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

สจจ.35 จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

ณ. อาคารเอนกประสงค์ สจจ.35

โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 30 คน



นายธรรมบุญ บำรุงเพชร จน.คบ.ปัตตานี

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและการบริหารจัดการน้ำชลประทาน และการมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาระบบชลประทานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน

การจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต




คุณดวงเนตร ชูผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
จากสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ปัตตานี เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ “การจัดทำบัญชีครัวเรือน”



คุณสาเกี๊ยะ ดาหวิ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ
จากศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ
“เทคนิคการปลูกข้าวและการกำจัดศัตรูพืช”


หัวข้อที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) มาวางแผนปลูกพืชในพื้นที่

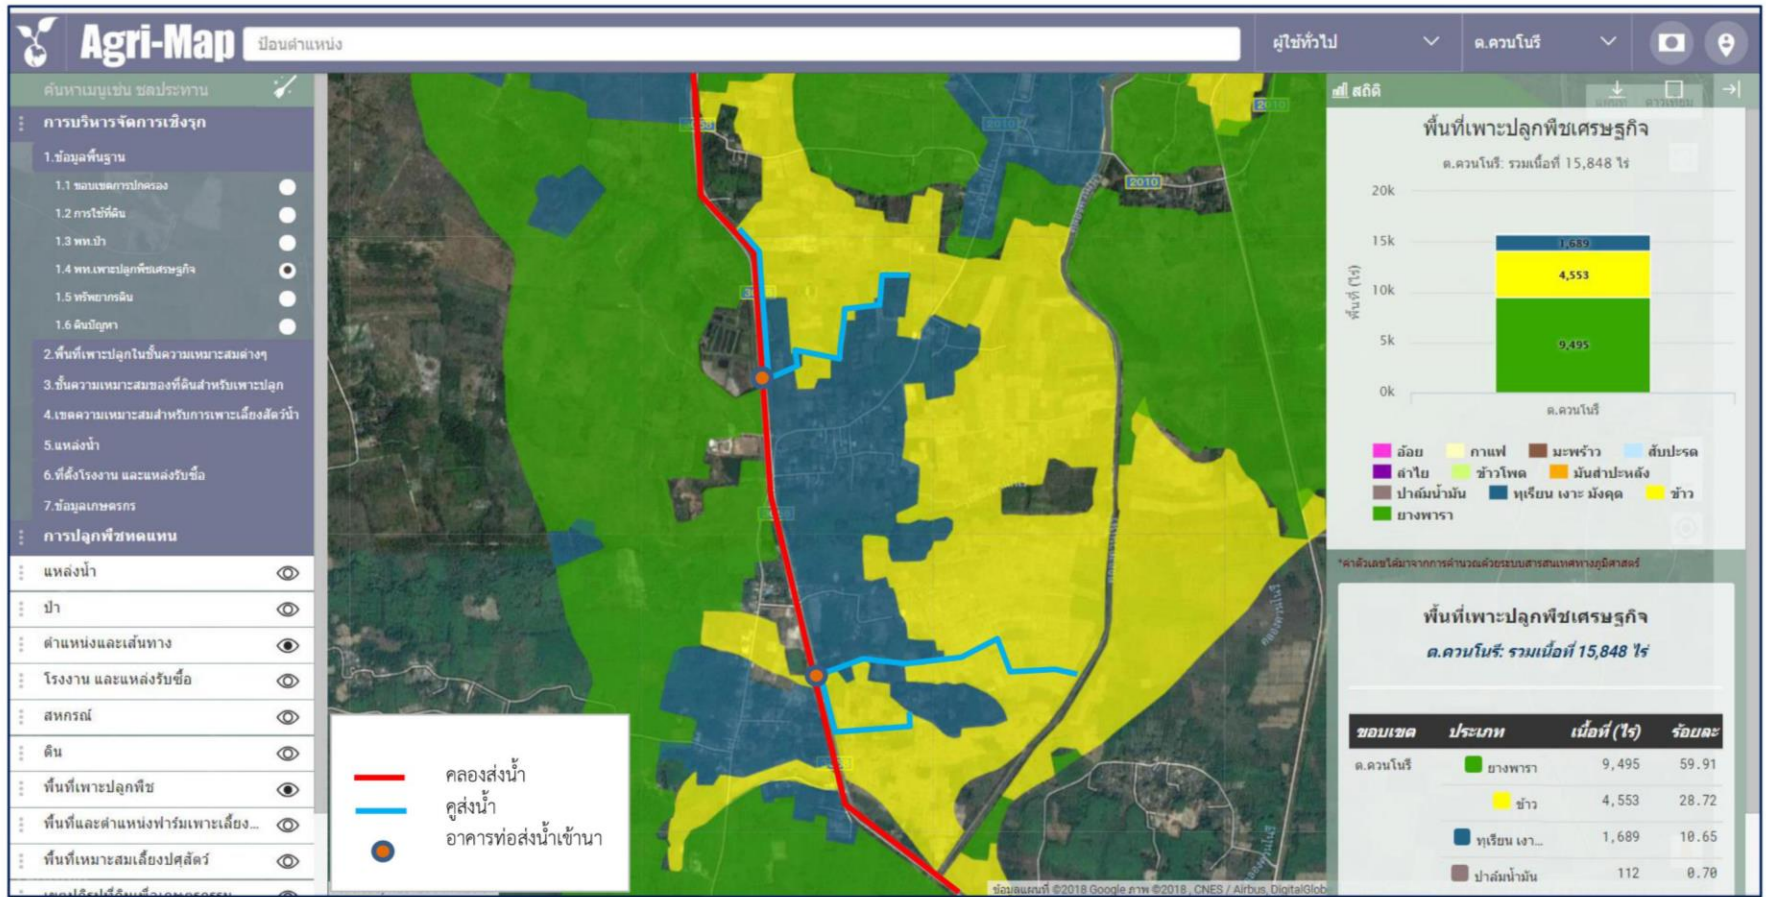

แสดงการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่

การใช้ประโยชน์ในที่ดินมีความสอดคล้องกับการบริการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (zoning)

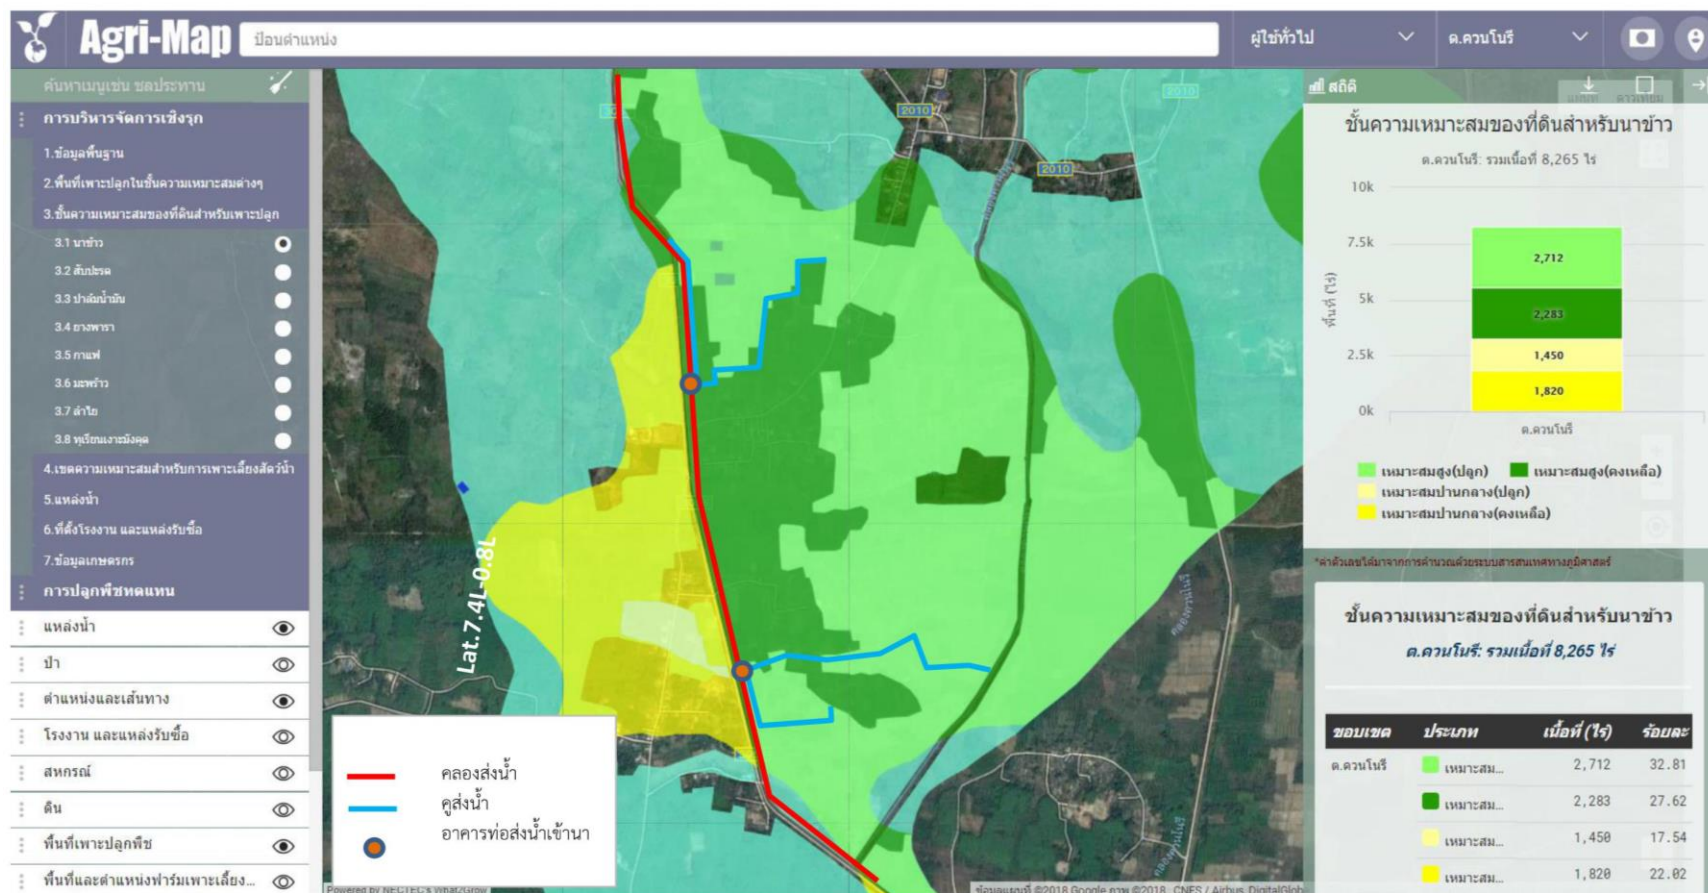

แสดงความเหมาะสมของที่ดินในการปลูกข้าว

การประสานแผนงานและบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ผจจ.35 มอบหมายให้ นายเอกพล สุวรรณรัตน์ สน.๓๕ จด. เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี



วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

ผจจ.35 มอบหมายให้ นายเอกพล สุวรรณรัตน์ สน.๓๕ จด. เข้าร่วมประชุมกับ หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย ผลผลิตทางการเกษตร และจัดนิทรรศการภายในงานแสดงสินค้า วัฒนธรรมของดีเมืองตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมลังกาสุกะ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

หัวข้อที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การประสานแผนงานและบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ผจจ.35 มอบหมายให้ นายเอกชัย พูลนวล วศ.35จด.
เข้าร่วมประชุม กับ ศอ.บต. เรื่องการบริหารจัดการน้ำใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้



วันที่ 11 มิถุนายน 2561

ผจจ.35 มอบหมายให้ นายอุสมาน ปุโต๊ะ นายช่างชลประทาน
เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยมยั่งยืนกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลควนโนรี

หัวข้อที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การประสานแผนงานและบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ผจจ.35 มอบหมายให้ นายเอกชัย พูลนวล วศ.๓๕ จด.
ประชุมร่วมกับอำเภอโคกโพธิ์ เพื่อชี้แจงรายละเอียด
งานจัดระบบน้ำฯ ตำบลควนโนรี ระยะที่ ๑



เจ้าหน้าที่ สจจ.35 เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน อำเภอโคกโพธิ์

หัวข้อที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การประสานแผนงานและบูรณาการการดำเนินงานใน 3 ภาคส่วน หรือ ประชากร ได้แก่รัฐ เอกชน และภาคสังคม



ก่อนก่อสร้าง ได้มีการจัดประชุมเวทีประชาคม โดยเน้นการมีส่วนร่วม และบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชน และเอกชน ได้เข้าใจในขั้นตอนการทำงาน และไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับราชการ

หัวข้อที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การประสานแผนงานและบูรณาการการดำเนินงานใน 3 ภาคส่วน หรือ ประชารัฐ ได้แก่ รัฐ เอกชน และภาคสังคม



ระหว่างก่อสร้าง จัดประชุมการมีส่วนร่วม ชี้แจง
ผลดำเนินงาน จัดตั้งคณะกรรมการจัดระบบน้ำชุมชน
จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และให้ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็น ความพึงพอใจในการทำงาน และจัด
ฝึกอบรมให้กับเกษตรกร โดยให้หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนร่วมถ่ายทอดความรู้ และ
เทคโนโลยี ตลอดจนให้เกษตรกรนำผลผลิตมาวาง
จำหน่ายในตลาดประชารัฐ



หัวข้อที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การประสานแผนงาน และบูรณาการการดำเนินงานใน 3 ภาคส่วน หรือ ประชารัฐ ได้แก่รัฐ เอกชน และภาคสังคม



หลังก่อสร้าง ให้ประชาชน ส่วน ราชการ และ ภาคเอกชน ได้ร่วมทดสอบการส่งน้ำ ประเมิน ประสิทธิภาพการส่งน้ำ และผลงานก่อสร้าง ก่อนที่ อปท.จะรับมอบภารกิจไปบริหารจัดการน้ำ และดูแลบำรุงรักษาร่วมกับเกษตรกร เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ต่อไป



การถ่ายโอนภารกิจการบริหารจัดการน้ำ

รายงานแผนและผลการถ่ายโอนงานก่อสร้างคันคูน้ำให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓๕
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน

ที่	ชื่อโครงการ	ที่ตั้ง				พื้นที่ได้รับ	ปีที่	แผนการถ่ายโอน		ผลการถ่ายโอน	หมายเหตุ
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ประโยชน์ (ไร่)	ก่อสร้างเสร็จ	เดือน/ปี	อปท.ที่รับโอน	ระบุ วัน/เดือน/ปี	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
1	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561										
	งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี) ระยะที่ 1	4,5	ควนโนรี	โคกโพธิ์	ปัตตานี	600	2561	กันยายน ๒๕๖๑	อบต.ควนโนรี	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง และคูส่งน้ำบางสาย ได้ทำการทดสอบการส่งน้ำไปแล้ว

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกรในพื้นที่



วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

นายสมบุรณ์ ยอดขาว ผจจ.35 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ประชาชน และจิตอาสา ตำบลควนโนรี ทำกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน บริเวณลาดคันคูส่งน้ำสาย 18.5R งานจัดระบบน้ำฯ (ตำบลควนโนรี) ระยะที่ ๑ ณ บ้านหนองครก หมู่ที่ 4 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี



วันที่

ผจจ.35 มอบหมายให้ นายเอกชัย พูลนวล วศ.35จด.

เป็นตัวแทน สจจ.35 มอน้ำดื่มในการฝึกอบรม ชรบ.ตำบลควนโนรี

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกรในพื้นที่



วันที่ 24 เมษายน 2561

นายสมบุรณ์ ยอดขาว ผจก.35 มอบหมายให้ นายเอกชัย พูลนวล วศ.35 จด. เป็นตัวแทน สจจ.35 มอบเครื่องดื่ม ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา อบต.ควนโนรีคัพ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๑



วันที่ 8 พฤษภาคม

ผจก.35 มอบหมายให้ นายเอกชัย พูลนวล วศ.35 จด. เป็นตัวแทน สจจ.35 มอบน้ำดื่มให้กับกลุ่มแม่บ้าน ตำบลควนโนรี

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกรในพื้นที่



วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

นายสมบุรณ์ ยอดขาว ผจก.35 มอบหมายให้ นายเอกชัย พูลนวล วศ.35 จด. เป็นตัวแทน สจจ.35 มอบอินทผาลัมให้กับมัสยิด และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ตำบลควนโนรี เนื่องในเดือนรอมฎอน ถือศีลอดของพี่น้องมุสลิม ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. – 17 มิถุนายน 2561



วันที่ 7 มิถุนายน 2561

ผจก.35 ได้เชิญผู้นำชุมชน พี่น้องมุสลิม ตำบลควนโนรี และพี่น้องมุสลิมที่อยู่ใกล้เคียงที่ตั้งสำนักงาน ร่วมกิจกรรมรับประทานอาหาร ละศีลอดเนื่องในเดือนรอมฎอน ณ ที่ทำการ สจจ.35

การสำรวจความพึงพอใจ



การประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรก่อนและหลังโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ดำเนินการก่อสร้างในปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของเกษตรกรต่อการก่อสร้างงานจัดจ้ดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมก่อนและหลังโครงการโดยใช้แบบสัมภาษณ์ทั้งปลายปิดและเปิด

การเก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Sampling) ขณะทำการเก็บข้อมูลผลงานความก้าวหน้า งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี) ระยะที่ 1 ได้ร้อยละ 87.98 (ช่วงวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2561)

หัวข้อที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การสำรวจความพึงพอใจ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓๕

ประเด็น	ก่อนโครงการ (๒๖ ราย)	
ในพื้นที่ทำการเกษตร	ระดับทัศนคติ	การแปลความหมาย
กระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ		
๑) ขั้นตอน/ระเบียบวิธีการ ในการขอรับบริการ มีความเหมาะสม ชัดเจน ไม่ยุ่งยาก	๔.๔๐	มากที่สุด
๒) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ให้บริการได้ตามขั้นตอน และระยะเวลาที่ประกาศไว้	๔.๒๓	มากที่สุด
ความสะดวกสบาย/ สิ่งอำนวยความสะดวก		
๑) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้บริการที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย	๓.๘๐	มาก
๒) การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ ห้องน้ำสะอาด มีที่จอดรถ เป็นต้น อย่างเพียงพอ และมีป้ายบอกทางสำนักงานชัดเจน	๓.๖๗	มาก
๓) เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกได้อย่างเหมาะสม	๔.๒๓	มากที่สุด
ระยะเวลาการให้บริการ		
๑) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมสามารถให้บริการแต่ละครั้งได้รวดเร็ว	๓.๗๐	มาก
๒) การให้บริการตามลำดับทุกครั้ง	๓.๖๐	มาก
การให้บริการของเจ้าหน้าที่		
๑) เจ้าหน้าที่มีความรู้ในเรื่องที่ให้บริการเป็นอย่างดี	๓.๖๓	มาก
๒) เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ (การพูดจา/มารยาท/การแต่งกายเรียบร้อย) และมีความเป็นมิตร	๔.๓๓	มากที่สุด
๓) เจ้าหน้าที่กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ	๓.๗๐	มาก
๔) เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำในการให้บริการ ตอบข้อซักถาม โดยให้ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน เพียงพอ	๓.๕๐	มาก
๕) การให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ เช่น ติดตามเรื่องที่เข้ารับบริการ เป็นต้น	๓.๔๗	มาก
๖) มีการให้บริการอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ	๓.๖๐	มาก
ความครอบคลุมและทั่วถึงของการให้บริการ		
๑) การให้บริการในงานสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ครอบคลุม ทุกถึง	๔.๓๐	มากที่สุด
๒) เจ้าหน้าที่ให้บริการได้ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายครบถ้วน และทั่วถึง	๓.๗๐	มาก
ความพึงพอใจด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดิน		
๑) การจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการผลิตในระดับแปลงเกษตร มีประโยชน์ ตรงกับความต้องการของท่าน	๔.๓๐	มากที่สุด
๒) ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การบริการจัดการน้ำด้วยตนเอง/รักษาสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานที่รัฐสร้างให้ เช่น ถนน คู คลอง/ ในการทำเกษตรกรรม ฯลฯ	๔.๒๗	มากที่สุด

ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.4 – 4.2
รู้สึกเห็นด้วย

หมายเหตุ : การแปลความหมาย

คะแนน ๑.๐๐-๑.๘๐ เท่ากับ มีความคิดเห็น มุมมอง รู้สึก ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

คะแนน ๑.๘๑-๒.๖๐ เท่ากับ มีความคิดเห็น มุมมอง รู้สึก ไม่เห็นด้วย

คะแนน ๒.๖๑-๓.๔๐ เท่ากับ มีความคิดเห็น มุมมอง รู้สึก เฉยๆ

คะแนน ๓.๔๑-๔.๒๐ เท่ากับ มีความคิดเห็น มุมมอง รู้สึก เห็นด้วย

คะแนน ๔.๒๑-๕.๐๐ เท่ากับ มีความคิดเห็น มุมมอง รู้สึก เห็นด้วยอย่างยิ่ง

หัวข้อที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การสำรวจความพึงพอใจ ทัศนคติต่อการก่อสร้างก่อนและหลังดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน

ประเด็น	ก่อนโครงการ (๒๖ ราย)	
	ระดับทัศนคติ	การแปลความหมาย
๑) ท่านคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม	๔.๑๓	เห็นด้วย
๒) การชี้แจงงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมให้แก่เจ้าของที่ดิน มีความเหมาะสม ชัดเจน	๓.๘๓	เห็นด้วย
๓) มีการแจ้ง ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการอย่างเพียงพอ	๓.๘๗	เห็นด้วย
๔) การสอบถามความสนใจและการจัดทำบันทึกยินยอมเพื่อเข้าร่วมโครงการ มีความเหมาะสม ชัดเจน ไม่ยุ่งยาก	๓.๗๐	เห็นด้วย
๕) ท่านรับรู้ข้อมูลของผลประโยชน์ของงานก่อสร้างเพื่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ	๔.๐๐	เห็นด้วย
๖) ท่านรับรู้ข้อมูลการเสียพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพื่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ	๓.๖๓	เห็นด้วย
๗) ท่านมีความจำเป็นต้องมีคู่มือถึงแปลงเกษตร	๔.๒๗	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
๘) ท่านมีความจำเป็นต้องมีคู่มือรายน้ำออกจากแปลงเกษตร	๔.๓๐	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
๙) ท่านมีความจำเป็นต้องมีถนน ทางลัดเข้าออกในแปลงเกษตร	๔.๓๓	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
๑๐) พื้นที่ทำการเกษตรของท่านมีการใช้น้ำเพียงพอในการทำการเกษตร	๓.๓๓	เฉยๆ
๑๑) ท่านคิดว่ามีความจำเป็นต้องมีกลุ่มบริหารจัดการน้ำ	๔.๐๓	เห็นด้วย
๑๒) ก่อนดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ท่านคิดว่าชุมชน/พื้นที่ของท่านมีความสามัคคีในการใช้น้ำทำการเกษตร	๓.๓๗	เฉยๆ

ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.4– 4.2
รู้สึกเห็นด้วย

หมายเหตุ : การแปลความหมาย

คะแนน ๑.๐๐-๑.๘๐ เท่ากับ มีความคิดเห็น มุมมอง รู้สึก ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

คะแนน ๑.๘๑-๒.๖๐ เท่ากับ มีความคิดเห็น มุมมอง รู้สึก ไม่เห็นด้วย

คะแนน ๒.๖๑-๓.๔๐ เท่ากับ มีความคิดเห็น มุมมอง รู้สึก เฉยๆ

คะแนน ๓.๔๑-๔.๒๐ เท่ากับ มีความคิดเห็น มุมมอง รู้สึก เห็นด้วย

คะแนน ๔.๒๑-๕.๐๐ เท่ากับ มีความคิดเห็น มุมมอง รู้สึก เห็นด้วยอย่างยิ่ง

หัวข้อที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การสำรวจความพึงพอใจ ทัศนคติต่อการก่อสร้างหลังมีโครงการ

ประเด็น	หลังโครงการ (๒๖ ราย)	
ในพื้นที่ทำการเกษตร	ระดับทัศนคติ	การแปล ความหมาย
๑) การชี้แจงแบบ แนวก่อสร้าง และทำความเข้าใจตกลงกำหนดแปลงที่ดินใหม่ เพื่อขอ ความเห็นชอบจากเจ้าของที่ดิน มีความเหมาะสม และชัดเจน	๔.๓๐	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
๒) การดำเนินการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานจากเจ้าของที่ดิน มีความเหมาะสม ชัดเจน และไม่ยุ่งยาก	๔.๓๓	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
๓) ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการก่อสร้างมีความเหมาะสมและรวดเร็ว	๔.๔๓	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
๔) ความพึงพอใจต่อภาพรวมผลงานการก่อสร้าง	๔.๖๐	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
๕) ความพึงพอใจต่อการสร้างถนนเข้าสู่แปลงทำการเกษตร	๔.๕๓	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
๖) เจ้าหน้าที่โครงการมีความเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่และความสม่ำเสมอใน การออกตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการ	๔.๕๓	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
๗) กิจกรรมที่ทางสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรม จัดส่งเสริม การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในเขตโครงการฯ	๔.๔๓	เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ระดับคะแนนอยู่ในช่วง 4.2-5.0
รู้สึกเห็นด้วยอย่างยิ่ง

หมายเหตุ : การแปลความหมาย

คะแนน ๑.๐๐-๑.๘๐ เท่ากับ มีความคิดเห็น มุมมอง รู้สึก ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

คะแนน ๑.๘๑-๒.๖๐ เท่ากับ มีความคิดเห็น มุมมอง รู้สึก ไม่เห็นด้วย

คะแนน ๒.๖๑-๓.๔๐ เท่ากับ มีความคิดเห็น มุมมอง รู้สึก เฉยๆ

คะแนน ๓.๔๑-๔.๒๐ เท่ากับ มีความคิดเห็น มุมมอง รู้สึก เห็นด้วย

คะแนน ๔.๒๑-๕.๐๐ เท่ากับ มีความคิดเห็น มุมมอง รู้สึก เห็นด้วยอย่างยิ่ง

บัญชีฟาร์ม



วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

สจจ.35 เชิญวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ให้ความรู้เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือนและการทำบัญชีฟาร์ม กับเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไว้



เกษตรผสมผสาน



เจ้าหน้าที่สจจ.35 เยี่ยมชมการทำเกษตรผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ดำเนินการ และประชาสัมพันธ์งานจัดระบบน้ำ ตลอดจนดูแลบำรุงรักษาคูส่งน้ำ เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุด



แสดงกลุ่มอาชีพและปัจจัยการผลิต



เจ้าหน้าที่สจ.35 เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพต่างๆใน
เขตพื้นที่ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ



การเสนอโครงการให้กับ คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไข ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด



สจจ.35 เป็นส่วนหนึ่งในคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดและระดับอำเภอ พร้อมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและบูรณาการแผนงาน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี) ระยะที่ 1 อยู่ในพื้นที่ซึ่งประชาชน มีความแตกต่างทางด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีความรุนแรงและเกิดความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การทำงานจึงมีปัญหา และอุปสรรคขึ้นมาบ้าง ดังนี้

1. การสื่อสาร ในพื้นที่ใช้ภาษายาวีเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เป็นอุปสรรคในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน และบางครั้งอาจก่อให้เกิดความความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และส่งผลให้มีความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

2.การเดินทาง ไปปฏิบัติหน้าที่/ติดต่อประสานงาน/พบปะประชาชน/ตรวจงานก่อสร้าง และทำ กิจกรรมอื่นๆในพื้นที่ อาจมีความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัย เนื่องจากอาจจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงและการก่อความไม่สงบในพื้นที่ขึ้นได้ ระหว่างการเดินทาง และขณะปฏิบัติงานในพื้นที่

3. ความไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมีหวาดระแวงต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงเกิดอุปสรรคในการเข้าพื้นที่ และทำความเข้าใจกับประชาชน

ข้อเสนอแนะ การทำงานในพื้นที่ ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วม สร้างการรับรู้ และ ความเข้าใจ โดยเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ก่อนก่อสร้าง ระหว่าง และหลังก่อสร้าง พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทุกภาคส่วน ร่วมกันส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิด ความตระหนัก มีความเข้าใจ ยอมรับ ในความต่างทางศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีจิตอาสาตลอดการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนรู้สึกถึงความ ตั้งใจของหน่วยงานที่จะเข้ามาพัฒนาและแก้ไขให้พื้นที่ ให้มีการสร้างงาน สร้างรายได้ และมีคุณภาพความเป็นอยู่ของชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง

เนื่องด้วย พื้นที่ตำบลควนโนรี ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรที่ผสมผสาน การทำนา ปลูกลำไย พารา ปลูกลำไย น้ำมัน ทำสวน ปลูกลำไยผักต่างๆ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ และยังมีการรวมกลุ่มทำนาแบบเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งในพื้นที่มีทั้งชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม ทำให้มีความแตกต่างทางด้านศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม หลังจากที่ สจจ.35 ได้เข้าไปดำเนินการประชุม ทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังก่อสร้าง ระบบส่งน้ำตำบลควนโนรี ระยะที่1 ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีความผูกพัน ใกล้ชิด เข้าใจกันมากขึ้น ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมกันทำกิจกรรมด้วยดีมาตลอด

จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ
