



รายงานการประกวด

โครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมประจำปี ๒๕๖๑

งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่๔)

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑



บทที่ ๑
ข้อมูล
โครงการ

สภาพทั่วไป

วัตถุประสงค์

พื้นที่ดำเนินโครงการ

ลักษณะโครงการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

สภาพทั่วไป

โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด 47QMA 742-488 ระวาง 4746II (แผนที่ 1:50,000) ครอบคลุมพื้นที่ 4,089 ไร่ เริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ภายใต้ชื่อโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ 1) เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

- **สภาพภูมิประเทศ** มีลักษณะเป็นที่ดอน (Roll Area) พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ปลูกสวนลำไย มะม่วง และพืชล้มลุก (เอกสารอ้างอิง : องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, 2560)

- **สภาพภูมิอากาศ** อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 28.9°C ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 69.90 มม.

- **แหล่งน้ำ – แหล่งน้ำธรรมชาติ** ได้แก่ สระ หนองน้ำ


- **แหล่งน้ำชลประทาน** ได้แก่ อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อเป็นอ่างฯ ในโครงการพระราชดำริ สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชดำริให้ กรมชลประทานพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ และอำเภอจอมทองได้น้ำไว้ใช้สำหรับการเพาะปลูกในฤดูฝน ฤดูแล้ง และการอุปโภค-บริโภค

วัตถุประสงค์ งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ ๔)






พื้นที่งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรมที่ 1

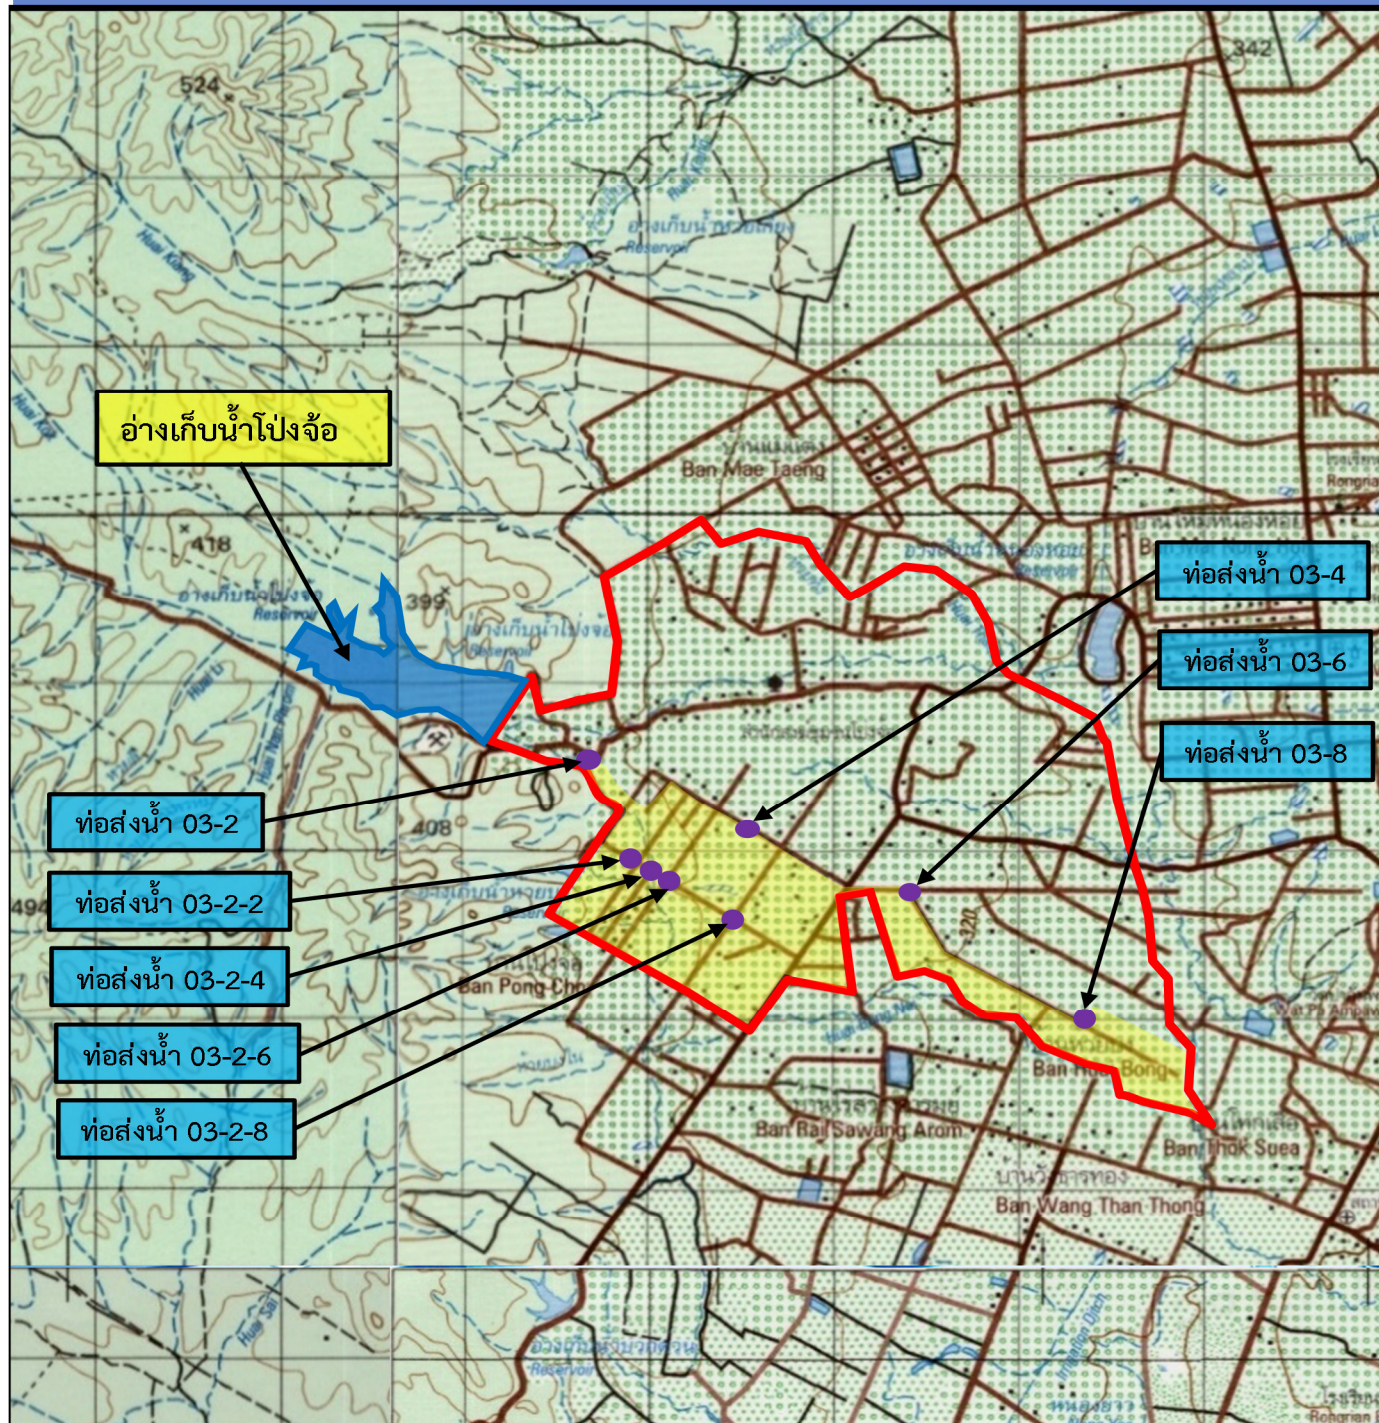


พื้นที่ดำเนินโครงการ งาน
จัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำ
โป่งจ้อ (ระยะที่ 4) ครอบคลุม
พื้นที่ตำบลดอยหล่อ จำนวน
ทั้งสิ้น 1,100 ไร่

ท่อส่งน้ำจำนวน 8 สาย คือ
03-2, 03-2-2, 03-2-4, 03-2-6,
03-2-8,
03-4, 03-6, 03-8

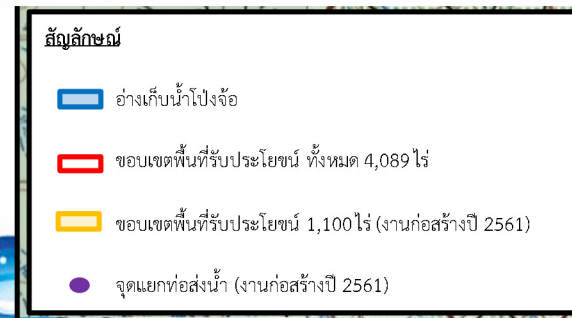




งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่1

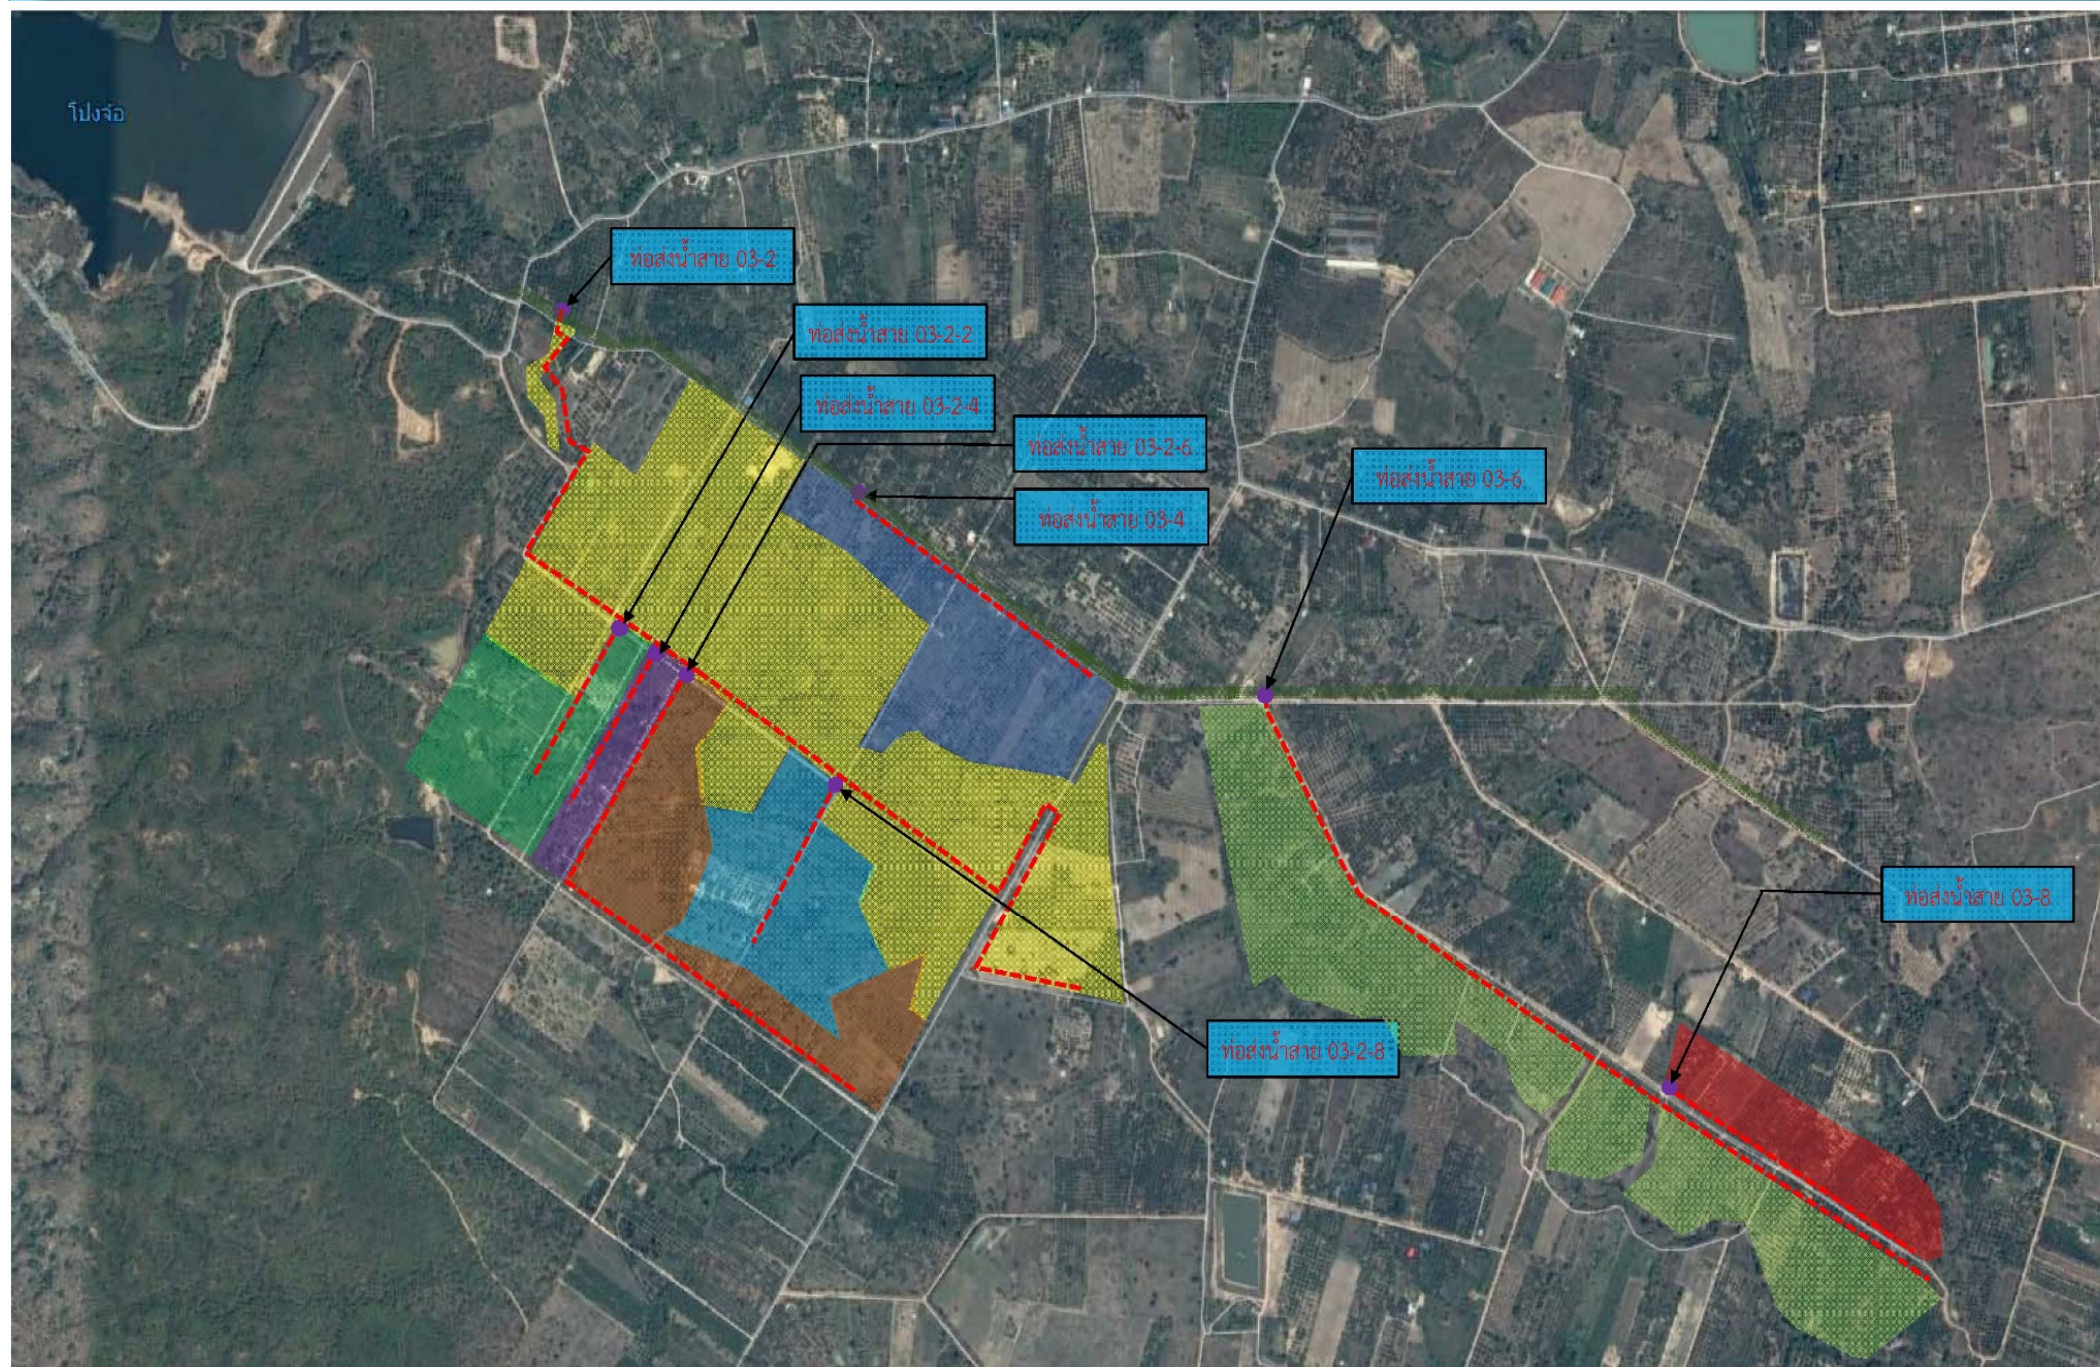



แผนผังการจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรมที่ 1

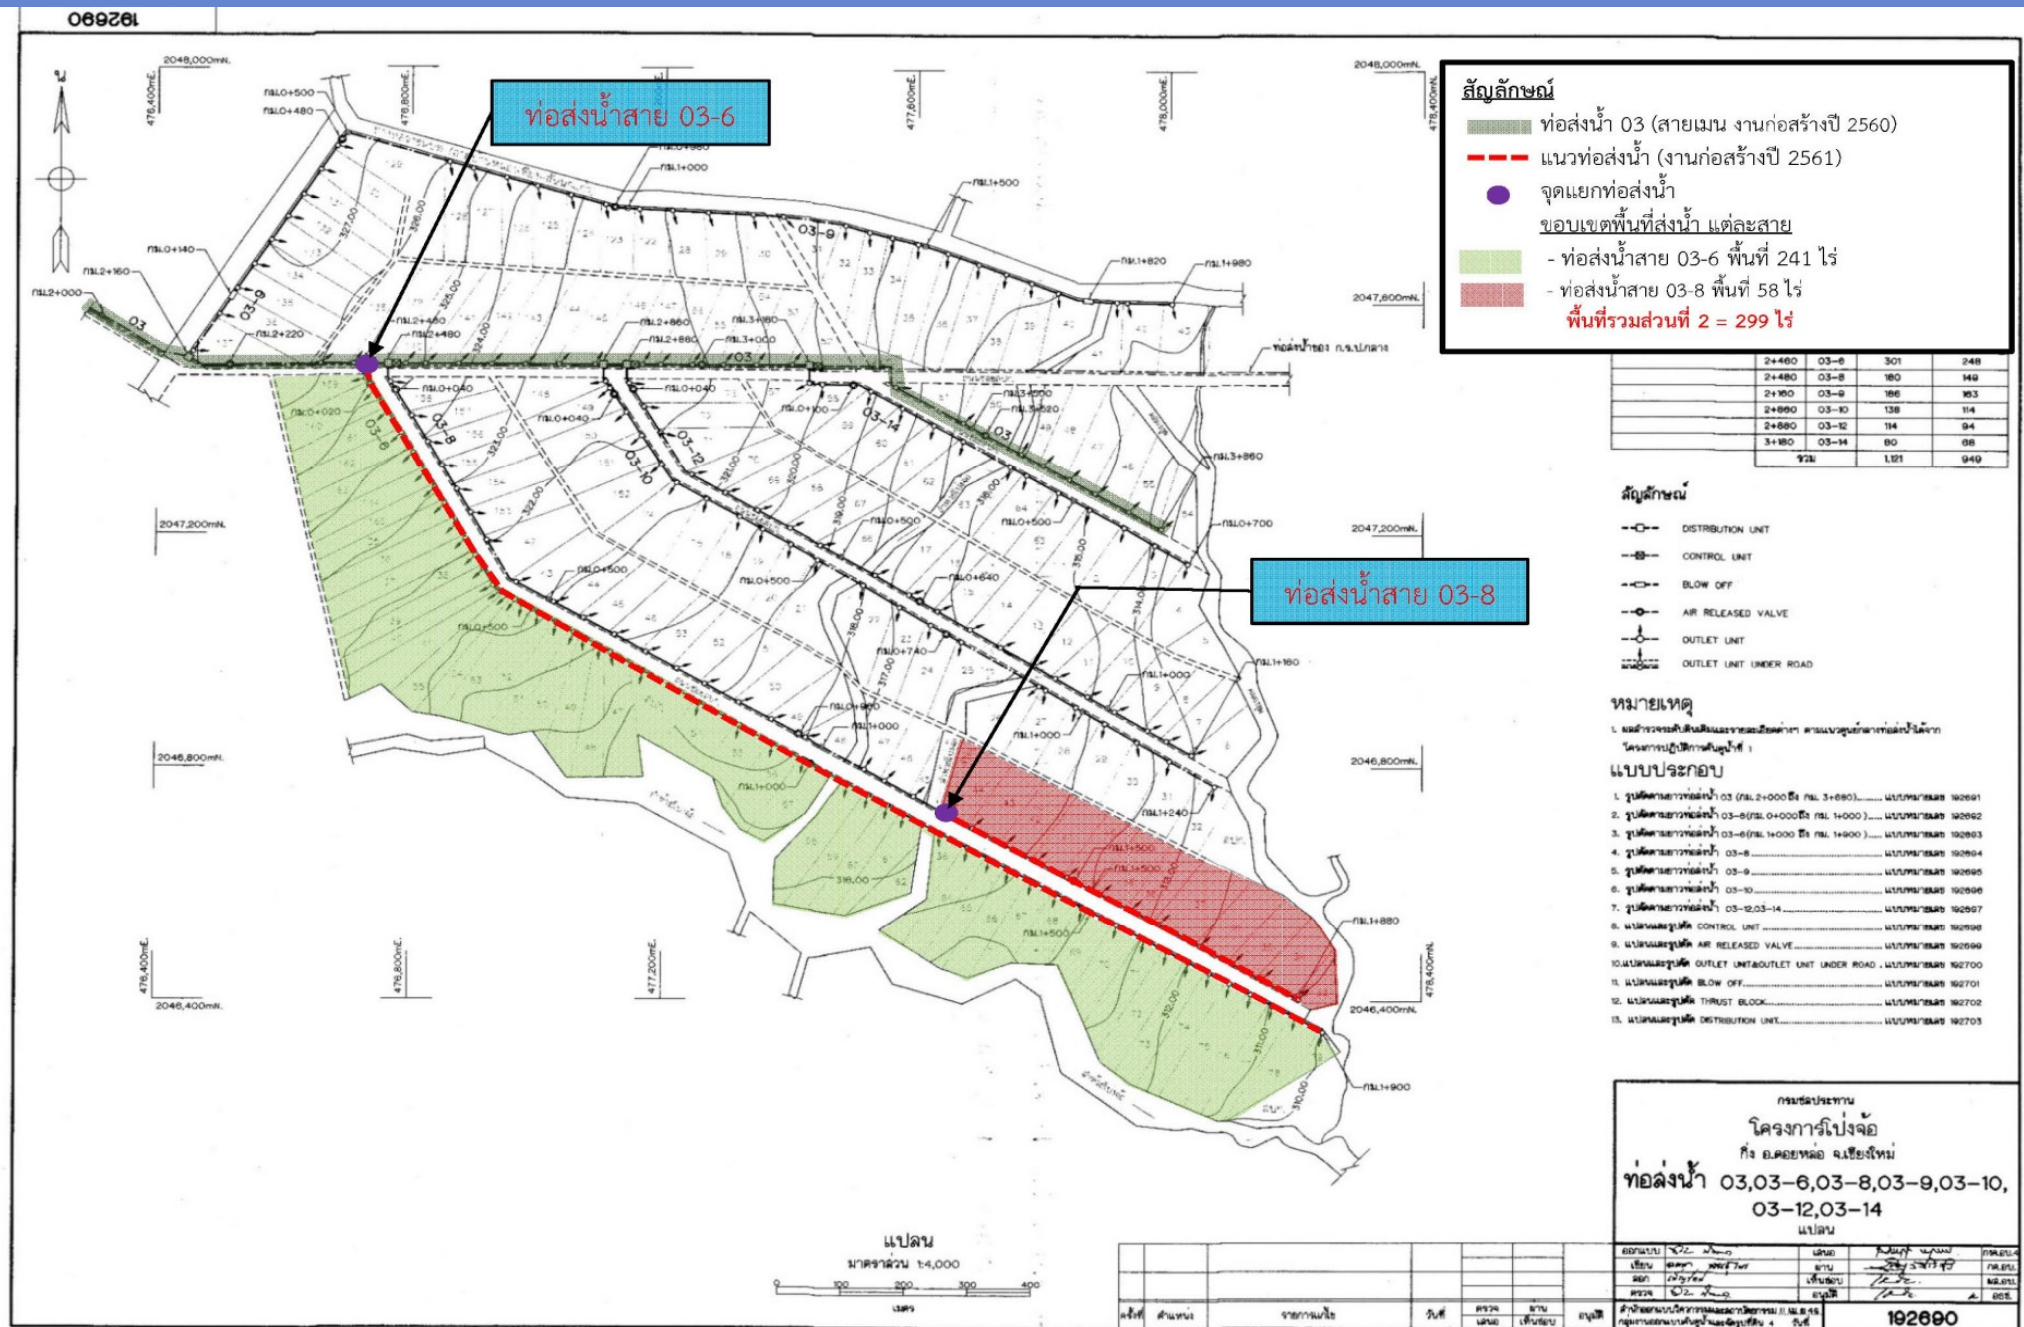



ประโยชน์ที่ได้รับ งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ ๔)

ประโยชน์ที่
ได้รับ

๑.สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
แพร่กระจายน้ำ

๓.สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๒.สามารถบริหารจัดการน้ำ
วางแผนส่งน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ



สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1

กรมชลประทาน



บทที่ ๒
ผลสำเร็จ
ของงาน

ก่อนก่อสร้าง

ระหว่างก่อสร้าง

หลังก่อสร้าง



ก่อนก่อสร้าง

[illegible]



แผนงานจัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนงาน	แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2561	แผนการจัดซื้อ	ประจำปีงบประมาณ 2561	(✓) ดำเนินการโดยหน่วยงานเจ้าของงาน
		หน่วยงาน	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1	() ดำเนินการโดยกองพัสดุ
กิจกรรม	การจัดการน้ำชลประทาน		สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน	
	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ 4)	รหัสงบประมาณ		รหัสแหล่งเงิน
	อำเภอต๋อยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	รหัสบัญชี		รหัสกิจกรรมหลัก

ลำดับ ที่	ประเภทจัดหา (ซื้อ/จ้าง/เช่า)	รายการ	ปริมาณ		วงเงินที่ จะจัดซื้อจัดจ้าง โดยประมาณ	กำหนด การใช้ พัสดุ	จัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธี	ผู้อนุมัติ สั่งซื้อ สั่งจ้าง	ขั้นตอนการจัดซื้อ (ประมาณ)		หมายเหตุ
			จำนวน	หน่วย					ประกาศ/อนุมัติ รายงานขอซื้อขอจ้าง	ทำสัญญาหรือ ข้อตกลง	
แผน 1	ซื้อ	ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดและขนาดต่างๆ พร้อมข้อต่อรวมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ				ธ.ค.60 - มิ.ย.61	e - bidding	ผจจ.1	ก.ย.60	ก.ย.60 - ต.ค.60	
1		ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดและขนาดต่างๆ พร้อมข้อต่อรวมอุปกรณ์	รวม		8,191,956.00						
2		ประตุน้ำชนิดและขนาดต่างๆ พร้อมข้อต่อรวมอุปกรณ์	14.00	ชุด	311,045.00						
3		AIR VALVE ขนาด Ø 2 นิ้ว (ชนิดลูกกลอยคู่)	14.00	ชุด	172,466.00						
					8,675,467.00						
แผน 2	ซื้อ	ทรายถม จำนวน 1 รายการ				ธ.ค.60 - มิ.ย.61	e - bidding	ผจจ.1	ก.ย.60	ก.ย.60 - ต.ค.60	
4		ทรายถม	5,120.00	ลบ.ม.	2,685,696.00						
					2,685,696.00						
แผน 3	ซื้อ	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ				ก.พ.61 - ก.ค.61	เฉพาะเจาะจง	ผจจ.1	ม.ค.61	ม.ค.61	
5		ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	392.00	ถุง	50,486.00						
6		หินย่อยเบอร์ 3/4"	44.00	ลบ.ม.	17,153.00						
7		ทรายหยาบ	40.00	ลบ.ม.	24,009.00						
8		ทรายละเอียด	12.00	ลบ.ม.	8,831.00						
					100,479.00						
แผน 4	ซื้อ	ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ				ก.พ.61 - ก.ค.61	เฉพาะเจาะจง	ผจจ.1	ม.ค.61	ม.ค.61	
9		ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปไม้ไผ่ ขนาด 1" x 2" ยาว 4.00 ม.	710.00	ท่อน	108,325.00						
10		ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4.00 ม.	239.00	ท่อน	63,165.00						
11		ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปไม้ไผ่ ขนาด 1"x 6" ยาว 4.00 ม.	308.00	ท่อน	47,022.00						
					218,512.00						

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1

กรมชลประทาน



แผนงานจัดซื้อ-จัดจ้าง (ต่อ)

แผนงาน	แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2561	แผนการจัดจ้าง	ประจำปีงบประมาณ 2561	(✓) ดำเนินการโดยหน่วยงานเจ้าของงาน
		หน่วยงาน	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1	() ดำเนินการโดยกองพัสดุ
กิจกรรม	การจัดการน้ำชลประทาน		สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน	
	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ 4)	รหัสงบประมาณ		รหัสแหล่งเงิน
	อำเภอค้อยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	รหัสบัญชี		รหัสกิจกรรมหลัก

ลำดับ ที่	ประเภทจัดหา อ/จ้าง/เช่า	รายการ	ปริมาณ		วงเงินที่ จะจัดซื้อจัดจ้าง โดยประมาณ	กำหนด ต้องการใช้ พัสดุ	จัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธี	ผู้อนุมัติ สั่งซื้อ สั่งจ้าง	ขั้นตอนการจัดซื้อ (ประมาณ)		หมายเหตุ
			จำนวน	หน่วย					ประกาศ/อนุมัติ รายงานขอซื้อขอจ้าง	ทำสัญญาหรือ ข้อตกลง	
	จ้าง	แผนการจัดจ้าง ค่าจ้างชั่วคราว	รวม		2,990,000.00	ต.ค.60 - ก.ย.61	-	ผจจ.1	-	-	
		รวม			2,990,000.00						






แผนการเบิกจ่าย

แผน/ผลการเบิกจ่าย (Cash Flow)

งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

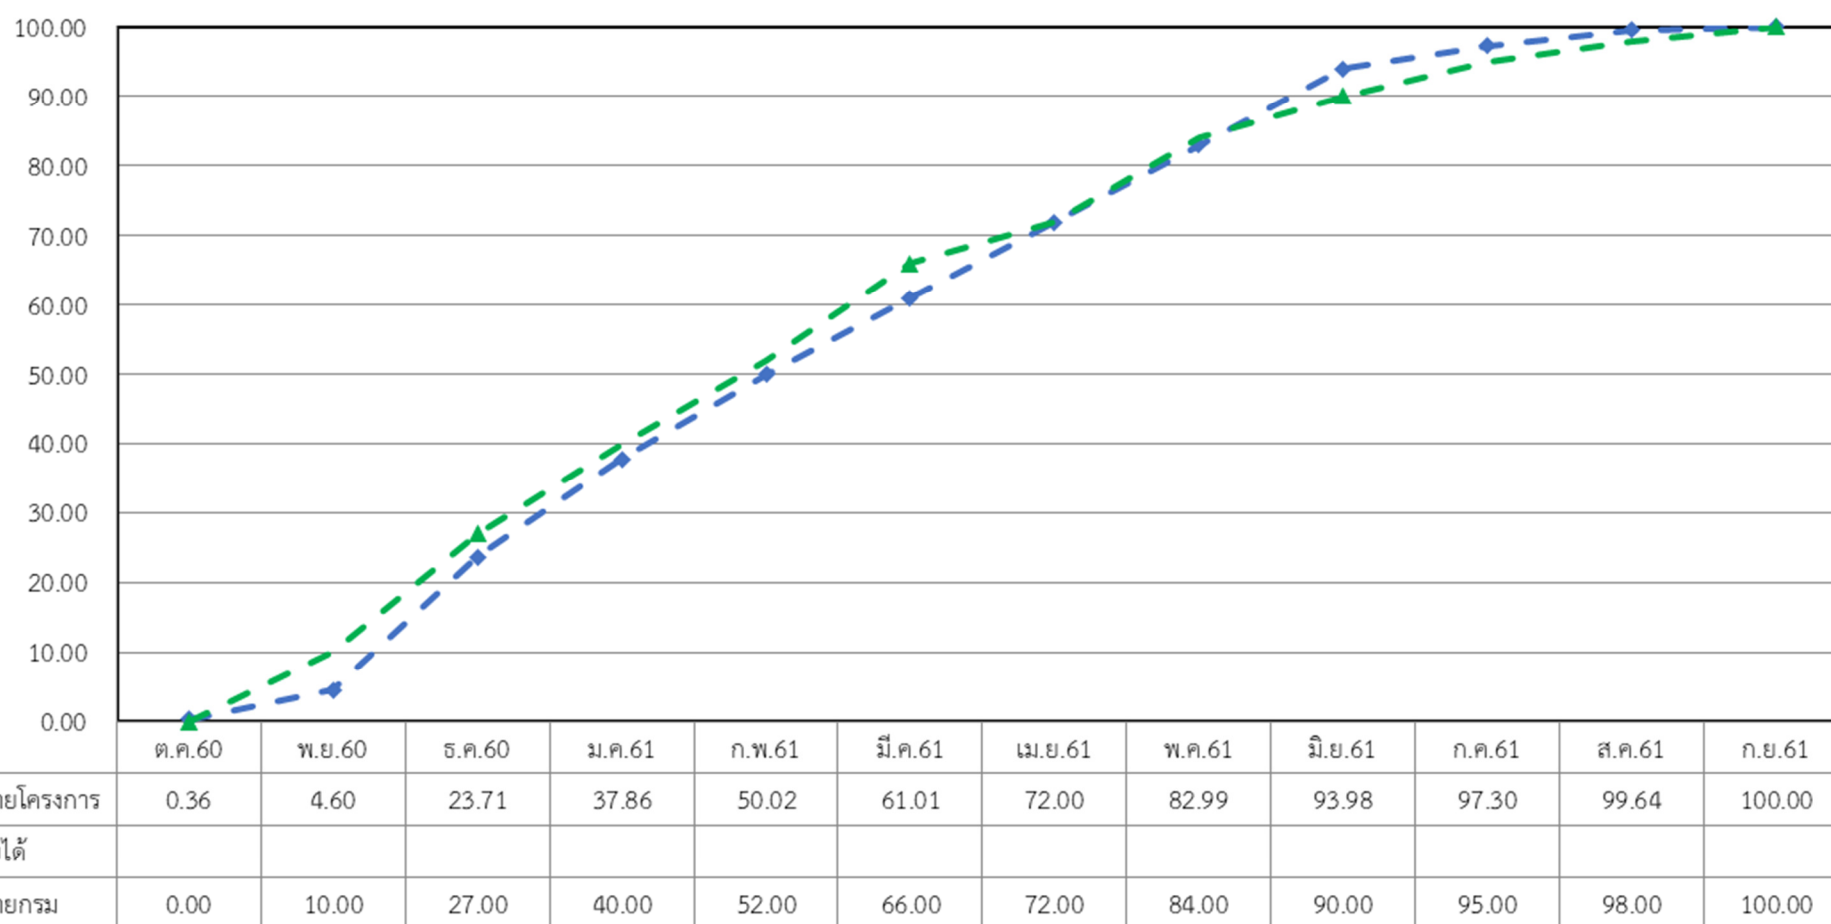



การประชุมชี้แจง/ทำข้อตกลง ก่อนก่อสร้าง





การปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมาย

ตามหนังสือขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อเสนอโครงการวางท่อส่งน้ำตามที่
เกษตรกรร้องขอ

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อ เกษตรกรรวมที่๑

- ดำเนินการสำรวจความเป็นไปได้ และความเหมาะสม
ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ
- ออกแบบเสนอประกาศเขตจัดระบบน้ำ ม.18 วรรค 2 และม.32
- ประชุมเจ้าของที่ดินในเขตพื้นที่โครงการเพื่อสอบถามความ
สมัครใจและให้คำยินยอม ม. 37
- ประกาศเป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกร (หลังจากได้
มีประกาศเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกร ตามม.23 และม.
29)
- ดำเนินการเข้าพื้นที่เพื่อทำการจัดสร้างระบบชลประทาน ม. 24


สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ออกประกาศเป็นเขต
จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกร
(มาตรา 23 และมาตรา 29)

(อยู่ในช่วงระยะเวลา
ดำเนินการ)

การปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมาย

ประกาศเป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม (หลังจากได้มีประกาศเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ตามม.23 และม. 29)

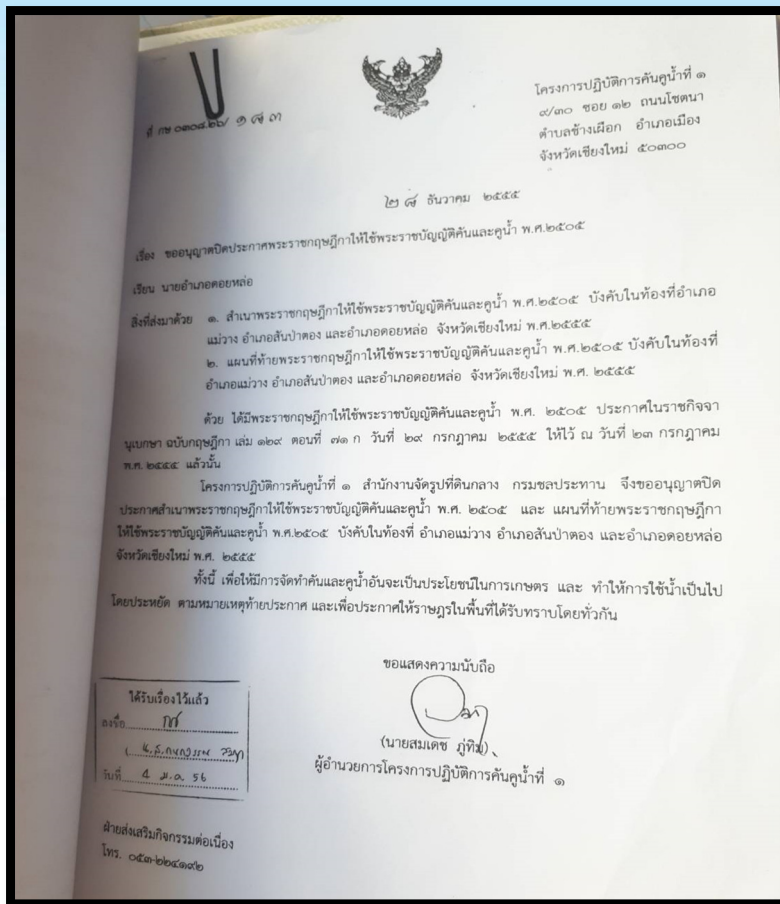



การประเมินค่าที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน เบื้องต้น

ดำเนินการภายใต้ระเบียบ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ชำระค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน้ำเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2559

โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่...1.....

ปีที่ใช้งบประมาณก่อสร้าง...2561....

แบบฟอร์ม 1

งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งขี้ (ระยะที่ 4)

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจัดระบบน้ำ	10,869,484.41
พื้นที่รับประโยชน์งานจัดระบบน้ำ	1,100.00
จำนวนแปลงในเขตพื้นที่รับประโยชน์	139

บาท

ไร่

แปลง

(จำนวนแปลงจะต้องเท่ากับที่ระบุในรายการคำนวณ)

1.แปลงที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าใช้จ่าย แบ่งเป็น

1.1 ที่ดินที่อยู่ต้นน้ำ รหัส(1)	8	แปลง	48.803	ไร่
1.2 ที่ดินติดคลองชลประทาน รหัส(2)	0	แปลง	0	ไร่
1.3 ที่ดินรับน้ำจากแปลงอื่น รหัส(3)	6	แปลง	64.324	ไร่
และไม่ได้ระบบน้ำ				
รวม 1.1+1.2+1.3	14	แปลง	113.127	ไร่

2.แปลงที่ไม่ได้รับการยกเว้นต้องคำนวณชำระค่าใช้จ่าย รหัส(0)

2.1 ที่ดินที่อยู่จัดระบบน้ำ	117	แปลง	933.065	ไร่
และถูกหักที่ดินในการก่อสร้าง				
2.2 ที่ดินที่อยู่จัดระบบน้ำ				
และเป็นปลายน้ำ	8	แปลง	53.809	ไร่
รวม 2.1+2.2	125	แปลง	986.874	ไร่

ข้อมูลที่ได้หลังจากการคำนวณค่าใช้จ่ายจัดระบบน้ำ เฉพาะแปลงตามข้อ 2 รหัส(0)

1.ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเนื่องจาก	100	แปลง	707.752	ไร่
มูลค่าดินหักแล้วสูงกว่า				
คิดเป็นร้อยละของแปลงตามข้อ 2 รหัส(0)	80.00			
2. ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจัด				
2.1มูลค่าที่ดินหักแล้วน้อยกว่า	9	แปลง	58.621	ไร่
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง				
คิดเป็นร้อยละของแปลงตามข้อ 2 รหัส(0)	7.20	ค่าใช้จ่ายรวม	32,872.86	บาท
		อัตราเฉลี่ย	560.77	บาท/ไร่
2.2 ไม่มีส่วนมูลค่าที่ดินถูกหัก	16	แปลง	220.501	ไร่
เพราะไม่ได้เขตพื้นที่ก่อสร้าง				
	12.80	ค่าใช้จ่ายรวม	217,884.74	บาท
		อัตราเฉลี่ย	988.13	บาท/ไร่

สรุปค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายงานจัดระบบน้ำ = 250,757.61 บาท

หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะในช่อง

เท่านั้น




การประเมินค่าที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน เบื้องต้น

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฯ ทั้งหมด	10,869,484.41 บาท
อัตราก่อสร้างฯ ร้อยละ 10 เท่ากับ	988.13 บาท/ไร่
(เงื่อนไขของกรมธนารักษ์ และ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558)	
อัตราก่อสร้างฯ ลดลงเป็น	250,757.61 บาท
เท่ากับ	227.96 บาท/ไร่
แปลงฯ ที่ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฯ จำนวน 14 แปลง	113.127 ไร่
แปลงฯ ที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฯ จำนวน 125 แปลง	986.874 ไร่
<u>สรุป เกษตรกรที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างงานจัดระบบน้ำฯ จะต้องเสีย</u>	
<u>ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างงานจัดระบบน้ำคิดเป็นไร่ละ 227.96 บาท</u>	



การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการน้ำชุมชน



๑๑. นายทิม มานะตา
ที่ปรึกษา



๑๒. ว่าที่ร.ต.สุรพงษ์กาบัง
นายกอบต.ดอยหล่อ

๑. นายถนอม สิริปา (ประธาน)

๒. นายบุญธรรม เรือนรักเรา (รองประธาน)

๓. นายสายัณห์ อินตาเปี้ย (กรรมการ)

๔. นายชาตรี อินชัยวงศ์ (กรรมการ)

๕. นายคำป้อ คำจันใจ (กรรมการ)

๖. นายธนวัฒน์ ผาจันทร์ (กรรมการ)

๗. นางวิภาภักดิ์ ดอนแฝง (กรรมการ)

๘. นางสาวอรอนงค์ คำจันทร์ใจ (กรรมการ)

๙. นายปี้ เตจ๊ะกัน (กรรมการ)

๑๐. นางนภาพร ตีหนู (กรรมการ)

การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการน้ำชุมชน





การยินยอมให้ใช้ที่ดิน

๑

บันทึกข้อความต้องการ การจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

ตามที่กรมชลประทานพิจารณาแล้วเห็นว่า พื้นที่โครงการ งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ(ระยะที่ 4) มีความเหมาะสมจะดำเนินการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการแพร่กระจายน้ำชลประทานนั้น

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ด้านดี อัครนิโธ อยู่บ้านเลขที่ 503 หมู่ 21
ตำบล ต.ข.ม.ล. อำเภอ ต.ข.ม.ล. จังหวัด เชียงใหม่ เป็นผู้ครอบครองที่ดินตามโฉนด หรือ
เอกสารสิทธิอื่นๆ (ระบุ) โฉนด เลขที่ 1403 เลขที่ดิน 126 ตำแหน่งที่ดิน
ตำบล ต.ข.ม.ล. อำเภอ ต.ข.ม.ล. จังหวัด เชียงใหม่ ต้องการ การจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม
เพื่อให้ได้รับประโยชน์โดยทั่วกัน โดยให้ก่อสร้างงานจัดระบบน้ำ ในที่ดินของข้าพเจ้า ตามความเหมาะสม
หรือจำเป็น ตามแบบที่กรมชลประทานกำหนด และ จะถือปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2558 รวมทั้งหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำและการบำรุงรักษาที่กรมชลประทานกำหนด

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ) ด้านดี อัครนิโธ

เลขประจำตัวประชาชน 3 5 0 0 2 0 0 7 7 8 1 4 5

(ลงชื่อ) นาย/นาง/นางสาว พนักงาน/เจ้าหน้าที่ผู้บันทึก

(ลงชื่อ) นาย/นาง/นางสาว พยาน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)

(ลงชื่อ) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

(ลงชื่อ) นาย/นาง/นางสาว (หัวหน้าฝ่าย)

สำหรับเจ้าหน้าที่ :

แปลนงานจัดระบบน้ำหมายเลข.....หมายเลขแปลง.....

คูน้ำสาย.....คลองส่งน้ำ.....

(กรณีมีผู้ครอบครองที่ดินแปลงเดียวกันหลายคน ให้ทำบันทึกฯ ของทุกคน)

แนบสำเนาบัตรประชาชน (เฉพาะด้านหน้า) และ สำเนาเอกสารสิทธิที่ระบุชื่อผู้ครอบครอง

แจ้งข้อกำหนดตาม พรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558

- ยื่นคำร้องขอ แก้ไข/ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบชลประทานเมื่อต้องการ (ม.27)
- ไม่ทำให้ระบบชลประทานเสียหาย (ม.28)
- ไม่กักกัน/ขัดขวางการส่งน้ำ (ม.29)
- ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเมื่อต้องการ (ม.30)

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1

กรมชลประทาน



งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1


ระหว่างก่อสร้าง





ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ลำดับ ที่	รายการ	วัน เริ่ม ต้น	วัน สิ้นสุด	ประเภท งาน	งบประมาณ	วัน อนุมัติ แผน จัดซื้อ จัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานดำเนินการเอง									
							วิธี จัดหา	วัน ประกาศ TOR	วัน ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง	วัน เปิด ซอง	อนุมัติราคา		ลงนามในสัญญา		อายุ สัญญา	เริ่ม สัญญา
1	งาน จัดระบบน้ำ โครงการอ่าง เก็บน้ำโป่ง จ้อ (ระยะที่ 4)	1 ต.ค. 256 0	3 ก.ย. 256 1	ดำเนิน การ เอง	16 ล้าน บาท	6 ต.ค. 2560	Electr onic Biddin g : e- biddin g	20 พ.ย. 2560	24 พ.ย. 2560	16 ธ.ค. . 25 60	22 ธ.ค. 2560	4,621, 165	6 ม.ค.26 51	4,621, 165	6 0 วัน	7 ม.ค. 256 1



สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1

กรมชลประทาน



แผน/ผลการมีส่วนร่วมระหว่างก่อสร้าง

แบบฟอร์มที่ 1 : สำหรับโครงการชลประทาน / โครงการส่งน้ำ / โครงการฯ จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม / สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างเสริมการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์ที่ 1 การจัดการน้ำชลประทาน -งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน

(เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำ / เสริมแนวร่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่พัฒนาระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและจัดรูปที่ดิน / เสริมสร้างบุคลากรและเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)

หน่วยงาน...สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 เชียงใหม่...

จัดทำแผน

สำนักงาน...สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน...

รายงานผล ณ เดือน...30 พฤษภาคม 2561...

ลำดับ ที่	รายการ	สถานภาพ การดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน ผล	จำนวน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ค.บ.	พ.บ.	ธ.บ.	ค.บ.	พ.บ.	ธ.บ.	ค.บ.	พ.บ.	ธ.บ.	ค.บ.	พ.บ.	ธ.บ.
1	งบประมาณทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	บาท	แผน ผล	292,500 56,100												
2	กิจกรรมการดำเนินงาน																
2.1	การประชุมชี้แจง 1.งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำวังผาง(ระยะที่ ๑) 2.งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมอ 3.งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำชลประทาน(ระยะที่ 1) 4.งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำชลประทาน(ระยะที่ 2)ฯ	การปฏิบัติงาน	ครั้ง/คน	แผน	12/760		2/200	2/200			1/50		2/80	2/80		3/180	
				ผล	8/652		3/270	1/83			2/65	2/54					
		การจำแนก เอกสาร/หลักฐาน	ชาย (คน) หญิง (คน)	ผล	315												
				ผล	137												
		การใช้จ่าย	บาท	แผน	80,400												
				ผล	56,100												
2.2	การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคม 1.งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำวังผาง 2.งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำวังเมอ 3.งานจัดระบบน้ำส่งน้ำชลประทาน	การปฏิบัติงาน	วัน/คน	แผน	3/500					1/100	2/200						
				ผล	3/500								3/500				
		การจำแนก เอกสาร/หลักฐาน	ชาย (คน) หญิง (คน)	ผล	186								82,57,87				
				ผล	114								40,43,23				
		การใช้จ่าย	บาท	แผน	156,000												
				ผล	146,760												

แผน/ผลการมีส่วนร่วมระหว่างก่อสร้าง

แบบฟอร์มที่ 1 : สำหรับโครงการชลประทาน / โครงการฝายน้ำ / โครงการฯ จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม / สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด

หน่วยงาน...สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑ เชียงใหม่...

จัดทำแผน

สำนักงาน...สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน...


รายงานผล ณ เดือน...30 พฤษภาคม 2561...

ลำดับ ที่	รายการ	สถานภาพ การดำเนินงาน	หน่วยงาน	แผน ผล	จำนวน	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
						ค.ส.	ค.พ.	ค.ธ.	ค.ม.	ค.พ.	ค.ธ.	ค.ม.	ค.พ.	ค.ธ.	ค.ม.	ค.พ.	ค.ธ.
2.3	การพัฒนาระบบชลประทาน	การปฏิบัติงาน	ศูนย์/ชม.	แผน													
				ผล													
		การจ้างเหมา	ช่าง (คน)	ผล													
				ผล													
		การใช้จ่าย	บาท	แผน													
				ผล													
2.4	- กิจกรรมอื่น ๆ ไปพร้อมๆ กับงานที่มอบหมายการก่อสร้างและแผนงานปี 2562 1.งานจัดระบบน้ำโครงการด้านน้ำสำหรับคน 2.งานจัดระบบน้ำโครงการด้านน้ำสำหรับสัตว์	การปฏิบัติงาน	ศูนย์	แผน	2 / 300											2 / 300	
				ผล													
		การใช้จ่าย	บาท	แผน	56,100												
				ผล													
		การปฏิบัติงาน	ศูนย์	แผน													
				ผล													
		การใช้จ่าย	บาท	แผน													
				ผล													
		การปฏิบัติงาน	ศูนย์	แผน													
				ผล													



การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายก่อนการก่อสร้าง




สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1

กรมชลประทาน



การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการสำรวจก่อนก่อสร้างฯ และการวางแนวเขตก่อสร้าง



สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1

กรมชลประทาน



การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการเปิดหน้าดินวางแผนงานก่อสร้างฯ





การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ 4 การวัดระดับเพื่อวางท่อส่งน้ำ (ระบบท่อส่งน้ำ)





การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ 5 การขุดร่องคูส่งน้ำ (ระบบท่อส่งน้ำ) ด้วยเครื่องจักร





การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ 6 การทดสอบทรายถม และการเทพราयरองพื้นคูส่งน้ำ (ระบบท่อส่งน้ำ)





การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ 7 การเทพราयरองพื้น การวางท่อส่งน้ำ และการต่อท่อ OUTLET UNIT CONTROL





การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ 7 การเทพารายรองพื้น การวางท่อส่งน้ำ และการต่อท่อ OUTLET UNIT CONTROL





การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ 8 การเทพรายถมหลังท่อ กลบดิน บดอัดแน่นแนวท่อส่งน้ำ





การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ 8 การเทพรายมลหลังท่อ กลบดิน บดอัดแน่นแนวท่อส่งน้ำ





การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ 9 การเตรียมเสาหลักลาย และการวางเสาหลักลาย





การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ 9 การเตรียมเสาหลักลาย และการวางเสาหลักลาย





การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ 10 การทดสอบส่งน้ำ





ร้อยละของผลงาน และการเบิกจ่ายเทียบกับแผน

แผน-ผลการปฏิบัติงานจัดระบบน้ำ (งานดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) อำเภอตอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอตอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส่งน้ำ 1,100 ไร่


ดำเนินการแล้วเสร็จ100%


ลำดับ ที่	รายการ	แผน - ผลงาน		ระยะเวลาดำเนินงาน (ปริมาณงานแต่ละงวด %)												(%)
		จำนวนเงิน (บาท)	% แผน-ผล แต่ละงาน	ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	
1	งานดินท่อน้ำ	3,763,000.00	แผน 23.52	-	3.53	3.53	3.53	3.53	2.35	2.35	2.35	2.35	-	-	-	100%
		2,666,081.46	ผล 24.53	-	2.45	2.45	3.68	8.58	7.11	0.25	-	-	-	-	-	
2	งานท่อน้ำ	7,923,000.00	แผน 49.52	-	-	14.86	9.90	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	-	-	-	75%
		4,425,622.10	ผล 40.72	-	-	4.07	3.66	15.47	17.10	0.41	-	-	-	-	-	
3	งานอาคารประกอบ	3,166,000.00	แผน 19.79	-	-	-	-	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	1.98	-	50%
		2,606,860.45	ผล 23.98	-	5.06	1.68	2.11	8.96	2.20	0.37	3.60	-	-	-	-	
4	ค่าอำนวยการและดำเนินงาน	1,148,000.00	แผน 7.18	0.36	0.72	-	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.36	0.36	0.36	25%
		1,170,920.40	ผล 10.77	-	2.19	0.71	0.86	4.31	1.51	0.10	1.16	-	-	-	-	
รวมค่าจ้างตามแผนงาน		16,000,000.00	100.00													0%
แผนงาน	จำนวนเงิน			57,400.00	679,300.00	3,056,200.00	2,263,900.00	1,946,500.00	1,750,300.00	1,750,300.00	1,750,300.00	1,750,100.00	532,300.00	374,000.00	57,400.00	
	สะสม			57,400.00	736,700.00	3,792,900.00	6,056,800.00	8,003,300.00	9,761,600.00	11,519,900.00	13,278,200.00	15,036,300.00	15,568,600.00	15,942,600.00	16,000,000.00	
	ประจำเดือน (%)		100.00	0.36	4.25	19.10	14.15	12.17	10.99	10.99	10.99	10.99	3.33	2.34	0.36	
	แผนงานสะสม (%)			0.36	4.60	23.71	37.86	50.02	61.01	72.00	82.99	93.98	97.30	99.64	100.00	
ผลงาน	จำนวนเงิน			-	1,047,209.93	969,048.43	1,121,295.56	4,057,025.79	3,035,424.24	121,874.90	517,605.56	-	-	-	-	
	สะสม			-	1,047,209.93	2,016,258.36	3,137,553.92	7,194,579.71	10,230,003.95	10,351,878.85	10,869,484.41	-	-	-	-	
	ประจำเดือน (%)		100.00	-	9.63	8.92	10.32	37.32	27.93	1.12	4.76	-	-	-	-	
	ผลงานสะสม (%)			-	9.63	18.55	28.87	66.19	94.12	95.24	100.00	-	-	-	-	




การแก้ไขแบบ

เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศในปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่งานจัดระบบน้ำ จึงได้ดำเนินการแก้ไขแบบ งานจัดระบบน้ำ คูส่งน้ำสาย 03-2 เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว กม.0 + 040 ถึง กม.0 + 610 เนื่องจาก แนวคูส่งน้ำดังกล่าวผ่านที่อยู่อาศัย และติดกับ แนวเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฝ่ายวิศวกรรม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควร ดำเนินการขอแก้ไขแบบดังกล่าว โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้





ดำเนินการประชุม หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไข



เขียนที่ ๒๓๔๕๖๗ ๑๒๓๔ ๐.๐๐๐๐๐๐

วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

เรียน เจ้าหน้าที่ชลประทาน

เรียน เจ้าหนาทสอประธาน

ข้าพเจ้า... นางสาววิมล นามะ บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 7 ตำบล วังใหม่
อำเภอ อุ้มผาง จังหวัด ตาก คุณน้ำสาย 03-2 - - หมายเลขแปลง 63
ขอให้ทางราชการ (ระบุให้ชัดเจน) ตามโฉนดที่ดิน แนวทางต่อลาว 03-2 ทากม 0+000 ถึง
ทม 0+140 โดยถนนแฉะลาว ทากม 0+600-0+1200 ให้ถนนนั้นโดยเป็นสวนสาธารณะ
ถ้าหากว่า 63 ของเขต ทอ 600 และ 61 ของเขต ทอ 600 นั้นเป็นพื้นที่ป่า 64
และแปลง 65 ของเขต ทอ 600 และ 61 ของเขต ทอ 600 นั้นเป็นพื้นที่ป่า 64

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้า ทั้งผู้เกี่ยวข้องได้ส่งรายชื่อไว้เป็นหลักฐานแก่ทางราชการแล้ว

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้า ทูลเกล้าฯ ของตราครุฑราชทานเป็นหลักฐานแก่ทางราชการแล้ว

1	วัดป่าอภัย	หมายเลขแปลง	63	บ้านเลขที่	12	หมู่ที่	7	ต. รัตนวาปี	อ. หนองหาน	จ. หนองบัวลำภู
2	วัดป่าอภัย	หมายเลขแปลง	65	บ้านเลขที่	1/4	หมู่ที่	7	ต. รัตนวาปี	อ. หนองหาน	จ. หนองบัวลำภู
3	วัดป่าอภัย	หมายเลขแปลง	63	บ้านเลขที่	300	หมู่ที่	7	ต. รัตนวาปี	อ. หนองหาน	จ. หนองบัวลำภู
*4	วัดป่าอภัย	หมายเลขแปลง	64	บ้านเลขที่	40/1	หมู่ที่	7	ต. รัตนวาปี	อ. หนองหาน	จ. หนองบัวลำภู
5		หมายเลขแปลง		บ้านเลขที่		หมู่ที่	7	ต. รัตนวาปี	อ. หนองหาน	จ. หนองบัวลำภู

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ อริยา อภิลักษณ์ ผู้ร้องขอ

($\frac{1}{2} \times 100 = 50$)

..... พยาน

(มาช่วยกันหาข้อมูล)

รวม ๑๑/๕/๕ พยาน

(.....) Answer

..... อาจารย์ทองนาค ผู้บันทึก (เจ้าหน้าที่ชลประทาน)



การแก้ไขแบบ

ดำเนินการขออนุมัติในหลักการแก้ไขแบบไปยังส่วนวิศวกรรมสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑ โทร.๐ ๕๓๒๒ ๔๑๙๒
ที่ สจจ ๐๖/๕๖๒๕๖๐ วันที่ 14 ส.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติการแก้ไขแผนงานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ ๔) ตำบลดอยหล่อ
อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

เรียน ผส.จต. ผ่าน ผส.อบ., ผอ.รอส. และ อจ.๑๐ส.

ตามที่สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
ก่อสร้างงานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ ๔) ตำบลดอยหล่อ อำเภอสันติสุข จังหวัด
เชียงใหม่ นั้น

งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ ๔) ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
จัดระบบน้ำชุมชนเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ เพื่อตรวจสอบแผนงาน
ก่อสร้าง ระยะเวลายาวจริงของงานคูน้ำในสนาม ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โดยที่ประชุมมีมติให้มี
การแก้ไขแนวก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบัน และปรึกษา
ผู้ออกแบบ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขแบบก่อสร้างพร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการแก้ไขแบบเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑ จึงขอส่งรายละเอียดการแก้ไขแนว
งานและแผนผังก่อสร้างงานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ ๔) ตำบลดอยหล่อ อำเภอ
ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายฤทธิ พรหมวิจิตร)
ผจจ.๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑ โทร.๐ ๕๓๒๒ ๔๑๙๒
ที่ สจจ ๐๖/๕๖๒๕๖๐ วันที่ 14 ส.ค. 2560
เรื่อง ขออนุมัติการแก้ไขแผนงานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ ๔) ตำบลดอยหล่อ
อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

เรียน ผส.จต. ผ่าน ผส.อบ., ผอ.รอส. และ อจ.๑๐ส.


ตามที่สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
ก่อสร้างงานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ ๔) ตำบลดอยหล่อ อำเภอสันติสุข จังหวัด
เชียงใหม่ นั้น

งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ ๔) ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
จัดระบบน้ำชุมชนเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ เพื่อตรวจสอบแผนงาน
ก่อสร้าง ระยะเวลายาวจริงของงานคูน้ำในสนาม ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โดยที่ประชุมมีมติให้มี
การแก้ไขแนวก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบัน และปรึกษา
ผู้ออกแบบ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขแบบก่อสร้างพร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการแก้ไขแบบเรียบร้อยแล้ว


สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑ จึงขอส่งรายละเอียดการแก้ไขแนว
งานและแผนผังก่อสร้างงานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ ๔) ตำบลดอยหล่อ อำเภอ
ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ผอ.รอส.
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายฤทธิ พรหมวิจิตร)
ผจจ.๑๑๓
ผู้อำนวยการส่วน ผส.จต.
๑๔ ส.ค. ๒๕๖๐

เรียน อจ.๑๐ส.
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นายฤทธิ พรหมวิจิตร)
ผจจ.๑๑๓
๑๔ ส.ค. ๒๕๖๐

(นายฤทธิ พรหมวิจิตร)
ผจจ.๑

— ให้นายฤทธิ พรหมวิจิตร
ดำเนินการต่อไป


(นายฤทธิ พรหมวิจิตร)
ผจจ.๑๑๓
๑๔ ส.ค. ๒๕๖๐



การบริหารสัญญา

งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) เป็นงานดำเนินการ
เองทั้งหมด





30/5/2561

การรายงานผลการทำงาน - ระบบติดตามผลการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

30/5/2561

รายงานโดยกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

http://bid.rid.go.th/pbms/agency_progress.php?pmk_id=152707

http://bid.rid.go.th/pbms/agency_progress_period.php?pmk_id=152707

http://bid.rid.go.th/pbms/plus.php?pmk_id=152707

41



กรณีศึกษา



การรายงานผลงานและผลการเบิกจ่ายออนไลน์และรายงานอื่นๆ

30/5/2561

รายละเอียดประมาณการ-ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลของโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์และรายละเอียดในการดำเนินโครงการ

(คำอธิบาย) :

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแพร่กระจายน้ำของระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโม่งจ้อ ให้สามารถแพร่กระจายน้ำได้ทั่วทุกแปลงเพาะปลูกอย่างรวดเร็ว ตามปริมาณและช่วงเวลาที่ต้องการ 2.ช่วยลดการสูญเสียและประหยัดน้ำในการส่งน้ำแปลงเพาะปลูก 3.สามารถวางแผนการส่งน้ำและการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.แก้ไขปัญหาการขัดแย้งเรื่องน้ำของเกษตรกร

2.2 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ปี) :

1

เริ่มต้น (วัน/เดือน/ปี) :

1 ตุลาคม 2560

สิ้นสุด (วัน/เดือน/ปี) :

30 กันยายน 2561

2.3 แผนงาน / ผลงาน (หน่วย : %)

เดือน	ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61
แผน	0.36	4.61	23.71	37.86	50.03	61.02	72.01	83	93.99	97.32	99.66	100
ผล	0	2.21	12.57	20	42.3	65	75.05	100	-	-	-	-

2.4 แผนเงิน / ผลเงิน (จำนวนเงิน : ทรนียม 4 ตำแหน่ง)


เดือน	ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61
แผน (ล้านบาท)	0.0574	0.7367	3.7929	6.0568	8.0033	9.7616	11.5199	13.2782	15.0363	15.5686	15.9426	16.0000
ผล (ล้านบาท)	0.0000	0.3549	2.0118	3.1219	6.7687	9.7258	10.3518	10.7234	-	-	-	-
ผล (%)	-	2.22	12.57	19.51	42.30	60.79	64.70	67.02	-	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค (เหตุผลที่ล่าช้า) :

-

2.5 ภาพถ่ายประกอบโครงการ

แนบรูปรายการที่สำคัญ รูปภาพ หรือเอกสาร PDF ขนาดไม่เกิน 1 MB.



บันทึกผลการดำเนินงาน

ก่อนดำเนินงาน



แบบก่อสร้าง

30/5/2561

รายละเอียดประมาณการ-ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ



[remove]

คำอธิบายภาพ

ก่อนดำเนินการ



[remove]

คำอธิบายภาพ

ก่อนดำเนินการ

ระหว่างดำเนินงาน (สามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อมีความก้าวหน้า)



[remove]

คำอธิบายภาพ

งานวางท่อ



[remove]

คำอธิบายภาพ

งานพรางดิน

หลังดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%)



[remove]

คำอธิบายภาพ

แนวท่อส่งน้ำ



[remove]

คำอธิบายภาพ

งานอาคาร OUT LET UNIT

2.6 สถานที่ดำเนินโครงการ (ตำบล อำเภอ จังหวัด) :

(คำอธิบาย) :

ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

Latitude: 18.52570858577 Longitude: 98.762755393982
reset save





หลังก่อสร้าง





เปรียบเทียบปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จกับปริมาณงานตามประมาณการ

ตารางเปรียบเทียบแผนงานของประมาณการฉบับเดิม กับประมาณการฉบับปรับแก้ไข

รายละเอียดประมาณการฉบับเดิม

รายละเอียดประมาณการฉบับแก้ไข

จำนวน	รายการ	หน่วย	อัตรา	จำนวนเงิน	รวมเงิน
	งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ 4)				
	อำเภอคลองห่อ จังหวัดเชียงใหม่				
	กิจกรรมงานดำเนินการเอง				
	งานวางท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ				
	1.งานดินท่อน้ำ				
6,480.00	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	12.24	79,315.20	
2,470.00	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	ลบ.ม.	377.85	933,289.50	
3,596.00	งานทรายถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	764.94	2,750,724.24	
	รวม (1)				3,763,328.94
	2.งานวางท่อ PVC 8.5 ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาว ยาว 6.00 ม. พร้อมติดตั้ง				
2,320.00	งานวางท่อ PVC 8.5 Ø 6" ชนิดต่อด้วยแหวนยาง	ม.	58.18	134,977.60	
3,280.00	งานวางท่อ PVC 8.5 Ø 8" ชนิดต่อด้วยแหวนยาง	ม.	93.05	305,204.00	
1,590.00	งานวางท่อ PVC 8.5 Ø 10" ชนิดต่อด้วยแหวนยาง	ม.	136.18	216,526.20	
1,040.00	งานวางท่อ PVC 8.5 Ø 16" ชนิดต่อด้วยแหวนยาง	ม.	362.35	376,844.00	
	รวม (2)				1,033,551.80
	3.งานอาคารประกอบ				
1.00	อาคาร CONTROL UNIT	งาน	301,100.00	301,100.00	
1.00	อาคาร AIR RELEASED VALVE	งาน	396,700.00	396,700.00	
1.00	อาคาร OUT LET UNIT	งาน	957,800.00	957,800.00	
1.00	อาคาร OUT LET UNIT UNDER ROAD	งาน	112,600.00	112,600.00	
1.00	อาคาร BLOW OFF	งาน	261,700.00	261,700.00	
1.00	อาคาร DISTRIBUTION UNIT	งาน	381,200.00	381,200.00	
1.00	อาคาร THRUST BLOCK	งาน	523,400.00	523,400.00	
1.00	เสา ค.ส.ล. 0.15 x 0.15 x 1.30 ม.	งาน	224,000.00	224,000.00	
1.00	ป้ายกิจกรรมในเขตคันคูน้ำ	งาน	7,800.00	7,800.00	
	รวม (3)				3,166,300.00
	รวม (4) = (1)+(2)				4,796,880.74
	รวมค่างานคิดค่าอำนาจการ (5) =(1)+(2)+(3)				7,963,180.74
	4.ค่าอำนาจการและดำเนินงาน				
4,796,880.74	ประเภทงานชลประทาน		16.6240	797,433.45	
3,166,300.00	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		11.0978	351,389.64	
	รวม (6)				1,148,823.09

จำนวน	รายการ	หน่วย	อัตรา	จำนวนเงิน	รวมเงิน
	งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ 4)				
	อำเภอคลองห่อ จังหวัดเชียงใหม่				
	กิจกรรมงานดำเนินการเอง				
	งานวางท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ				
	1.งานดินท่อน้ำ				
6,480.00	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	12.24	79,315.20	
2,470.00	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	ลบ.ม.	377.85	933,289.50	
3,596.00	งานทรายถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	459.81	1,653,476.76	
	รวม (1)				2,666,081.46
	2.งานวางท่อ PVC 8.5 ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาว ยาว 6.00 ม. พร้อมติดตั้ง				
2,320.00	งานวางท่อ PVC 8.5 Ø 6" ชนิดต่อด้วยแหวนยาง	ม.	58.18	134,977.60	
3,280.00	งานวางท่อ PVC 8.5 Ø 8" ชนิดต่อด้วยแหวนยาง	ม.	93.05	305,204.00	
1,590.00	งานวางท่อ PVC 8.5 Ø 10" ชนิดต่อด้วยแหวนยาง	ม.	136.18	216,526.20	
1,040.00	งานวางท่อ PVC 8.5 Ø 16" ชนิดต่อด้วยแหวนยาง	ม.	362.35	376,844.00	
	รวม (2)				1,033,551.80
	3.งานอาคารประกอบ				
1.00	อาคาร CONTROL UNIT	งาน	220,850.04	220,850.04	
1.00	อาคาร AIR RELEASED VALVE	งาน	324,204.28	324,204.28	
1.00	อาคาร OUT LET UNIT	งาน	841,859.92	841,859.92	
1.00	อาคาร OUT LET UNIT UNDER ROAD	งาน	99,906.57	99,906.57	
1.00	อาคาร BLOW OFF	งาน	210,273.18	210,273.18	
1.00	อาคาร DISTRIBUTION UNIT	งาน	284,781.68	284,781.68	
1.00	อาคาร THRUST BLOCK	งาน	393,317.37	393,317.37	
1.00	เสา ค.ส.ล. 0.15 x 0.15 x 1.30 ม.	งาน	224,000.00	224,000.00	
1.00	ป้ายกิจกรรมในเขตคันคูน้ำ	งาน	7,667.41	7,667.41	
	รวม (3)				2,606,860.45
	รวม (4) = (1)+(2)				3,699,633.26
	รวมค่างานคิดค่าอำนาจการ (5) =(1)+(2)+(3)				6,306,493.71
	4.ค่าอำนาจการและดำเนินงาน				
3,699,633.26	ประเภทงานชลประทาน		17.6708	653,754.79	
2,606,860.45	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		12.1376	316,410.29	
	รวม				970,165.08
	ขอเป็น / ขอเพียง (6)				1,170,920.40

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1

กรมชลประทาน



เปรียบเทียบปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จกับปริมาณงานตามประมาณการ

รายละเอียดประมาณการฉบับเดิม

จำนวน	รายการ	หน่วย	อัตรา	จำนวนเงิน	รวมเงิน
	5.งานจัดหาท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์				
2,320.00	งานวางท่อ PVC 8.5 Ø 6" ชนิดต่อด้วยแหวนยาง	ม.	387.83	899,765.60	
3,280.00	งานวางท่อ PVC 8.5 Ø 8" ชนิดต่อด้วยแหวนยาง	ม.	620.33	2,034,682.40	
1,590.00	งานวางท่อ PVC 8.5 Ø 10" ชนิดต่อด้วยแหวนยาง	ม.	907.83	1,443,449.70	
1,040.00	งานวางท่อ PVC 8.5 Ø 16" ชนิดต่อด้วยแหวนยาง	ม.	2,415.67	2,512,296.80	
	รวม (7)				6,890,194.50
	รวมงานดำเนินการเอง (8) = (5)+(6)+(7)			16,002,198.33	
	ข้อกำหนดเป็น (งานดำเนินการเอง)				16,000,000.00
	หมายเหตุ การขอจัดสรรเงินดังนี้				
	1. เงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น		16,000,000.00	บาท	
	แยกเป็น งานจ้างเหมา		-	บาท	
	งานดำเนินการเอง		16,000,000.00	บาท	
	2. ขอให้จัดสรรเงินประจำงวด ดังนี้				
	2.1 เงินกันส่วนกลาง สำนัก/กอง	เป็นเงิน	-	บาท	
	2.2 โอนเงินไปตั้งจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่	เป็นเงิน	16,000,000.00	บาท	
	โดยให้ ผอ.คป.เชียงใหม่ หรือ ผวค.คป.ชม. เป็นผู้เบิก				
	แยกเป็น 1. งานจ้างเหมา		-	บาท	
	2. งานดำเนินการเอง		16,000,000.00	บาท (ค่าจ้างชั่วคราว 3,000,000.00 บาท)	

รายละเอียดประมาณการฉบับแก้ไข

จำนวน	รายการ	หน่วย	อัตรา	จำนวนเงิน	รวมเงิน
	5.งานจัดหาท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์				
2,320.00	งานวางท่อ PVC 8.5 Ø 6" ชนิดต่อด้วยแหวนยาง	ม.	198.33	460,125.60	
3,280.00	งานวางท่อ PVC 8.5 Ø 8" ชนิดต่อด้วยแหวนยาง	ม.	315.00	1,033,200.00	
1,590.00	งานวางท่อ PVC 8.5 Ø 10" ชนิดต่อด้วยแหวนยาง	ม.	458.33	728,744.70	
1,040.00	งานวางท่อ PVC 8.5 Ø 16" ชนิดต่อด้วยแหวนยาง	ม.	1,125.00	1,170,000.00	
	รวม (7)				3,392,070.30
	รวมงานดำเนินการเอง (8) = (5)+(6)+(7)			10,869,484.41	
	ข้อกำหนดเป็น (งานดำเนินการเอง)				10,869,484.41
	หมายเหตุ การขอจัดสรรเงินดังนี้				
	1. เงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น		10,869,484.41	บาท	
	แยกเป็น งานจ้างเหมา		-	บาท	
	งานดำเนินการเอง		10,869,484.41	บาท	
	2. ขอให้จัดสรรเงินประจำงวด ดังนี้				
	2.1 เงินกันส่วนกลาง สำนัก/กอง	เป็นเงิน	-	บาท	
	2.2 โอนเงินไปตั้งจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่	เป็นเงิน	10,869,484.41	บาท	
	โดยให้ ผอ.คป.เชียงใหม่ หรือ ผวค.คป.ชม. เป็นผู้เบิก				
	แยกเป็น 1. งานจ้างเหมา		-	บาท	
	2. งานดำเนินการเอง		10,869,484.41	บาท (ค่าจ้างชั่วคราว 2,898,372.05 บาท)	



ผลงานครบถ้วนตามแบบรูป

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน		หมายเหตุ
			ตามประมาณการฯ	ตามก่อสร้างจริง	
	งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ 4)				
	อำเภอคลองหลวง จังหวัดเชียงใหม่				
	<u>กิจกรรมงานดำเนินการเอง</u>				
1	งานดินทอส่งน้ำ				
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	6,480.00	6,480.00	
	- งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	ลบ.ม.	2,470.00	2,470.00	
	- งานทรายถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	3,596.00	3,596.00	
2	งานวางท่อ PVC 8.5 ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาว ยาว 6.00 ม. พร้อมติดตั้ง				
	- งานวางท่อ PVC 8.5 Ø 6"	ม.	2,320.00	2,320.00	
	- งานวางท่อ PVC 8.5 Ø 8"	ม.	3,280.00	3,280.00	
	- งานวางท่อ PVC 8.5 Ø 10"	ม.	1,590.00	1,590.00	
	- งานวางท่อ PVC 8.5 Ø 16"	ม.	1,040.00	1,040.00	
3	งานอาคารประกอบ				
3.1	งานอาคาร CONTROL UNIT		3.00	3.00	
	- GATE VALVE และข้อต่อขนาด Ø 10"	แห่ง	1.00	1.00	
	- GATE VALVE และข้อต่อขนาด Ø 16"	แห่ง	2.00	2.00	
3.2	งานอาคาร AIR RELEASED VALVE		14.00	14.00	
	- เหล็กรัดท่อ ขนาด Ø 6"	แห่ง	4.00	4.00	
	- เหล็กรัดท่อ ขนาด Ø 8"	แห่ง	5.00	5.00	
	- เหล็กรัดท่อ ขนาด Ø 10"	แห่ง	3.00	3.00	
	- เหล็กรัดท่อ ขนาด Ø 16"	แห่ง	2.00	2.00	
3.3	งานอาคาร OUT LET UNIT		113.00	113.00	
	- เหล็กรัดท่อ ขนาด Ø 6"	แห่ง	33.00	33.00	
	- เหล็กรัดท่อ ขนาด Ø 8"	แห่ง	57.00	57.00	
	- เหล็กรัดท่อ ขนาด Ø 10"	แห่ง	16.00	16.00	
	- เหล็กรัดท่อ ขนาด Ø 16"	แห่ง	7.00	7.00	
3.4	งานอาคาร OUT LET UNIT UNDER ROAD		12.00	12.00	
	- เหล็กรัดท่อ ขนาด Ø 6"	แห่ง	5.00	5.00	
	- เหล็กรัดท่อ ขนาด Ø 10"	แห่ง	6.00	6.00	
	- เหล็กรัดท่อ ขนาด Ø 16"	แห่ง	1.00	1.00	

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน		หมายเหตุ
			ตามประมาณการฯ	ตามก่อสร้างจริง	
	งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ 4)				
	อำเภอคลองหลวง จังหวัดเชียงใหม่				
	<u>กิจกรรมงานดำเนินการเอง</u>				
3.5	งานอาคาร BLOW OFF		6.00	6.00	
	- ข้อต่อสามทาง 90 องศาขนาด Ø 6"x4"	แห่ง	2.00	2.00	
	- ข้อต่อสามทาง 90 องศาขนาด Ø 8"x4"	แห่ง	1.00	1.00	
	- ข้อต่อสามทาง 90 องศาขนาด Ø 10"x4"	แห่ง	1.00	1.00	
	- ข้อต่อสามทาง 90 องศาขนาด Ø 16"x4"	แห่ง	2.00	2.00	
3.6	งานอาคาร DISTRIBUTION UNIT		5.00	5.00	
	- ข้อต่อสามทาง 90 องศาขนาด Ø 10"x6"	แห่ง	1.00	1.00	
	- ข้อต่อสามทาง 90 องศาขนาด Ø 16"x6"	แห่ง	2.00	2.00	
	- ข้อต่อสามทาง 90 องศาขนาด Ø 16"x8"	แห่ง	1.00	1.00	
	- ข้อต่อสามทาง 90 องศาขนาด Ø 16"x16"	แห่ง	1.00	1.00	
3.7	งานอาคาร THRUST BLOCK		34.00	34.00	
	- ช่วงท่อขนาด Ø 6 นิ้ว (ปิดปลายท่อ)	แห่ง	5.00	5.00	
	- ช่วงท่อขนาด Ø 8 นิ้ว (ปิดปลายท่อ)	แห่ง	2.00	2.00	
	- ช่วงท่อขนาด Ø 10 นิ้ว (ปิดปลายท่อ)	แห่ง	1.00	1.00	
	- ช่วงท่อขนาด Ø 6 นิ้ว (ข้องอ 90 องศา)	แห่ง	2.00	2.00	
	- ช่วงท่อขนาด Ø 8 นิ้ว (ข้องอ 45 องศา)	แห่ง	2.00	2.00	
	- ช่วงท่อขนาด Ø 10 นิ้ว (ข้องอ 90 องศา)	แห่ง	6.00	6.00	
	- ช่วงท่อขนาด Ø 16 นิ้ว (ข้องอ 45 องศา)	แห่ง	12.00	12.00	
	- ช่วงท่อขนาด Ø 16 นิ้ว (ข้องอ 90 องศา)	แห่ง	3.00	3.00	
	- ช่วงข้อต่อลดเหล็กหล่อ ขนาด Ø 16 นิ้ว x Ø 10 นิ้ว	แห่ง	1.00	1.00	
3.8	งานเสา ค.ส.ล. 0.15 x 0.15 x 1.30 ม.	ต้น	320.00	320.00	
3.9	งานป้ายกิจกรรมในเขตคันคูน้ำ	แห่ง	1.00	1.00	
4	งานจัดทำท่อ PVC 8.5 ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาว ยาว 6.00 ม. พร้อมติดตั้ง				
	- งานวางท่อ PVC 8.5 Ø 6"	ม.	2,320.00	2,320.00	
	- งานวางท่อ PVC 8.5 Ø 8"	ม.	3,280.00	3,280.00	
	- งานวางท่อ PVC 8.5 Ø 10"	ม.	1,590.00	1,590.00	
	- งานวางท่อ PVC 8.5 Ø 16"	ม.	1,040.00	1,040.00	

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1

กรมชลประทาน



การจัดทำรายงานปิดงาน




รายงานปิดงาน

ปีงบประมาณ 2561

งานจัดรูปที่ดิน/งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อรายการงานโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ 4)
อำเภอคอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ
(นายวิราพงษ์ อภิการต์)

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นางปรศนา หอมระริน)

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นางสาวจิติพร ณ เชียงใหม่)

15. ความเห็นผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม (ผจจ.)



ลงชื่อ..........
(นายฤทธิ พรหมวิจิตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1

กรมชลประทาน



บทที่ ๓ การ บริหาร จัดการน้ำ

การจัดคณะกรรมการฯ

การประเมินประสิทธิภาพการส่งน้ำ

การบริหารจัดการในระดับคูส่งน้ำ/รอบเวอร์

การจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ำ



การจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ

ร่วมกับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๗ โดยแบ่งเป็นออกเป็น กลุ่ม ดังนี้

ที่	กลุ่ม	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	บ้านเลขที่
1	โป่งจ้อย	นายทิม แสนปลูก	ประธานฯ	22 ม.7 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ
2		นายทิม มานะตา	กรรมการ	36/1 ม.7 ต.สันติ สุข อ.ดอยหล่อ
3		นายบุญศรี สุดแสงตา	กรรมการ	27 ม.7 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ
4		นายทองสุข สุดแสงตา	กรรมการ	28 ม.7 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ
5		นายอุทิศ เพิ่มบุญมา	ปฏิคม	61 ม.7 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ
6		นายก่อแก้ว เพิ่มบุญมา	เหรัญญิก	20 ม.7 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ



การจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ

ที่	กลุ่ม	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	บ้านเลขที่
1	ดอยหล่อ	นายกสิษฐา ธรรมสิทธิ์	ปฎิคม	136 ม.21 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ
2		นายพรชัย ตะวันวงศ์	ผช.เหรัญญิก	184/1 0.19 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ
3		ว่าที่ รต.สุรพงษ์ กาบวัง	ผช.เลขานุการ	272 ม.22 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ
4		นายถนอม สิริปา	รองประธานฯ	120 ม.21 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ
5		นายผัด สุกาละ	กรรมการ	339 ม.25 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ
6		นายคำป้อ คำจันใจ	กรรมการ	503 ม.21 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ
7		นายดวงจันทร์ ใจพรหม	กรรมการ	134 ม.21 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ
	มา			



การจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ

ที่	กลุ่ม	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	บ้านเลขที่
1	สันติสุข	นายเฉลิม ปันชัย	ผช.เหรัญญิก	40 ม.2 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ
2		นายมนเทียร ปันเจิง	กรรมการ	52/1 ม.5 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ
3		นายมนตรี ต๊ะคำ	กรรมการ	310/2 ม.6 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ
4		นายปรีชา ตานู	เลขานุการ	310/1 ม.6 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ
5		นายทองวัน วงค์คำมูล	ผช.เหรัญญิก	73 ม.2 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ





การจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ

ที่	กลุ่ม	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	บ้านเลขที่
1	ยางคราม	นายสุระศักดิ์ อินยะ	รองประธานฯ	47/1 ม.8 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ
2		นายอุดม ตานู	ปฎิคม	20/1 ม.8 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ
3		นายทา อินธา	ปฎิคม	64/2 ม.4 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ
4		นายถวิล ปันมาเรือน	ผช.เลขานุการ	120 ม.8 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ
5		นายซอน คำปวน	ผช.เหรัญญิก	26 ม.8 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ





การจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ

ที่	กลุ่ม	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	บ้านเลขที่
1	กรป. กลาง	นายทรรศน แสนดวงดี	กรรมการ	149 ม.22 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ
2		นายจรัญ ทรเทพ	กรรมการ	32 ม.18 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ
3		นายสมชาย ยิ้มถนอม	กรรมการ	32 ม. 5 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ
4		นายอุเทน มณีด	กรรมการ	53/250 ม.22 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ
5		นายจิต บัญลา	ปฎิคม	53/36 ม.18 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ





การจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ

ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน บ้านโป่งจ้อ

ปี พุทธศักราช 2561

โดยมติที่ประชุมเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 (เชียงใหม่) เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 วางระเบียบข้อบังคับของกลุ่มผู้ใช้น้ำ บ้านโป่งจ้อ ไว้ดังนี้

ข้อ 1 ให้ใช้ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านโป่งจ้อ”

ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561


หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

3.1 การใช้น้ำ หมายถึง เกษตรกรที่รับน้ำจากโครงการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 (เชียงใหม่) มาใช้ประโยชน์ของสมาชิกไม่ว่าทางด้านอุปโภค – บริโภค หรือการเกษตรกรรม

3.2 กลุ่มผู้ใช้น้ำ หมายถึง กลุ่มเกษตรกรที่สามารถรับน้ำจากโครงการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 (เชียงใหม่) ที่รวมตัวกันเพื่อประกอบกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน โดยทางราชการเป็นผู้ยอมรับและรับรู้

การประเมินประสิทธิภาพการส่งน้ำ

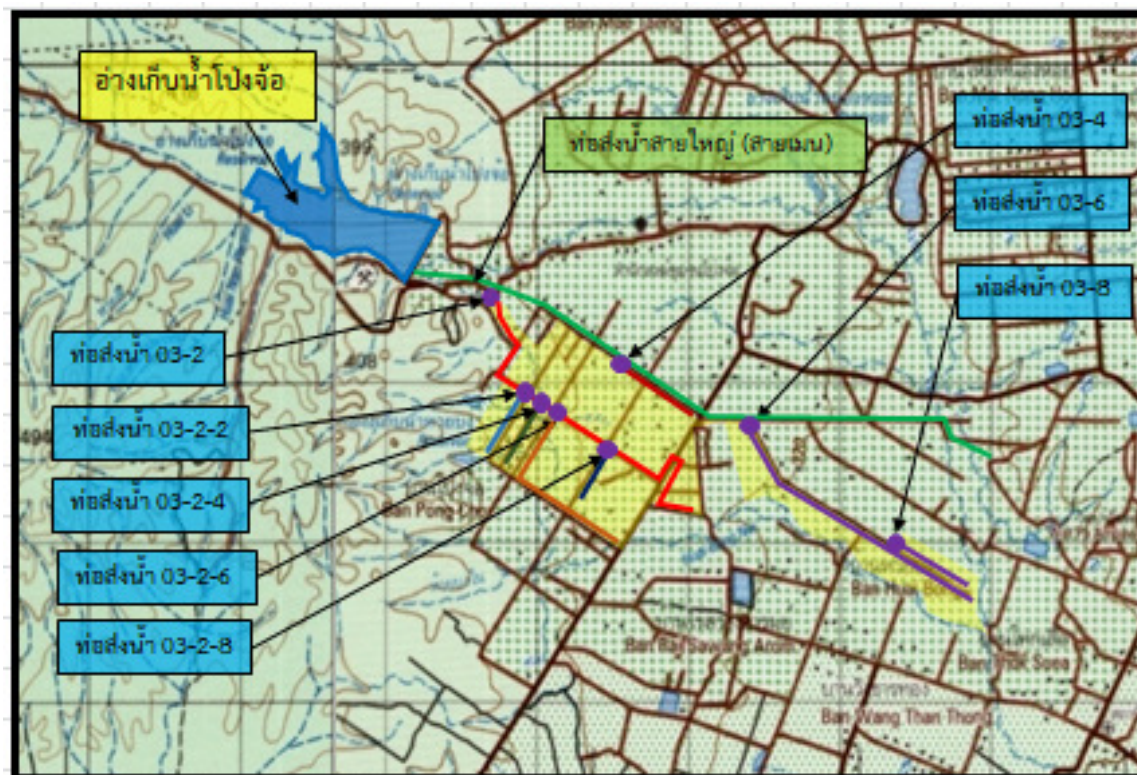

สัญลักษณ์

ท่อส่งน้ำสายใหญ่ (สายเมน) 03	ส่งน้ำในอัตรา	0.503 ลบ.ม./วินาที
ท่อส่งน้ำสายซอย 03-2	ส่งน้ำในอัตรา	0.110 ลบ.ม./วินาที
ท่อส่งน้ำสายซอย 03-2-2	ส่งน้ำในอัตรา	0.012 ลบ.ม./วินาที
ท่อส่งน้ำสายซอย 03-2-4	ส่งน้ำในอัตรา	0.004 ลบ.ม./วินาที
ท่อส่งน้ำสายซอย 03-2-6	ส่งน้ำในอัตรา	0.009 ลบ.ม./วินาที
ท่อส่งน้ำสายซอย 03-2-8	ส่งน้ำในอัตรา	0.015 ลบ.ม./วินาที
ท่อส่งน้ำสายซอย 03-4	ส่งน้ำในอัตรา	0.028 ลบ.ม./วินาที
ท่อส่งน้ำสายซอย 03-6	ส่งน้ำในอัตรา	0.040 ลบ.ม./วินาที
ท่อส่งน้ำสายซอย 03-8	ส่งน้ำในอัตรา	0.040 ลบ.ม./วินาที

สรุปได้ว่า พื้นที่งานมีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะส่งและสามารถแพร่กระจายน้ำได้อย่างทั่วถึง และเพียงพอ



การบริหารจัดการน้ำในระดับคูส่งน้ำ/รอบเวร

- ❖ การเปิดท่อส่งน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูก ให้มีการเปิดคราวละ 5 ชั่วโมง/ท่อOUTLET และปล่อยจำนวน 15 ท่อ/ครั้ง
- ❖ การเปิดท่อส่งน้ำให้ดำเนินการในช่วงฤดูกาลทำการเกษตร
- ❖ การปิดท่อส่งน้ำให้ดำเนินการในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ถึงราวเดือนสิงหาคม โดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ





การบริหารจัดการน้ำในระดับคูส่งน้ำ/รอบเวร

รายชื่อสมาชิกเกษตรกรผู้ใช้น้ำแยกตามท่อส่งน้ำ 03. 04,06,08 และคูแยก 03-2, 03-4, 03-6, 03-8 ตัวอย่าง ดังนี้

บัญชีรายชื่อสมาชิกองค์กรเกษตรกรผู้ใช้น้ำ (กลุ่มคู/กลุ่มแยก)

คูน้ำ / ท่อ.03-6.....

รับน้ำจากคลองส่งน้ำสาย.....

สังกัด งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโขง (ระยะที่ 4)

ฝ่ายส่งน้ำที่ 7 สทป. 1 สัปดาห์เมื่อวันที่21 มกราคม 2561.....

38	นายชัชวาล	03-6	54	5ไร่ 1งาน	ลำไย
39	นางมาลัย มูลฟอง	03-6	55	5ไร่	ลำไย
40	นายทองชัย คำหมื่นยอง	03-6	56	5ไร่	ลำไย
41	นายทองชัย คำหมื่นยอง	03-6	57	5ไร่	ลำไย
42	นายสุชาติ ชมเพชร	03-6	58	5ไร่	ลำไย
43	นายทองเนตร คำหมื่นยอง	03-6	59	5ไร่	ลำไย
44	นายสุชาติ ชมเพชร	03-6	60	5ไร่ 1งาน 24 ต.ร.ว	ลำไย
45	นายชาติ นันดา	03-6	36	5ไร่	ลำไย
46	นายชาติ นันดา	03-6	64	7ไร่ 3 งาน 74 ต.ร.ว	ลำไย
47	นายจรัส ถาวร	03-6	65	5ไร่	ลำไย
48	นางวัฒนา จันทร์เมือง	03-6	66	5ไร่	ลำไย
49	นายดำรงศักดิ์ กันธรรม	03-6	67	5ไร่	ลำไย
50	นายดำรงศักดิ์ กันธรรม	03-6	68	5ไร่	ลำไย
51	นายประทุม	03-6	69	5ไร่	ลำไย
52	นายประทุม อินทียวงค์	03-6	70	5ไร่	ลำไย
53	นายจรัส ตันแก้ว	03-6	71	5ไร่	ลำไย
43	นายดำรงศักดิ์ กันธรรม	03-6	72	5ไร่	ลำไย
44	นายดำรงศักดิ์ กันธรรม	03-6	73	5ไร่	ลำไย
45	นายระชุม ปิ่นโน	03-6	74	5ไร่	ลำไย
46	นางตา แสนก่อ	03-6	75	5ไร่	ลำไย
47	นายบุญช่วย นาคดีจ๊ะ	03-6	76	5ไร่	ลำไย
48	นายบุญช่วย นาคดีจ๊ะ	03-6	77	5ไร่	ลำไย
49	นายทองสุข สุดสายตา	03-6	78	5ไร่	ลำไย
50	นายทองสุข สุดสายตา	03-6	79	5ไร่	ลำไย

บัญชีรายชื่อสมาชิกองค์กรเกษตรกรผู้ใช้น้ำ (กลุ่มคู/กลุ่มแยก)

คูน้ำ / ท่อ.03-2.....

รับน้ำจากคลองส่งน้ำสาย.....

สังกัด งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโขง (ระยะที่ 4)

ฝ่ายส่งน้ำที่ 7 สทป. 1 สัปดาห์เมื่อวันที่21 มกราคม 2561.....

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	รับน้ำหลาย	แปลงเลขที่	จำนวนพื้นที่ (ไร่)	พืชที่ปลูก
62	นางวรรณรัตน์ รัตนภิรมย์	03-2-8	427	14ไร่ 1 งาน 80 ต.ร.ว	ลำไย
63	นางวรรณรัตน์ รัตนภิรมย์	03-2-8	428	2 ไร่ 2 ต.ร.ว	ลำไย
64	นายบุญลือ อินทียวงค์	03-2-8	150	7ไร่ 3 งาน 74 ต.ร.ว	ลำไย
65	นายยอด แก้วเมืองมา	03-2-8	86	6ไร่ 2 งาน 43 ต.ร.ว	ลำไย
66	นายบุญลือ อินทียวงค์	03-2-8	84	5ไร่ 1 งาน 94 ต.ร.ว	ลำไย
67	นางศรี อินทียวงค์	03-2-8	3	5 ไร่	ลำไย
68	นางนงนุชยา เอี่ยมชูนาม	03-2-8	81	9 ไร่	ลำไย
69	นางนงนุชยา เอี่ยมชูนาม	03-2-8	5	5 ไร่	ลำไย
70	นายณัฐวัฒน์ แซ่ตั้ง	03-2-8	11	5 ไร่	ลำไย
71	นายณัฐวัฒน์ แซ่ตั้ง	03-2-8	44	25ไร่ 3 งาน 96 ต.ร.ว	ลำไย
72	นางวรรณภา ศุภศิริ	03-2-8	43	2 ไร่	ลำไย
73	นางวรรณรัตน์ รัตนภิรมย์	03-2-6	387	5 ไร่ 3 งาน 9 ต.ร.ว	ลำไย
74	นางวิภากรค์ ดอนแฝง	03-2-6	112	5ไร่ 1 งาน 24 ต.ร.ว	ลำไย
75	นายอนุภูมิ ชิตพันธ์พงศ์	03-2-6	158	7ไร่ 2 งาน 65 ต.ร.ว	ลำไย
76	นางบัวคลี่ ชัยวงค์	03-2-6	38	2 งาน 20 ต.ร.ว	ลำไย
77	นางบัวคลี่ ชัยวงค์	03-2-6	39	14 ไร่ 3 งาน 92 ต.ร.ว	
78	นายเสกสิทธิ์ สุภาใจ	03-2-4	122	2ไร่ 2 งาน 55 ต.ร.ว	ลำไย
79	นางสม กันทะนะ	03-2-4	124	3ไร่ 1 งาน 37 ต.ร.ว	ลำไย
80	นายสุทัศน์ โปธิ	03-2-4	129	1 ไร่ 97 ต.ร.ว	ลำไย
81	นายคำป้อ คำจันทร์ใจ	03-2-4	126	1 ไร่ 2 งาน 21 ต.ร.ว	ลำไย
82	นายสงวน ตาแพ้ว	03-2	63	2ไร่-24 ต.ร.ว	ลำไย
83	นายบุญ ตาแพ้ว	03-2	64	2ไร่-24 ต.ร.ว	ลำไย
84	นางแม่จ้อย ปัญญาหิ	03-2	65	4ไร่ 2 งาน 5 ต.ร.ว	ลำไย
85	นายอนุภูมิ ชิตพันธ์พงศ์	03-2	80	6ไร่ 3 งาน	ลำไย





การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ



สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1

กรมชลประทาน



บทที่ ๔ การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิต

การจذبกรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ส่วนราชการอื่นเข้ามามีส่วนร่วม

แผนบูรณาการพัฒนากาเกษตร

การใช้ Agri-Map วางแผนการปลูกพืชในพื้นที่

การใช้ประโยชน์ในดินมีความสอดคล้องกับการบริหาร
จัดการพื้นที่ Zoning



บทที่ ๔ การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิต

การประสานแผนงานและบูรณาการการดำเนินงานกับ
หน่วยงานในกระทรวงฯ

การประสานแผนงานและบูรณาการการ
ดำเนินงานกับหน่วยงานนอกกระทรวงฯ

การประสานแผนงานและบูรณาการการ
ดำเนินงานใน ๓ ส่วน (รัฐ เอกชน สังคม)

การถ่ายโอนภารกิจการบริหารจัดการน้ำ

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกรในพื้นที่



บทที่ ๔ การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิต

การสำรวจความพึงพอใจ

บัญชีฟาร์ม

เกษตรผสมผสาน

แสดงกลุ่มอาชีพและปัจจัยการผลิต

การเสนอโครงการให้กับ S/C



การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระดับแปลงเกษตร นโยบายด้าน
การเกษตร การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร วิทยากร : สำนักงานเกษตรอำเภอ





การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระดับแปลงเกษตร การทำระบบเกษตร
ยั่งยืน และการจัดการผลผลิตที่มีคุณภาพ วิทยากร : สำนักงานเกษตรอำเภอคอดอยหล่อ





การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระดับแปลงเกษตร การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในศูนย์เรียนรู้





การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การอบรม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่





ส่วนราชการอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการชลประทานเชียงใหม่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมทรัพยากรน้ำ กรมพลังงาน สำนักงาน กรป.กลาง และผู้นำชุมชน เข้าร่วมพัฒนาการ
บริหารจัดการน้ำชลประทานในพื้นที่งานจัดระบบน้ำ





ส่วนราชการอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา





ส่วนราชการอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 กรมวิชาการเกษตร ร่วมพัฒนาการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่งานจัดระบบน้ำ



สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1

กรมชลประทาน



ส่วนราชการอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ร่วมพัฒนาด้านการอบรมผลิตสินค้าเกษตรกรรม และการจัดทำบัญชีครัวเรือนในพื้นที่งานจัดระบบน้ำ





แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตร



แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตร

งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ ๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดย...สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์




สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1

กรมชลประทาน



แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตร


ความสอดคล้องยุทธศาสตร์การเกษตรในระดับต่างๆ





การใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) มาวางแผนการปลูกพืชในพื้นที่

การเพาะปลูก “ลำไย” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่งานจัดระบบน้ำ

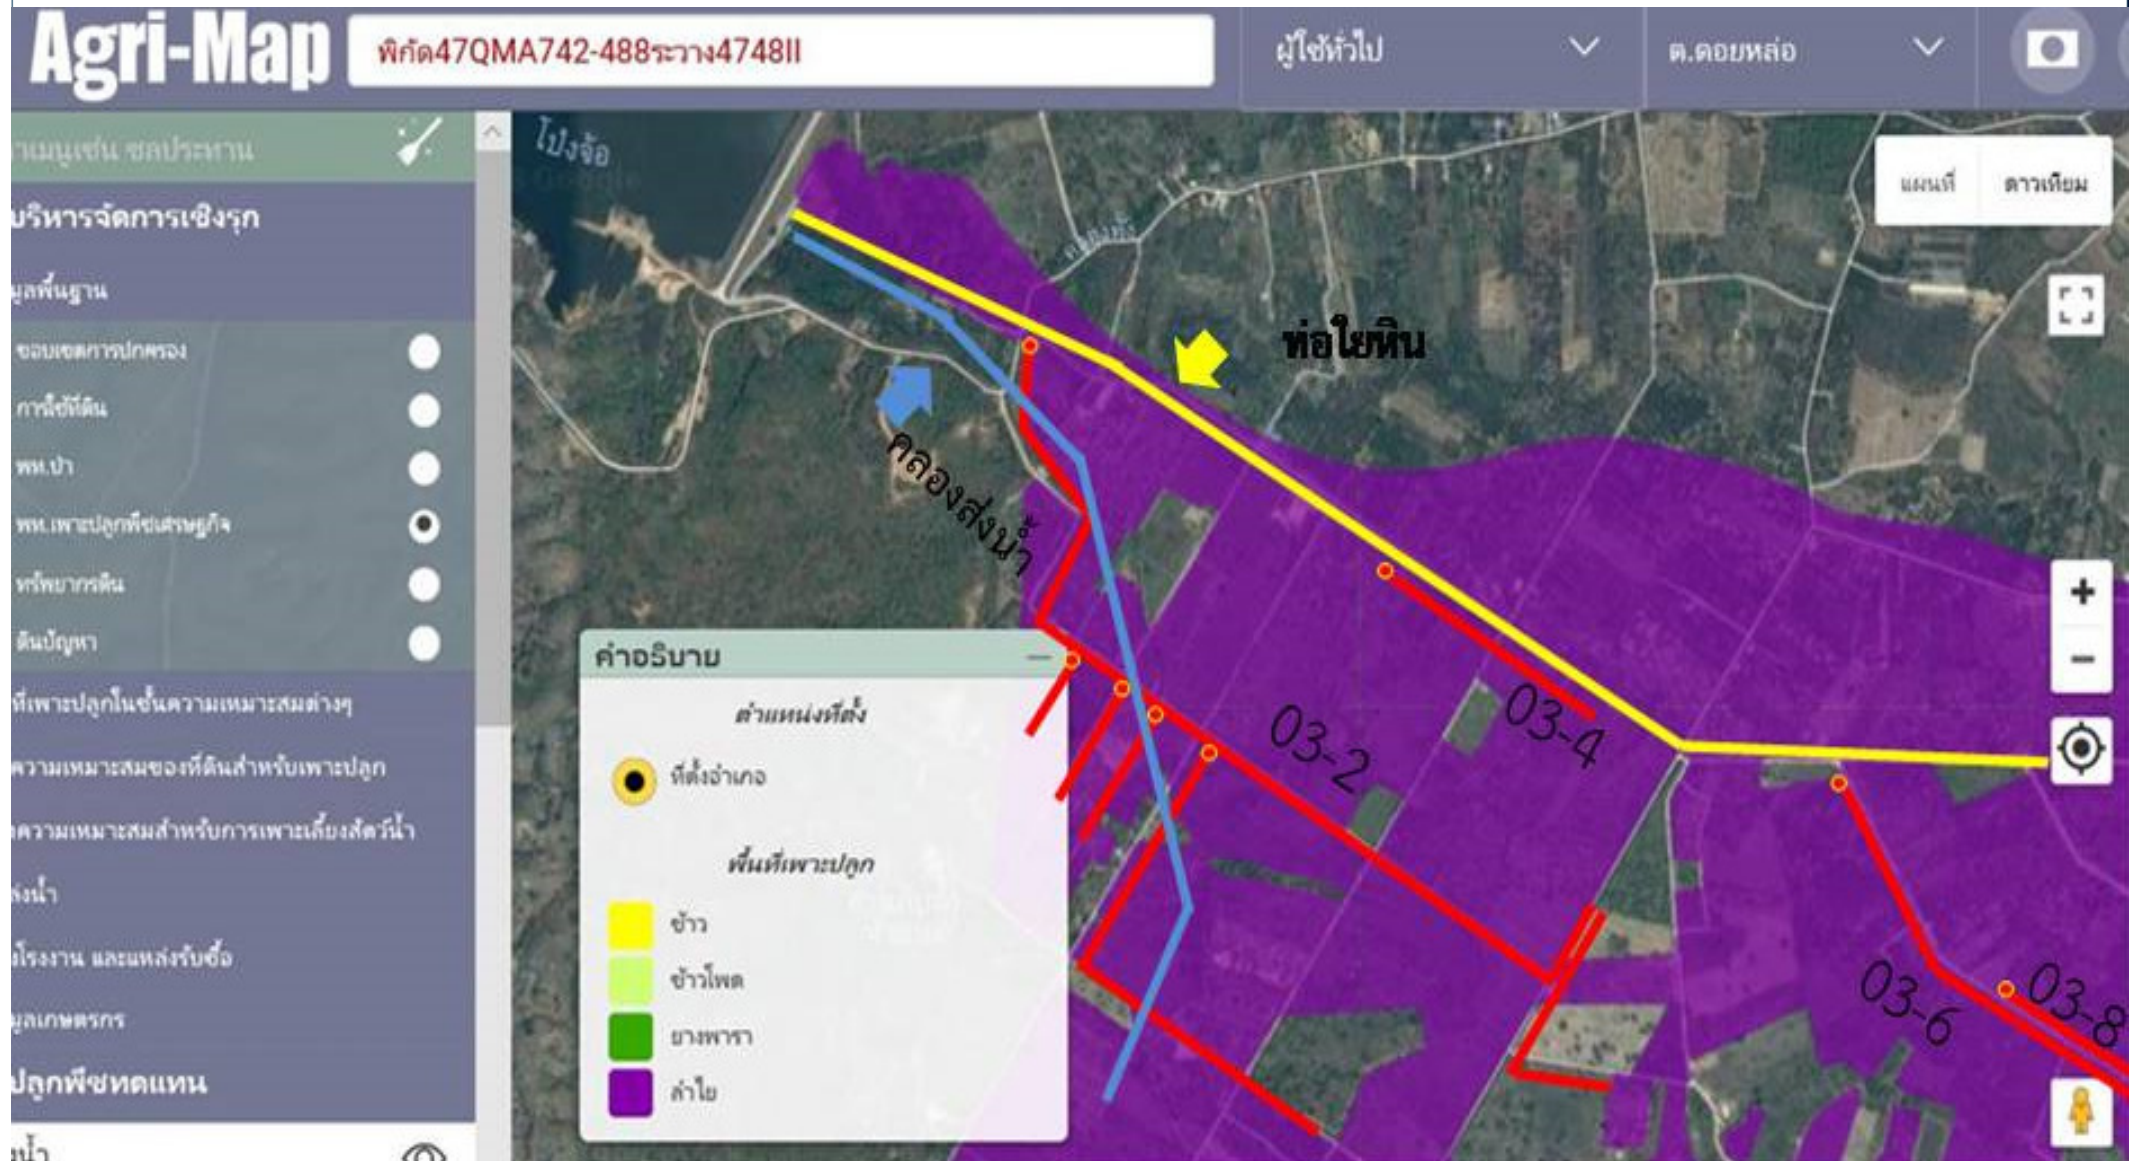


สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1

กรมชลประทาน



การใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) มาวางแผนการปลูกพืชในพื้นที่

การใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) มาวางแผนการปลูก “ลำไย” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่งานจัดระบบน้ำ

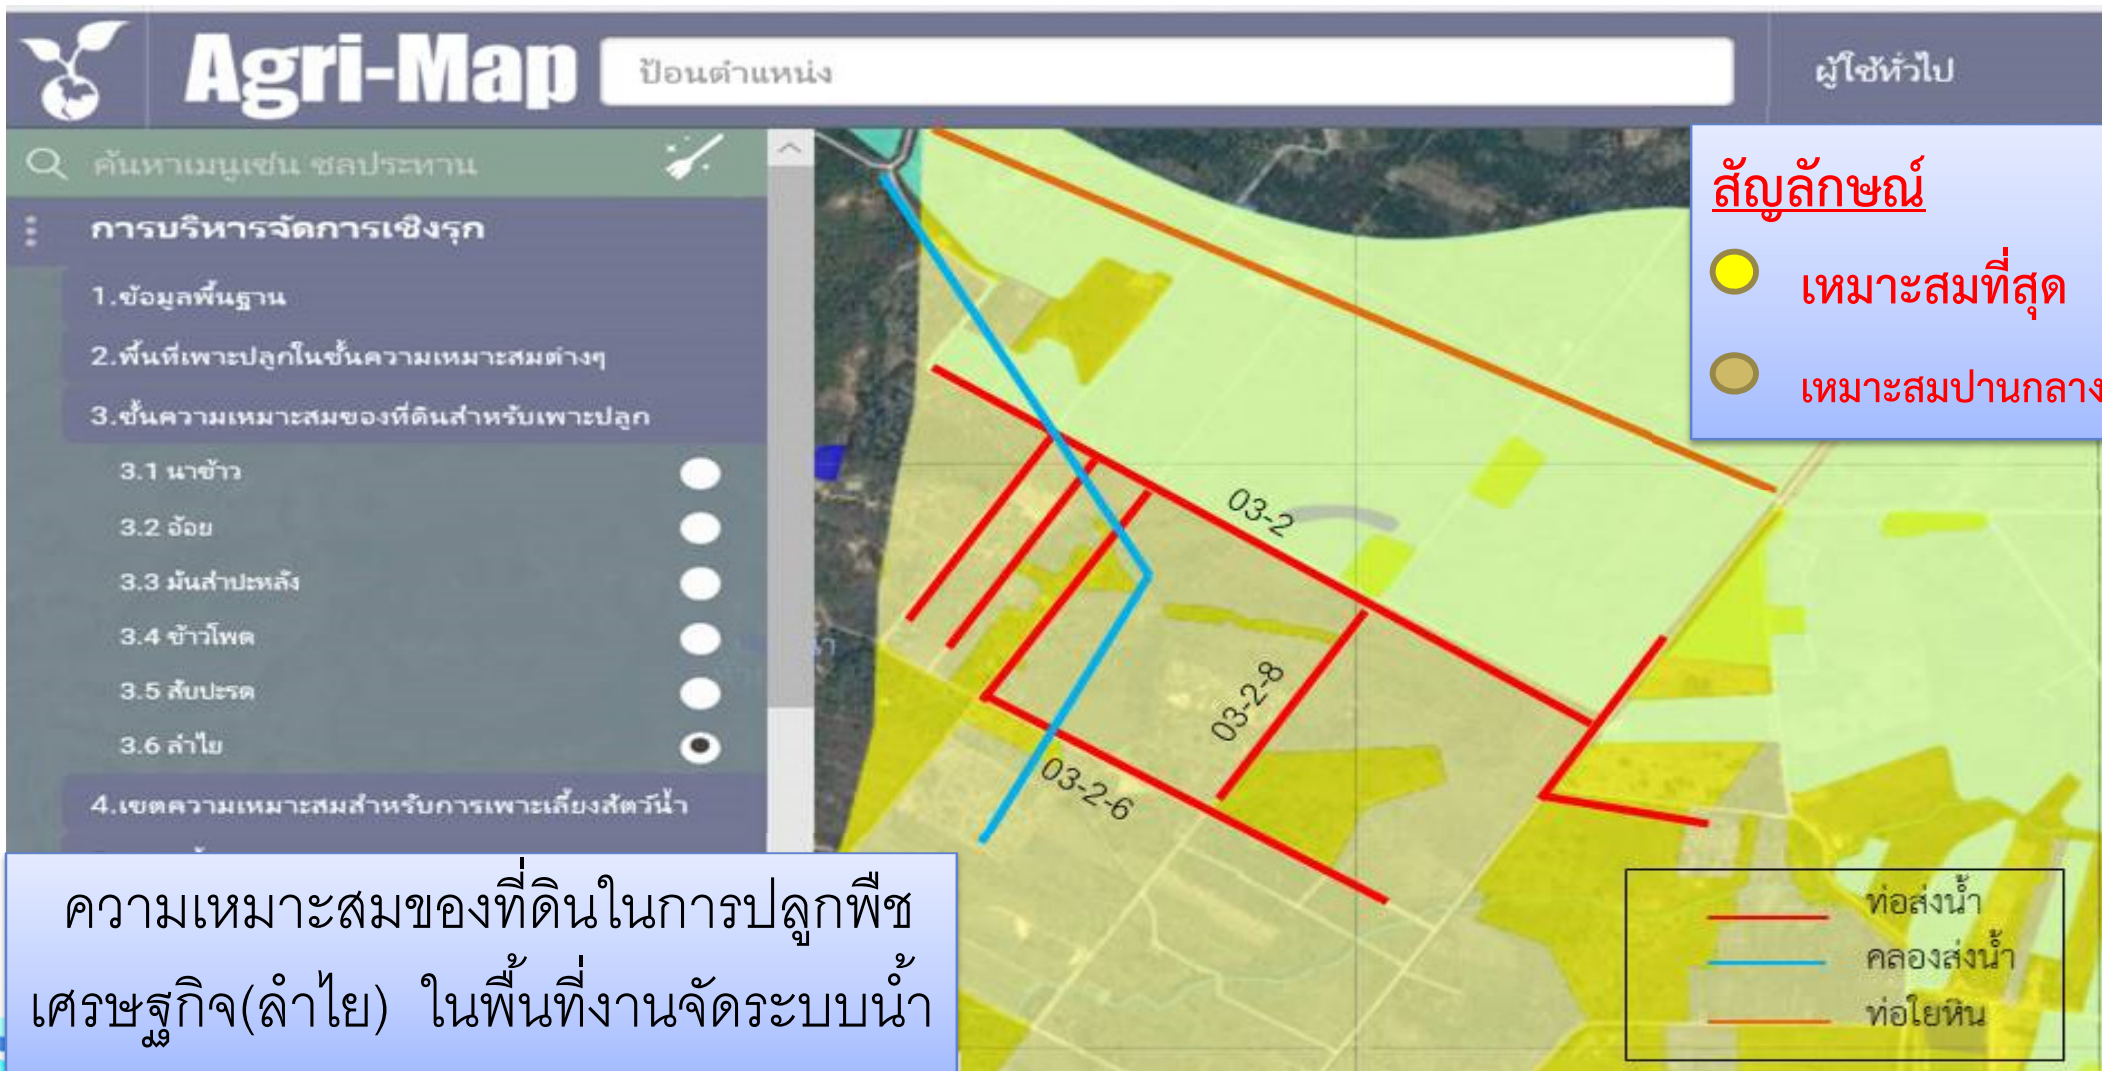

สัญลักษณ์

- เหมาะสมที่สุด
- เหมาะสมปานกลาง

— ท่อส่งน้ำ
— คลองส่งน้ำ
— ท่อโยหิน

ความเหมาะสมของที่ดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจ(ลำไย) ในพื้นที่งานจัดระบบน้ำ



การใช้ประโยชน์ในที่ดินมีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)

ความเหมาะสมการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)

Agri-Map พิกัด 47QMA742-488 ระหว่าง 4748II

ค้นหาเมนูเช่น ชลประทาน

การบริหารจัดการเชิงรุก

- 1. ข้อมูลพื้นฐาน
 - 1.1 ขอบเขตการปกครอง
 - 1.2 การใช้ที่ดิน
 - 1.3 พท.ป่า
 - 1.4 พท.เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
 - 1.5 ทรัพยากรดิน
 - 1.6 ดินปัญหา
- 2. พื้นที่เพาะปลูกในชั้นความเหมาะสมต่างๆ
- 3. ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสำหรับเพาะปลูก
- 4. เขตความเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- 5. แหล่งน้ำ
- 6. ที่ตั้งโรงงาน และแหล่งรับซื้อ
- 7. ข้อมูลเกษตรกรรม

การปลูกพืชทดแทน

แหล่งน้ำ

คำอธิบาย

ตำแหน่งที่ตั้ง

- ที่ตั้งอำเภอ

การใช้ที่ดิน

- พื้นที่นา
- พืชไร่
- ไม้ยืนต้น
- ไม้ผล
- พืชสวน

Powered by NECTEC's What2Grow

ข้อมูลแผนที่ ©2018 Google ภาพ ©2018 CNES / Airbus, DigitalGlobe 200 ม. ข้อกำหนดในการใช้งาน


สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1

กรมชลประทาน



การประสานแผนงานและการบูรณาการ การดำเนินงานกับหน่วยงานภายในกระทรวงฯ

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนากษตรกับหน่วยงานภายในกระทรวงฯ

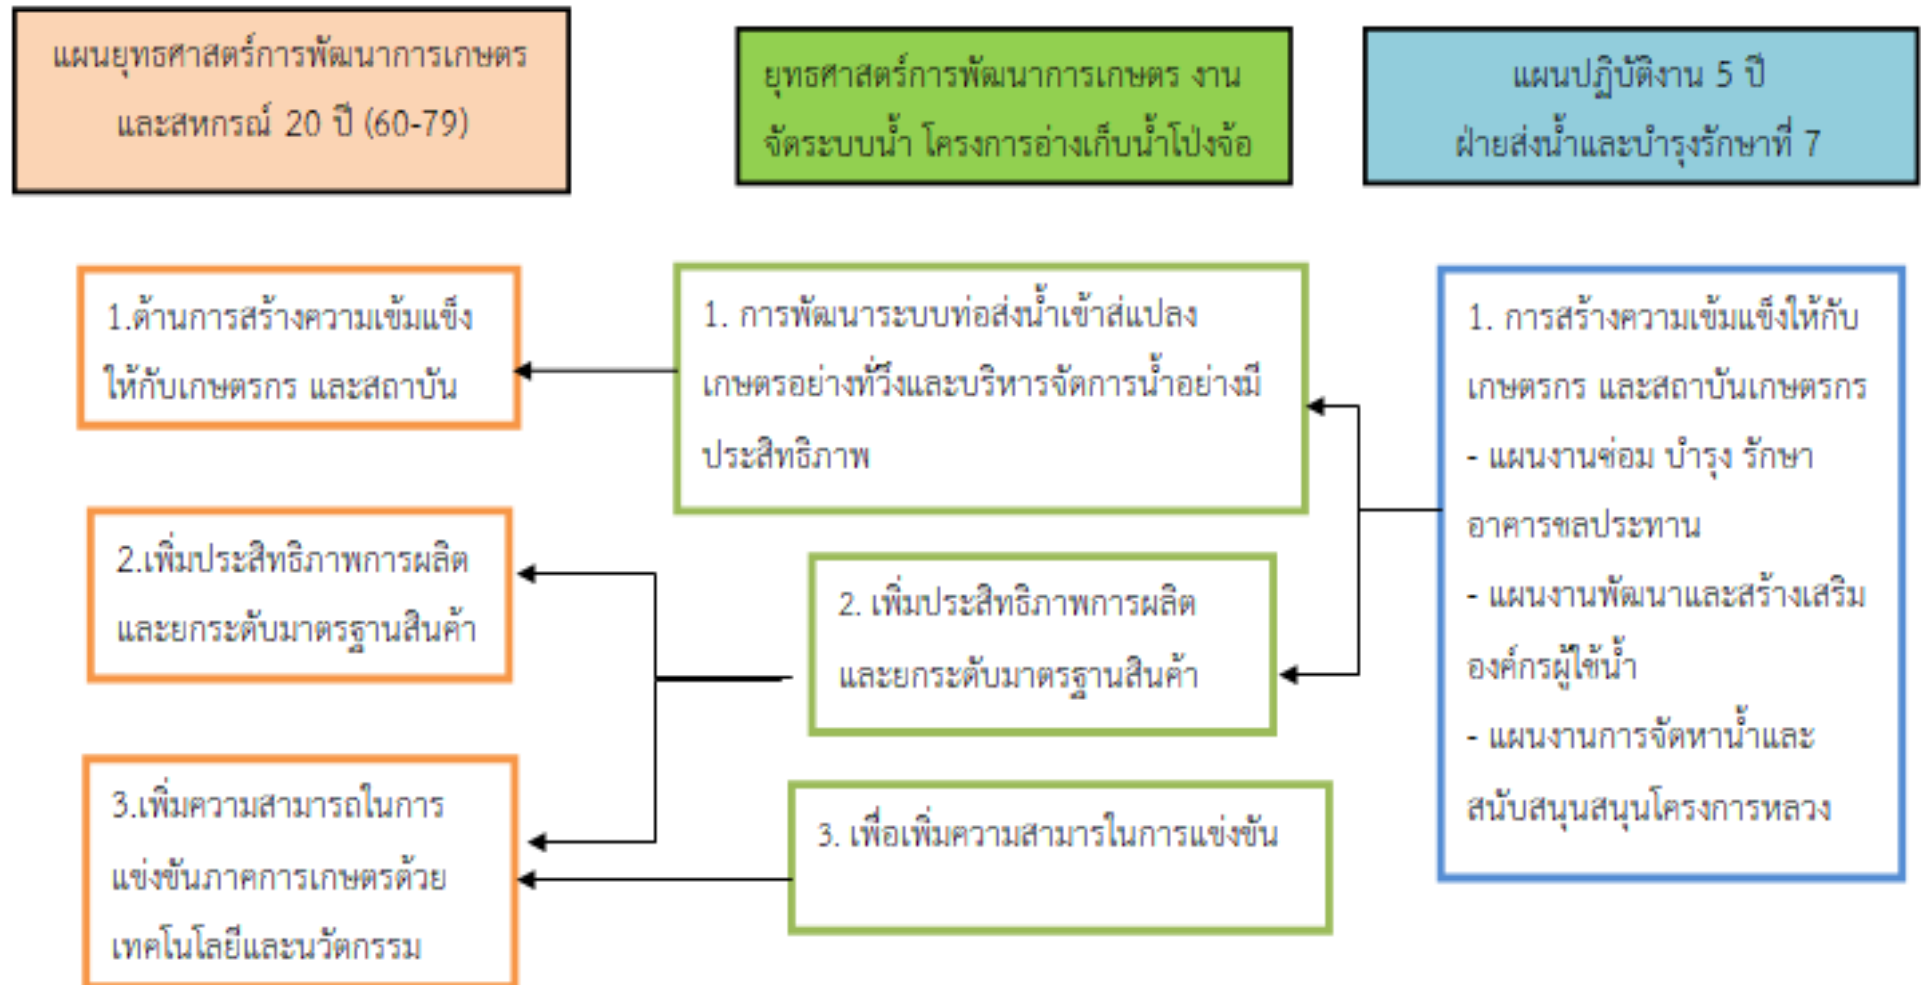



การประสานแผนงานและการบูรณาการ การดำเนินงานกับหน่วยงานภายในกระทรวงฯ




ความสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกับหน่วยงานภายในกระทรวงฯ





การประสานแผนงานและการบูรณาการ การดำเนินงานกับหน่วยงานภายในกระทรวงฯ

ยุทธศาสตร์ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

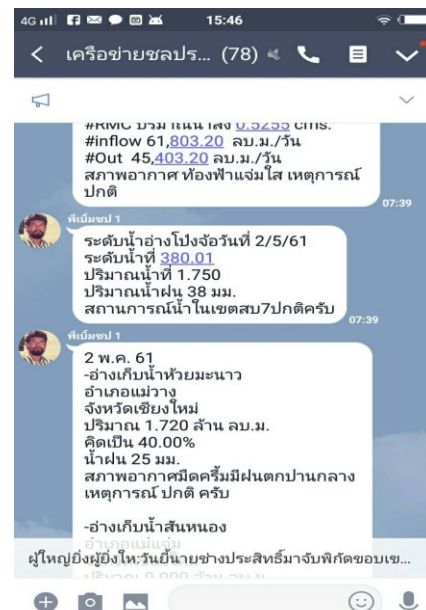


การใช้ Application Line ในการ
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างฯ และสภาพ
อาคารชลประทาน

การใช้ Application Smart Me ในการ
จัดทำบัญชีครัวเรือน



การประสานแผนงานและการบูรณาการ การดำเนินงานกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงฯ


ความสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนากุศลกรกษตรกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงฯ





การประสานแผนงานและการบูรณาการ การดำเนินงานกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงฯ

ยุทธศาสตร์ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและยกระดับมาตรฐานสินค้า

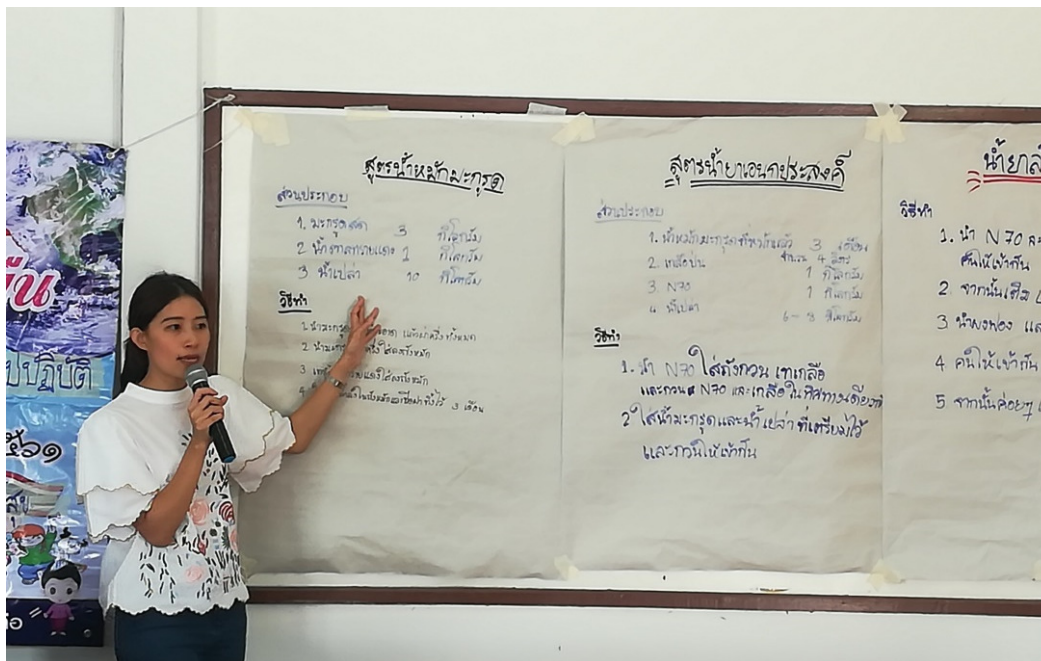

การให้ความรู้ในการแปรรูปสินค้าเกษตร
โดยวิทยากรจากนิคมอุตสาหกรรมลำพูน

การให้ความรู้ด้านการจัดตั้งศูนย์จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากชุมชนตัวอย่าง



การประสานแผนงานและบูรณาการ การดำเนินงานใน 3 ภาคส่วน หรือ ประชารัฐ (รัฐ เอกชน และภาคสังคม)



และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1
กรมชลประทาน



การถ่ายโอนภารกิจการบริหารจัดการน้ำ

ชื่องาน/ โครงการ	สถานที่ตั้ง			จำนวน พื้นที่ (ไร่)	งบประมาณที่ จัดสรร (บาท)	งบประมาณใช้ ไป (บาท)	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	กำหนด ถ่ายโอน ภารกิจ	หน่วยงาน รับมอบ ภารกิจ
	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด							
งาน จัดระบบน้ำ โครงการ อ่างเก็บน้ำ โป่งจ้อ (ระยะที่ 4)	ดอยหล่อ	ดอย หล่อ	เชียงใหม่	1,100	16,000	10,869,484.41	พ.ย.60	พ.ค.61	ก.ค.61	อบต. ดอยหล่อ





กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกรในพื้นที่





การสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	$\bar{X}$	S.D.	แปลผล
ด้าน การให้บริการของสำนักงานจัดรูปที่ดิน และ จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม	3.94	0.10	ปานกลาง
ด้าน ทักษะต่อการก่อสร้างก่อนและหลังดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม	4.22	0.23	มาก
ด้าน ทักษะต่อการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม	4.77	0.20	มาก



การสำรวจความพึงพอใจ






บัญชีฟาร์ม



งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำ (ระยะที่ 4) นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมการทำบัญชีฟาร์ม โดยวิทยากรจากสำนักงานบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่





เกษตรผสมผสาน





แสดงกลุ่มอาชีพ และปัจจัยการผลิต



สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1

กรมชลประทาน



แสดงกลุ่มอาชีพ และปัจจัยการผลิต



ระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1

กรมชลประทาน



แสดงกลุ่มอาชีพ และปัจจัยการผลิต



และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1

กรมชลประทาน



การเสนอโครงการให้กับ SC/อนุกรรมการเกษตร

เกษตรกรจำนวน 2 ราย เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่




นายประพันธ์ บัวใจ เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำคูสาย 03-2

จำนวนพื้นที่ 28 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา ชนิดพืชที่ปลูกประกอบด้วย ลำไย มะม่วง และพืชสมุนไพร สระน้ำจำนวน 2 สระ



การเสนอโครงการให้กับ SC/อนุกรรมการเกษตร

เกษตรกรจำนวน 2 ราย เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่

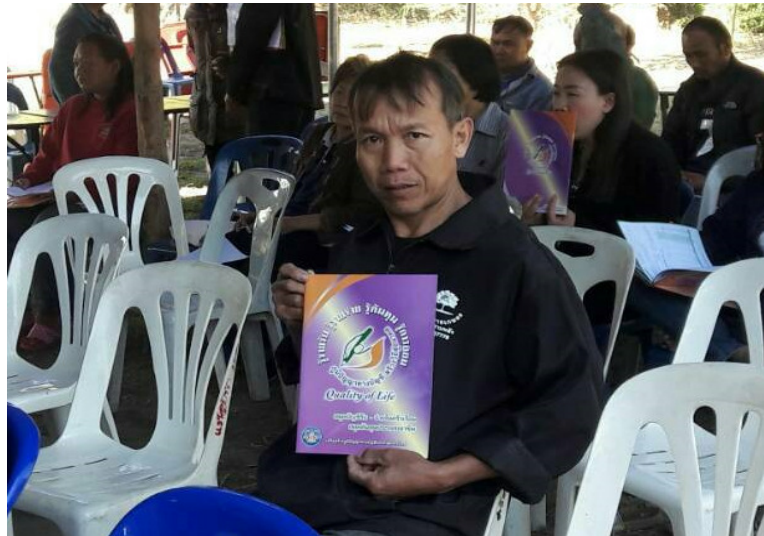

นายสายัณห์ อินตาเปี้ย เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ คู่น้ำสาย 03-6
จำนวนพื้นที่ 5 ไร่ ชนิดพืชที่ปลูกประกอบด้วย ลำไย พืชผักสวนครัว สระน้ำจำนวน 2 สระ






การเสนอโครงการให้กับ SC/อนุกรรมการเกษตร

เกษตรกรในพื้นที่งานที่เข้าเป็นสมาชิกโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ดังนี้

สถานที่	จำนวน (คน)	จำนวน (ไร่)	ชนิดพืช	เอกสารสิทธิ์
ต.ดอยหล่อ	53	444-3-0	ลำไย	ไม่มี 6 ราย
ต.สันติสุข	30	145-8-0	ลำไย	มีเอกสาร สิทธิ์ครบ


ข้อมูล: สำนักงานเกษตร
อำเภอดอยหล่อ 2561

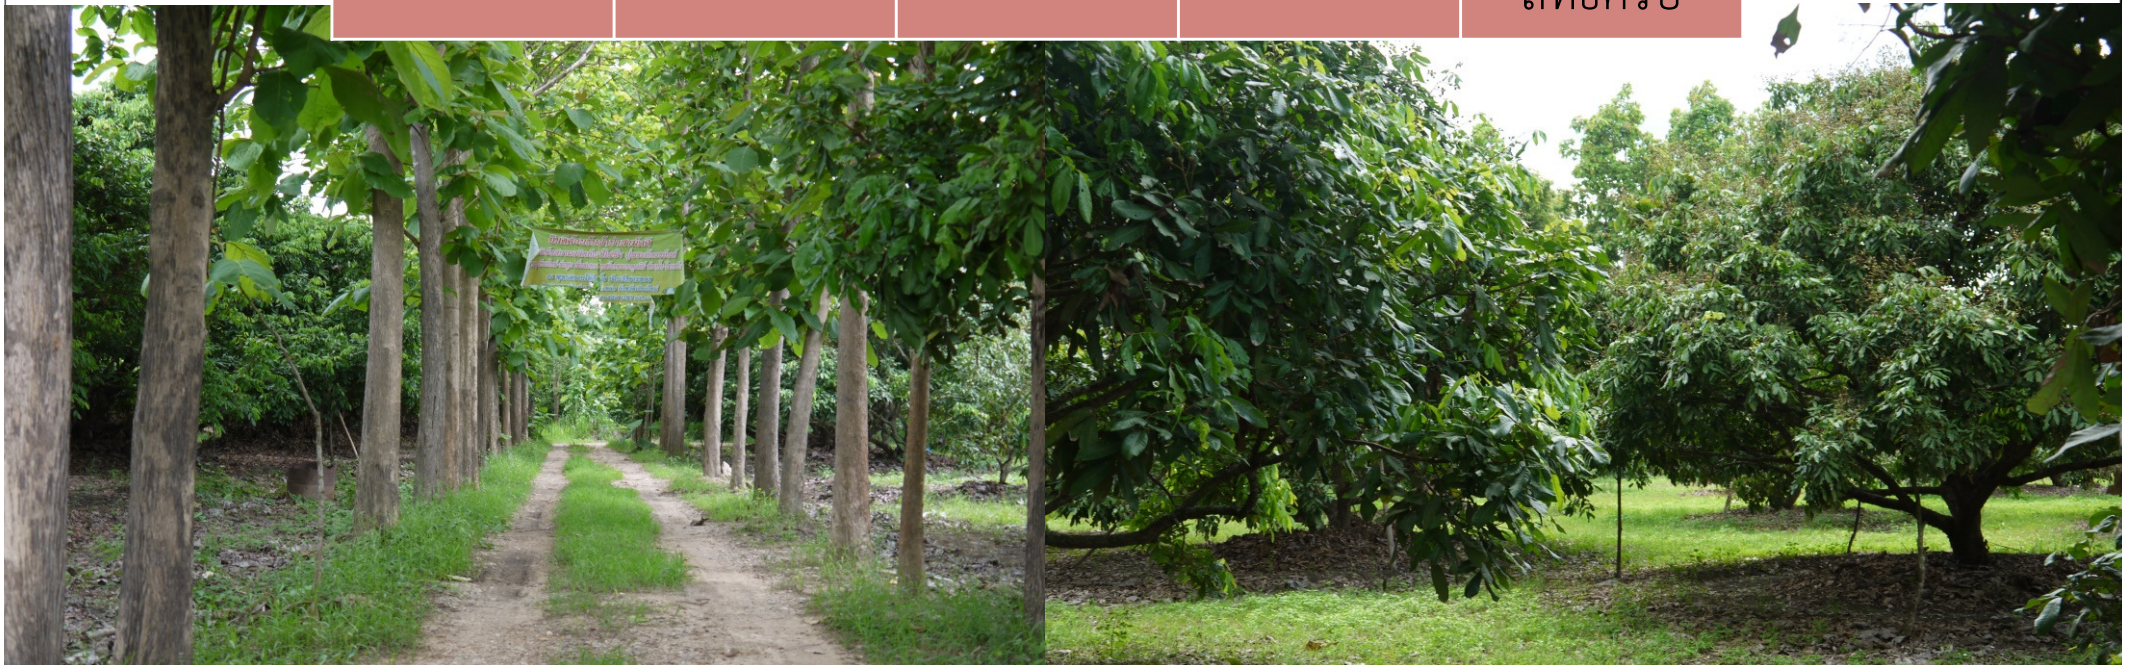


สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรที่ 1

กรมชลประทาน

สรุปผลการดำเนินงาน

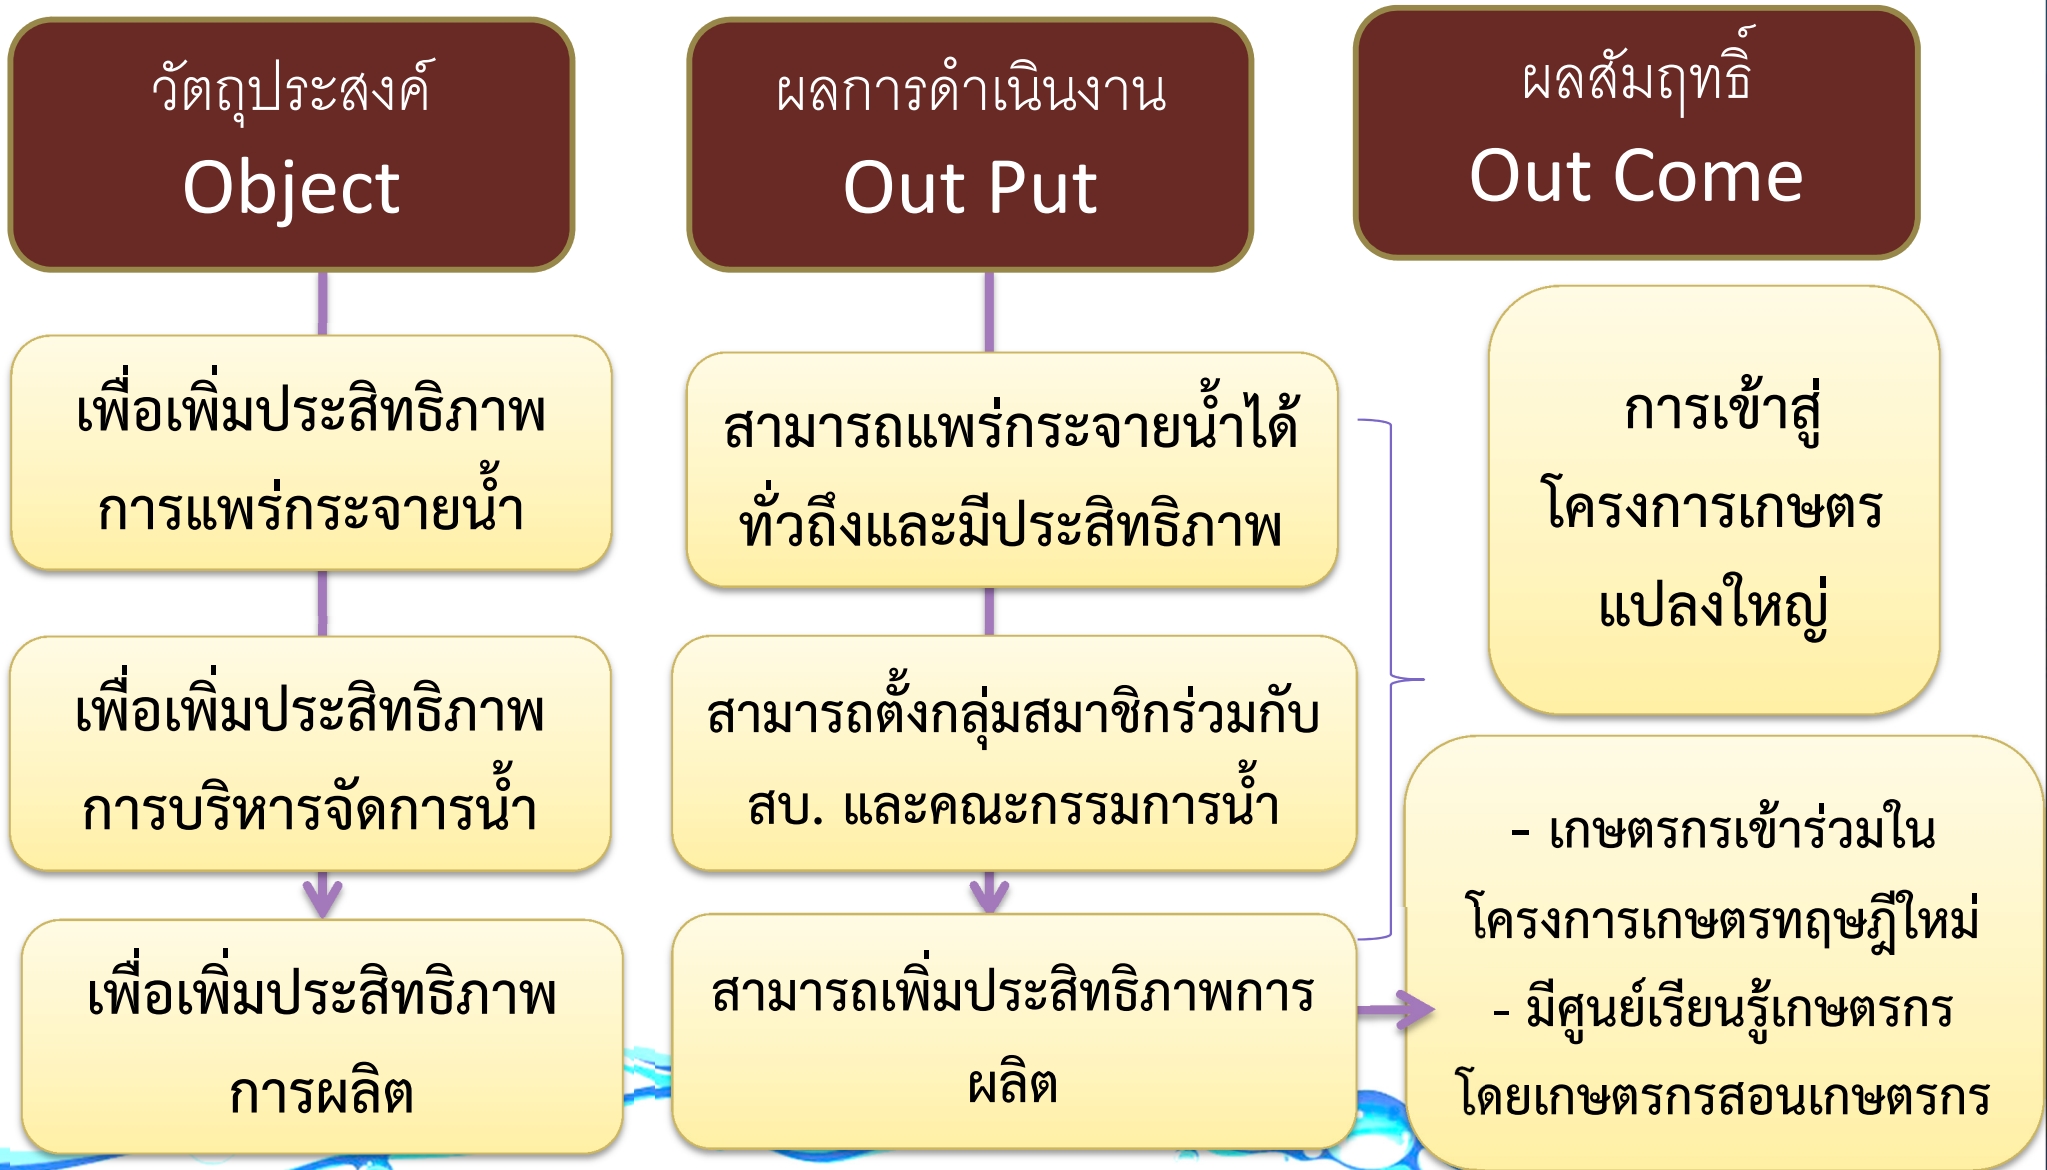

รูปแบบการดำเนินงาน

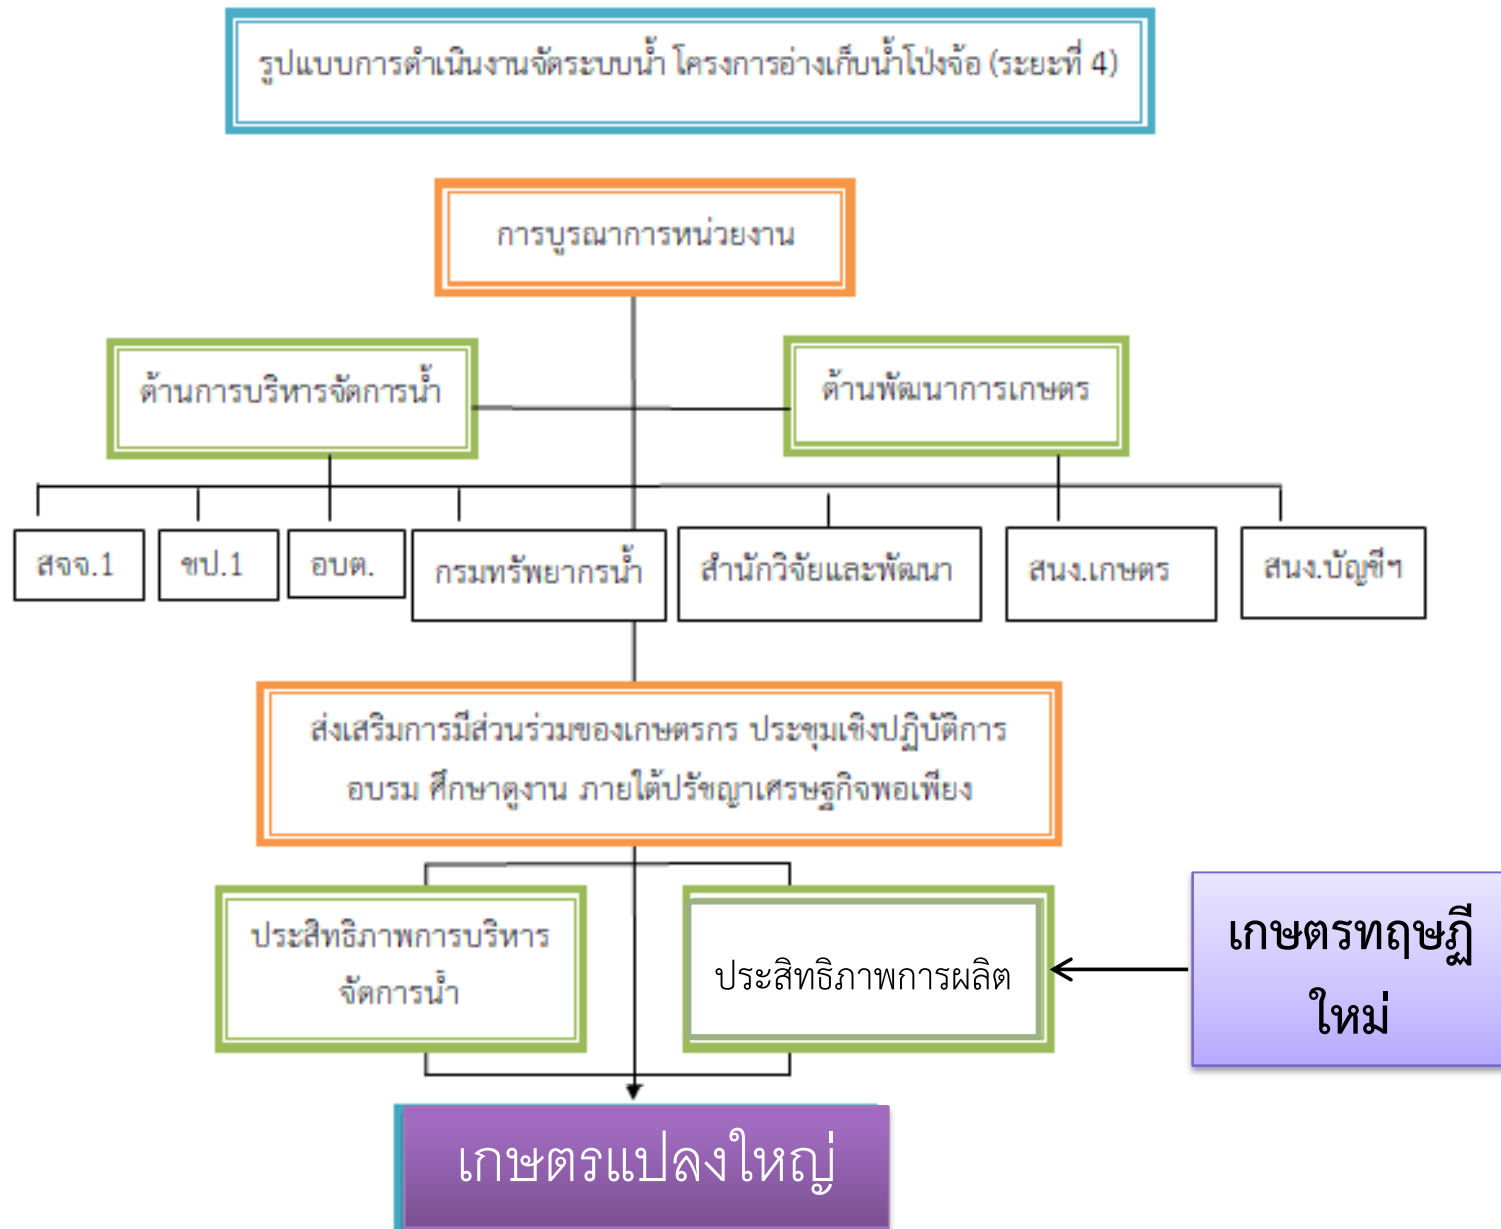



บทที่ ๕
ปัญหา/
อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

1. สภาพพื้นที่ทางกายภาพต่ำลาดเอียงโดยรวม มีสภาพแห้งแล้ง ลักษณะดินส่วนบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนเศษหินหรือปนกรวด ก้อนกรวดขนาดใหญ่เป็นหินกลมมน ประกอบกับพื้นที่ที่มีความเป็นลุ่มๆ ดอนๆ อยู่มาก จึงเป็นอุปสรรคต่อการขุดร่องวางท่อส่งน้ำ
2. สภาพดินที่มีเศษหินหรือกรวดขนาดใหญ่ปนอยู่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปลูกพืชบางชนิด เช่น การข้าว จึงทำให้พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการทำสวนลำไย
3. เนื่องจากพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นสวนลำไย ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำจากการใช้สารเคมี
4. พื้นที่การเกษตรบางส่วนถูกรบกวนด้วยแมลงจำพวก เพลี้ย ส่งผลให้ต้นลำไยทรุดโทรม
5. เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการป้องกันด้านมลภาวะ (Pollution) การปนเปื้อนสารเคมี



บทที่ ๕
ปัญหา/
อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

1. การออกแบบการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ควรให้มีการสำรวจสภาพพื้นที่ให้เป็นปัจจุบันให้มากที่สุด
2. ควรมีงบประมาณสนับสนุนในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่เกษตรแปลงใหญ่ได้ทั่วถึง
3. การดำเนินงานควรมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนอย่างจริงจังตลอดจนถึงภาคธุรกิจเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน

จบการนำเสนอ



สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1
