

โครงการจัดรูปที่ดิน ปี 2561

โครงการจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดุษลุมพุก
ตำบลชุมช้าง อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย
เนื้อที่ 1,750 ไร่

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10

หมวด 1 ข้อมูลโครงการ

► ความเป็นมา

- สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 ได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย เมื่อปี 2551 แจ้งว่าเกษตรกรมีความประสงค์ให้สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 ดำเนินการจัดรูปที่ดินในบริเวณเขตพื้นที่ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเขตตำบลชุมช้าง อำเภอเมืองโพธิ์พิสัย



▶ แหล่งน้ำต้นทุน (ลำนํ้าห้วยหลวง)

- โครงการห้วยหลวงครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี
การใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรเขต ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย มี

โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 5 สถานี ดังนี้

1. โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าลี่
2. โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านชุมช้าง
3. โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนหนามแท่ง
4. โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยมุก
5. โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทัน

▶ แผนที่โครงการ



► การดำเนินงานจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุ่มพุกฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย		
ครั้งที่ 1 / 2551		
วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551		
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย		

กรรมการที่มาประชุม		
1. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย	ประธานคณะกรรมการ
2. นางสาวนุศยา ณ ระนอง	อัยการจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
3. นายประทวน บุญวังแร่	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
4. นายอนุก รัตนรงค์	(แทน) เกษตรจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
5. นายอดิสร ฐรา	สหกรณ์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
6. นายสมควร ช่อมารี	พัฒนาการจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
7. นายประภาส สมานทรัพย์	(แทน) ผู้แทนกรมชลประทาน	กรรมการ
8. นายกิจจา มั่นมงคล	ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน	กรรมการ
9. นายจิรศักดิ์ ชัยประภา	ผู้แทนกรมทางหลวง	กรรมการ
10. นายเลิศชัย สุนันทา	ผู้แทน ธกส.	กรรมการ
11. นายธรรมพล ไชยนาม	(แทน) นายอำเภอท่าบ่อ	กรรมการ
12. นายศราวุธ แข็งแรง	เจ้าของที่ดินท้องที่ตำบลหนองนาง	กรรมการ
13. นายคำ คำสว่าง	เจ้าของที่ดินท้องที่ตำบลหนองนาง	กรรมการ
14. นายธวัช สีดาหลง	เจ้าของที่ดินท้องที่ตำบลหนองนาง	กรรมการ
15. นางมณี วงศ์พาน	หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย	กรรมการและเลขานุการ
กรรมการที่ไม่มาประชุม		
ปลัดจังหวัดหนองคาย	อธิบดีราชการ	
ผู้เข้าร่วมประชุม		
1. นายเชษฐพันธ์ ชูเชื้อ	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	
2. นายประวิทย์ จิตต์ปรีชา	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาท่าบ่อ	
3. นายสมเกียรติ สีนวลมาก	นายช่างรังวัด 6 สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด กรมที่ดิน	
4. นายทองเพชร ปณะราช	ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าบ่อ	
5. นายบุญ รัตนอุบล	นิติกร 6 ว. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	

/6. นางสาว...



มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เลขานุการฯ เสนอ ดังนี้

1. กำหนดให้ดำเนินการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ ตำบลชุมช้าง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย เนื้อที่ประมาณ 6,500 ไร่ โดยให้เลขานุการฯ เสนอโครงการไปยังสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางต่อไป
2. มอบหมายให้สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดให้มีการประชุมเจ้าของที่ดินและผู้มีสิทธิได้รับที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อชี้แจงความมุ่งหมาย วิธีการ สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่เจ้าของที่ดินหรือผู้มีสิทธิได้รับที่ดินจะพึงได้รับและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน
3. มอบหมายให้สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมที่สมควรกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน จัดทำบันทึกยินยอม/ไม่ยินยอมให้ดำเนินการจัดรูปที่ดินของเจ้าของที่ดิน

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ประธานกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา

11.15 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวปริยา นุชคำก้อน)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางมณี วงศ์ยาพาน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย



หมวด 2 ผลสำเร็จของงาน


► ก่อสร้ง

◦ แผนงานก่อสร้าง/แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/แผนเบิกจ่าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน บาท	กำหนดเวลา ต้องการ ใช้งาน	จัดซื้อ โดยวิธี	จำนวนทั้งหมด		จำนวนเงิน บาท	ผู้อนุมัติ	ขั้นตอนการจัดซื้อ			หมายเหตุ	
						จำนวน	หน่วย			รายงาน ขอซื้อ ประมาณ	จัดหา ประมาณ	ข้อผูกพัน ประมาณ		
งานก่อสร้างจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย พื้นที่ประมาณ 1,750 ไร่														
1	งานกรมชลประทาน ดำเนินการเอง													
1.1	ปูนซิเมนต์	5,543	ถุง	684,948.51	ค.บ.60-มี.ค.61	} สอบราคา	5,543	ถุง	684,948.51	สภา อบจ.หนองคาย	ค.บ.60	ค.บ.60	พ.ย.60	
1.2	ทราย	789	ลบ.ม.	220,209.90	ค.บ.60-มี.ค.61		789	ลบ.ม.	220,209.90	สภา อบจ.หนองคาย	ค.บ.60	ค.บ.60	พ.ย.60	
1.3	หินย่อย	688	ลบ.ม.	673,689.60	ค.บ.60-มี.ค.61		688	ลบ.ม.	673,689.60	สภา อบจ.หนองคาย	ค.บ.60	ค.บ.60	พ.ย.60	
1.4	ท่อขนาดต่าง ๆ	950	ท่อน	356,444.00	ค.บ.60-มี.ค.61		950	ท่อน	356,444.00	สภา อบจ.หนองคาย	ค.บ.60	ค.บ.60	พ.ย.60	
1.5	ไม้แปรรูป(เนื้ออ่อน)	28.00	ลบ.ม.	506,799.98	ค.บ.60-มี.ค.61	} e-bidding	28.00	ลบ.ม.	506,799.98	สภา อบจ.หนองคาย	ค.บ.60	ค.บ.60	พ.ย.60	
1.6	ดิน	46,903	ลบ.ม.	1,877,519.08	ค.บ.60-มี.ค.61		46,903	ลบ.ม.	1,877,519.08	สภา อบจ.หนองคาย	ค.บ.60	ค.บ.60	พ.ย.60	
1.7	ดินลูกรัง	3,803	ลบ.ม.	665,560.00	ค.บ.60-มี.ค.61		3,803	ลบ.ม.	665,560.00	สภา อบจ.หนองคาย	ค.บ.60	ค.บ.60	พ.ย.60	
1.8	เหล็กเส้น	1,047	กก.	19,469.10	ค.บ.60-มี.ค.61	ตกลงราคา	1,047	กก.	19,469.10	สภา อบจ.หนองคาย	ค.บ.60	ค.บ.60	พ.ย.60	
1.9	น้ำมันเชื้อเพลิง	L.S.	L.S.	1,455,114.00	พ.ย.60-มี.ค.61	ตามความจำเป็น	L.S.	L.S.	1,455,114.00	สภา อบจ.หนองคาย	พ.ย.60-ธ.ค.61	พ.ย.60-ธ.ค.61	พ.ย.60-ธ.ค.61	
2.0	อะไหล่และหล่อตื้น	L.S.	L.S.	297,968.00	พ.ย.60-มี.ค.61	ตามความจำเป็น	L.S.	L.S.	297,968.00	สภา อบจ.หนองคาย	พ.ย.60-ธ.ค.61	พ.ย.60-ธ.ค.61	พ.ย.60-ธ.ค.61	
2.1	เบ็ดเคส	L.S.	L.S.	629,216.00	พ.ย.60-มี.ค.61	ตามความจำเป็น	L.S.	L.S.	629,216.00	สภา อบจ.หนองคาย	พ.ย.60-ธ.ค.61	พ.ย.60-ธ.ค.61	พ.ย.60-ธ.ค.61	

► ก่อร่างสร้าง

- แผนงานก่อสร้าง/แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/แผนเบิกจ่าย

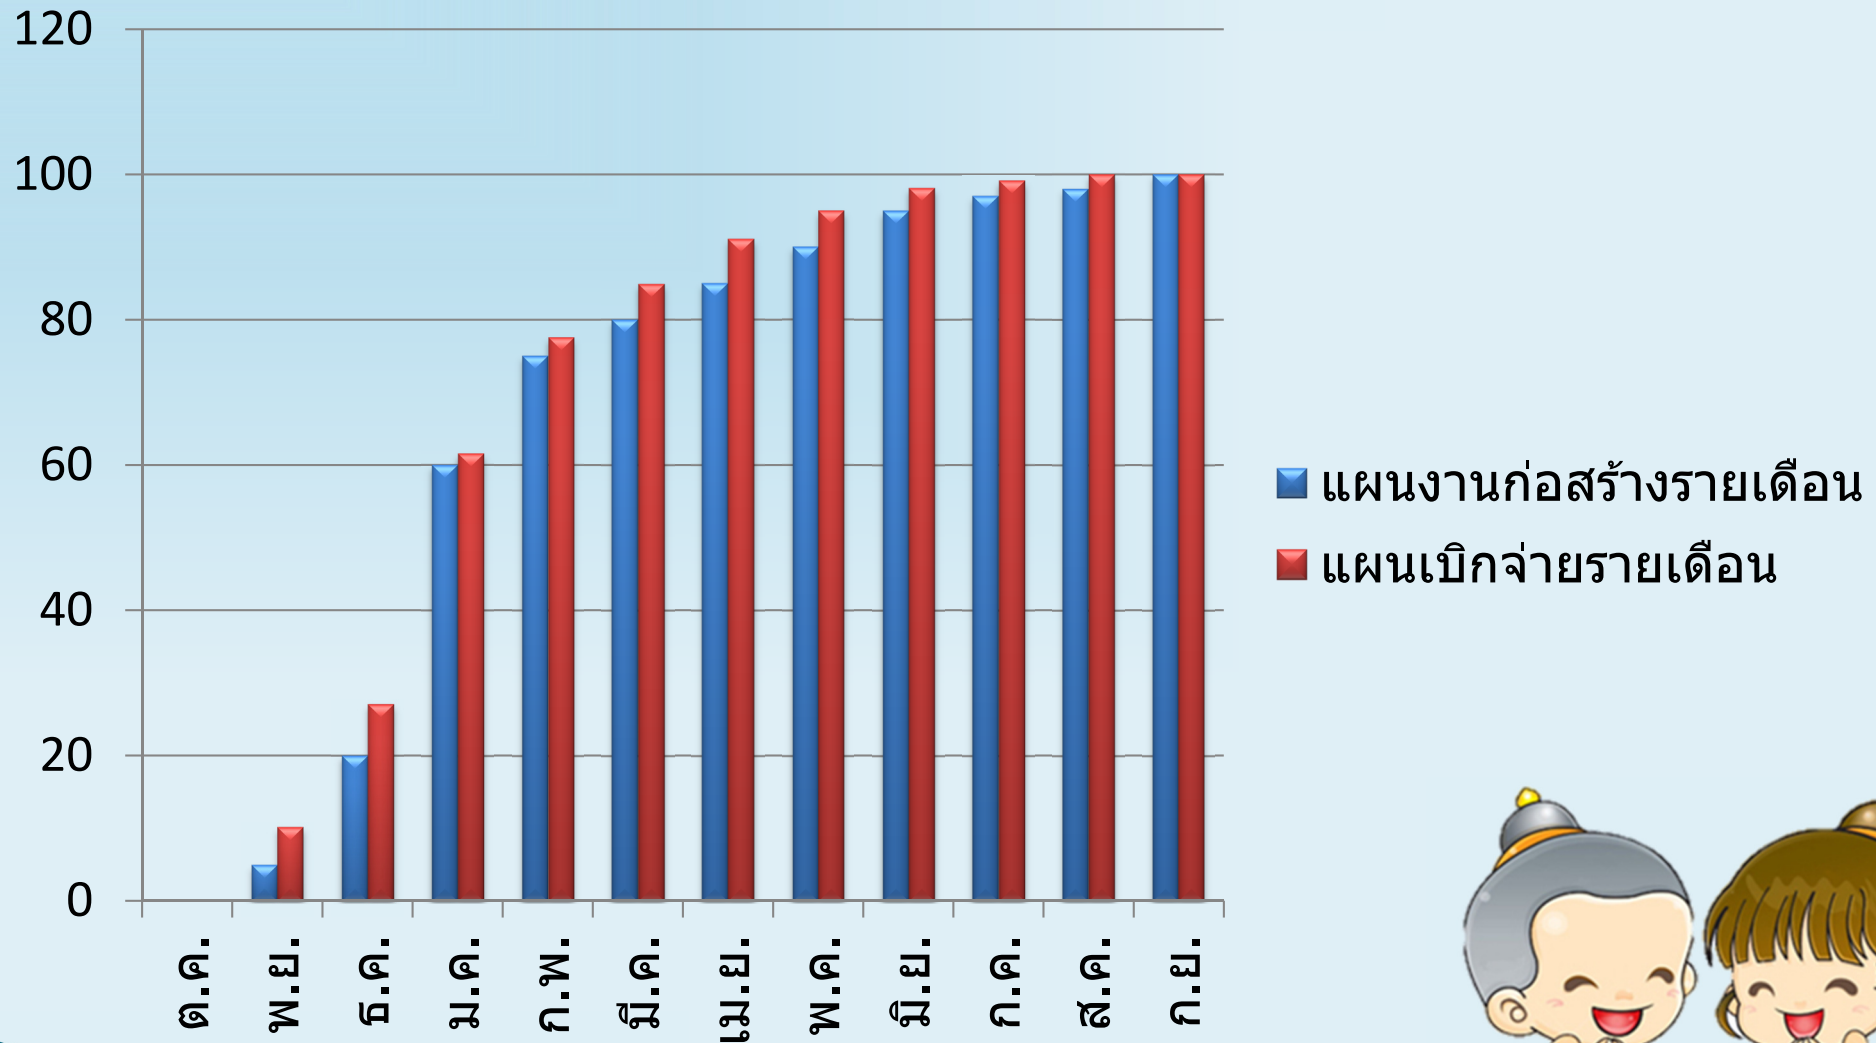

○ แผน/ผล การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนก่อสร้าง

รายการ	แผนดำเนินการ (ระบุเดือน)	ผลดำเนินการ
1. ประชุมประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน	สิงหาคม 2559	16 สิงหาคม 2559
2. ประชุมเจ้าของที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อถามความสมัครใจ ในการเข้าร่วมโครงการ จัดรูปที่ดิน	สิงหาคม 2559	16 สิงหาคม 2559
3. ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน ชุมชน	สิงหาคม 2559	16 สิงหาคม 2559
4. อบรมเกษตรกร หลักสูตร เวทีประชาคมเพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานจัดรูปที่ดิน	พฤษภาคม 2560	17-18 พฤษภาคม 2560
5. ประชุมชี้แจงแผนผังโครงการจัดรูปที่ดิน	ตุลาคม 2560	18 ตุลาคม 2560

- การประชุมประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งสอบถามความสมัครใจ
และชี้แจงแบบเบื้องต้น วันที่ 16 สิงหาคม 2559



- การประชุมชี้แจงแบบก่อสร้าง วันที่ 17 ตุลาคม 2560



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลชุมช้างและตำบลนาหนึ่ง อำเภอโนนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นเขตสำรวจ
เพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗
พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยปรากฏว่า เจ้าของที่ดินบางส่วนในท้องที่ตำบลชุมช้างและตำบลนาหนึ่ง อำเภอโนนพิสัย
จังหวัดหนองคาย ประสงค์และยินยอมให้ทางราชการดำเนินการจัดรูปที่ดินของตน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ในท้องที่ตำบลชุมช้างและตำบลนาหนึ่ง อำเภอโนนพิสัย จังหวัดหนองคาย ภายในแนวเขต
ตามแผนที่สังเขปท้ายประกาศนี้ เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


ปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยู่ธาดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แผนที่สังเขปแสดงเขตท้องที่ตำบลชุมช้าง และตำบลนาหนัง อำเภอยะผิง จังหวัดหนองคาย
เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
แบบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย
ฉบับลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐

๒ กิโลเมตร

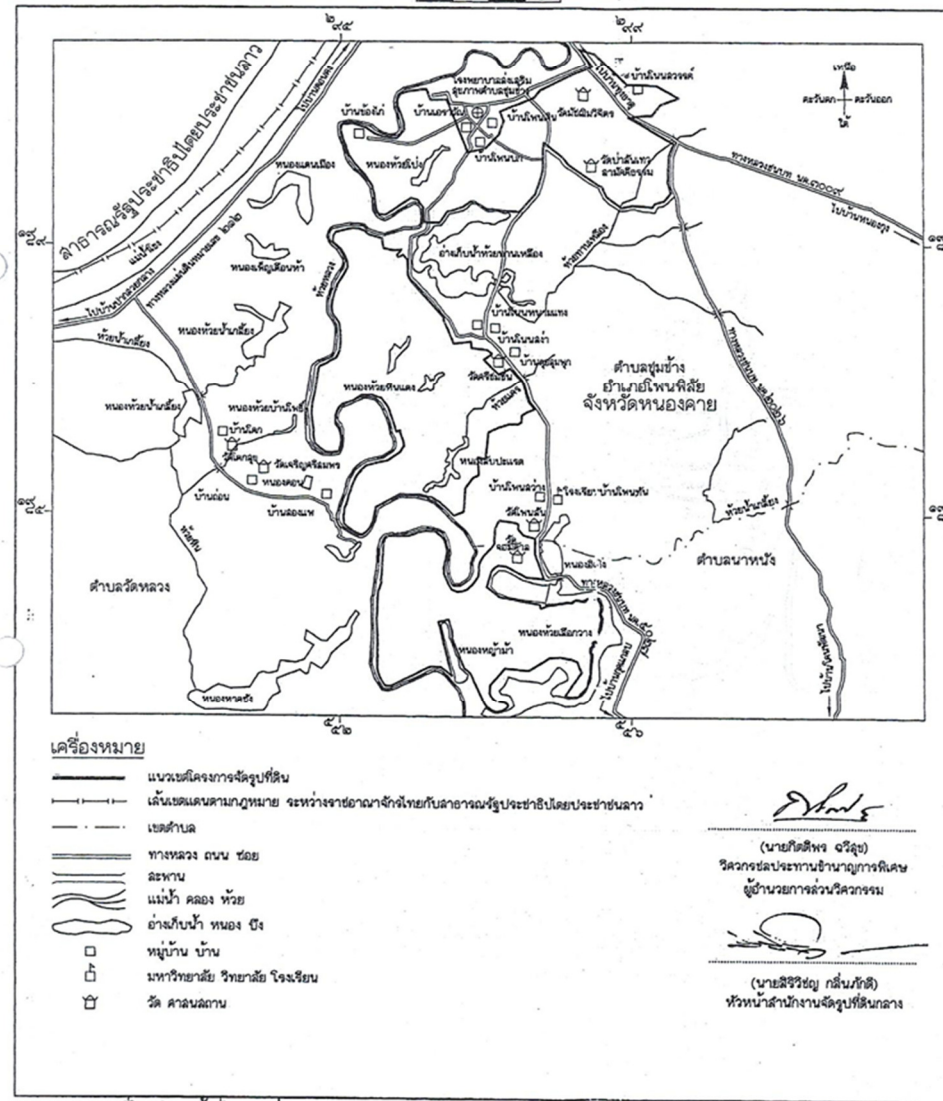

หมายเหตุ แผนที่ในบริเวณนี้อยู่ในแผนที่ลำดับชุด L ๗๐๑๘ ระหว่าง ๕๖๔๔ IV และ ๕๖๔๕ III

- การคัดเลือกคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชน วันที่ 16 สิงหาคม 2559



▶ ระหว่างก่อสร้าง

- แผน/ผล การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ระหว่างก่อสร้าง



- จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร บริหารจัดการน้ำและการผลิตในระดับแปลงเกษตร
- เจ้าของที่ดินมีส่วนร่วมในการวางแผนก่อสร้าง

- การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
 - ภาพงานวางแนวก่อสร้าง



- ภาพงานถมดินบดอัดแน่น



◦ ภาพงานขุดคูส่งน้ำ



- ภาพประกอบงานลาดคูส่งน้ำและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ



- ภาพงานทดสอบความแน่นดิน



• ภาพงานทดสอบส่งน้ำ (วันที่ 24 พฤษภาคม 2561)




- ภาพงานส่งมอบภารกิจบริหารจัดการน้ำให้กลุ่มผู้ใช้น้ำ
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561)



ร้อยละของผลงานและการเบิกจ่ายเทียบกับแผน ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

- ผลงานแล้วเสร็จ 100% ผลเบิกจ่าย 100%

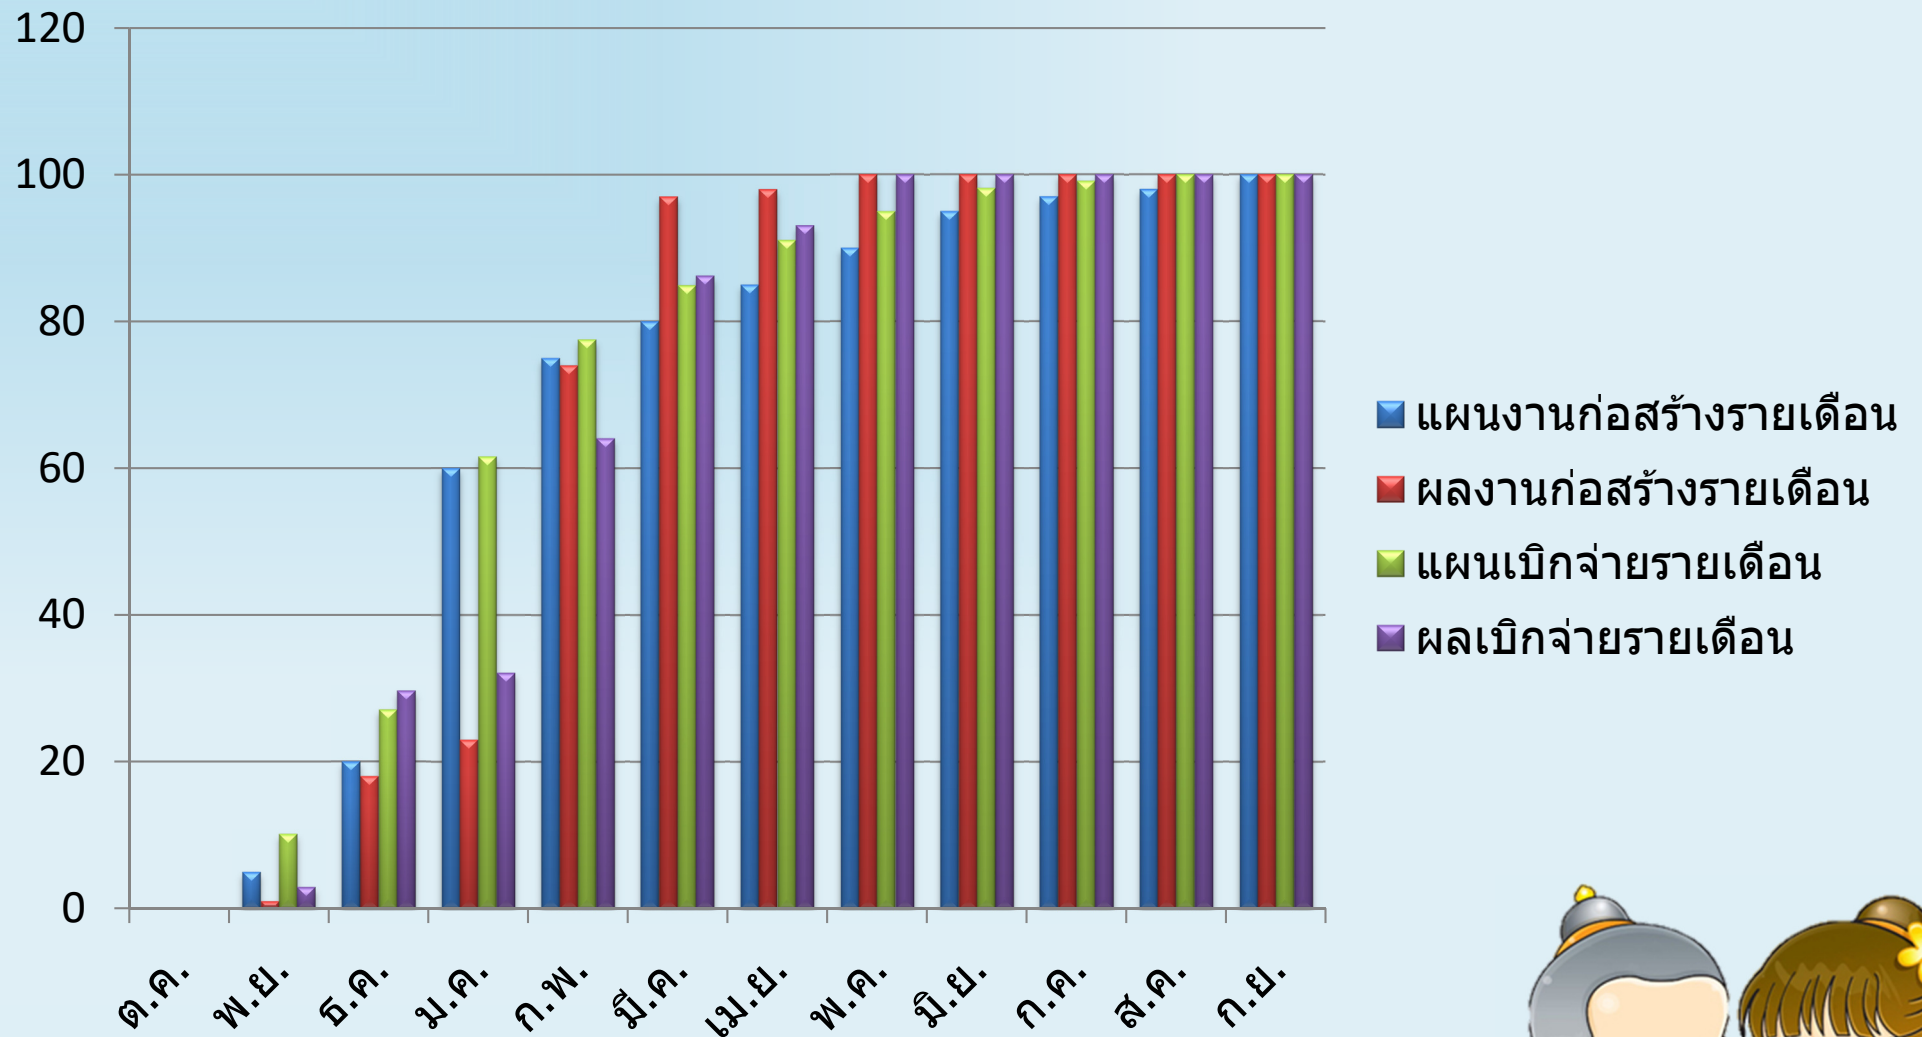

○ ระบบติดตาม (งบประมาณ และผลการเบิกจ่าย)

ระบบติดตาม

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

/ ระบบการติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ /

[หน้าแรก](#) [รายงานต่างๆ](#) [คณะทำงานฯ](#) [เอกสารแนบในระบบฯ](#) [แผนที่ประมาณการ](#) [รายงานสำหรับผู้บริหาร](#)

Logged in: **elc01pnki** [รายการประมาณการ](#) [ผลการจัดซื้อจัดจ้าง](#) [ผลการปฏิบัติงาน](#) [ผลการเบิกจ่าย](#) [Cash Flow](#) [Log out](#)

งบประมาณ และ ผลการเบิกจ่าย

รายการงาน ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10

ชื่องาน / ประมาณการ	ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ	รายงานเบิกจ่ายล่าสุด
	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		
(1.3) งานจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยชุมพุก	8,391,512	0	8,391,512	8,391,512	0	8,391,512	100.00	05/06/2561
งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังพวน (คลอง LMC)	5,000,000	0	5,000,000	1,584,488	0	1,584,488	31.69	05/06/2561
รวมทั้งโครงการ	13,391,512	0	13,391,512	9,976,000	0	9,976,000	74.49	

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)

ระบบติดตาม (ผลการปฏิบัติงาน) ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561

ระบบติดตาม ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

/ ระบบการติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ /

หน้าแรก รายงานต่างๆ คณะทำงานฯ เอกสารแนบประมาณฯ แผนงบประมาณการ รายงานสำหรับผู้บริหาร

Logged in: clc01paki รายการประมาณการ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่าย Cash Flow Log out

ผลการปฏิบัติงาน

รายงานงาน ปีงบประมาณ 2561


สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10

ข้อมูล ณ วันที่ 05/06/2561

ชื่องาน / งบประมาณการ	เป้าหมายทั้งโครงการ (%)			เป้าหมายปีปัจจุบัน (%)			รายงาน ผลงาน ล่าสุด	รายงาน ทั้งหมด
	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง		
(1.3) งานจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก	95.00	100.00	5.00	95.00	100.00	5.00	05/06/2561	รายละเอียด
งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบึงพวน (คลอง LMC)	45.00	10.00	-35.00	45.00	10.00	-35.00	05/06/2561	รายละเอียด

จัดทำโดย RTD HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)

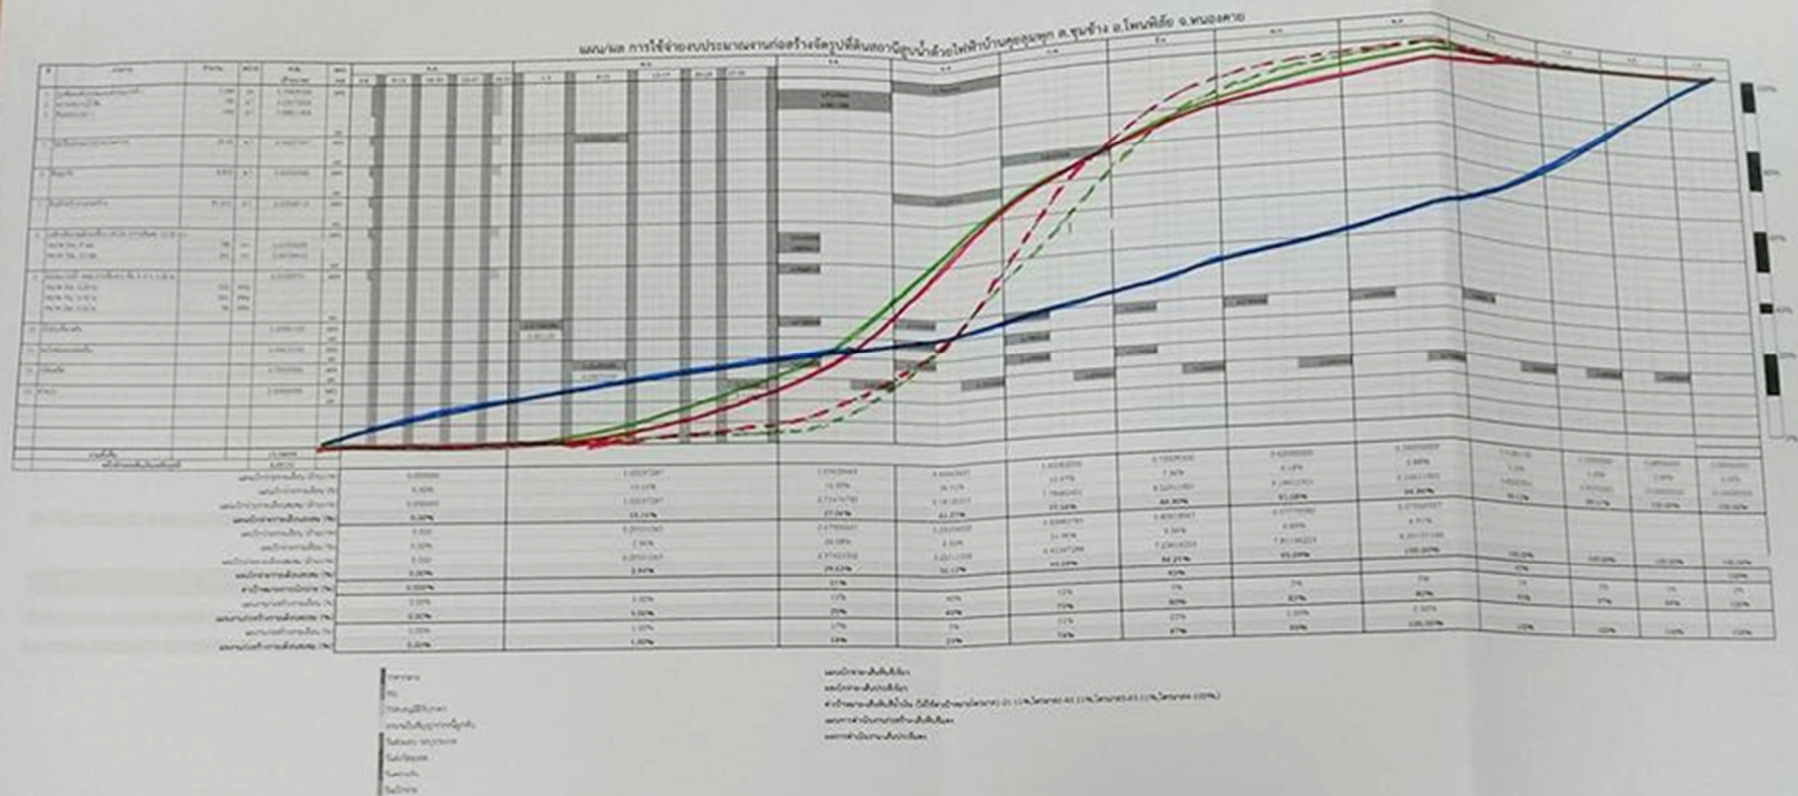


- การแก้ไขแบบก่อสร้าง
 - ได้ส่งหนังสือขออนุมัติแก้ไขแบบให้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางแล้ว
หนังสือที่ สจด/พิเศษ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561



▶ หลังก่อสร้าง

- การเปรียบเทียบปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จกับปริมาณงานตามประมาณการ

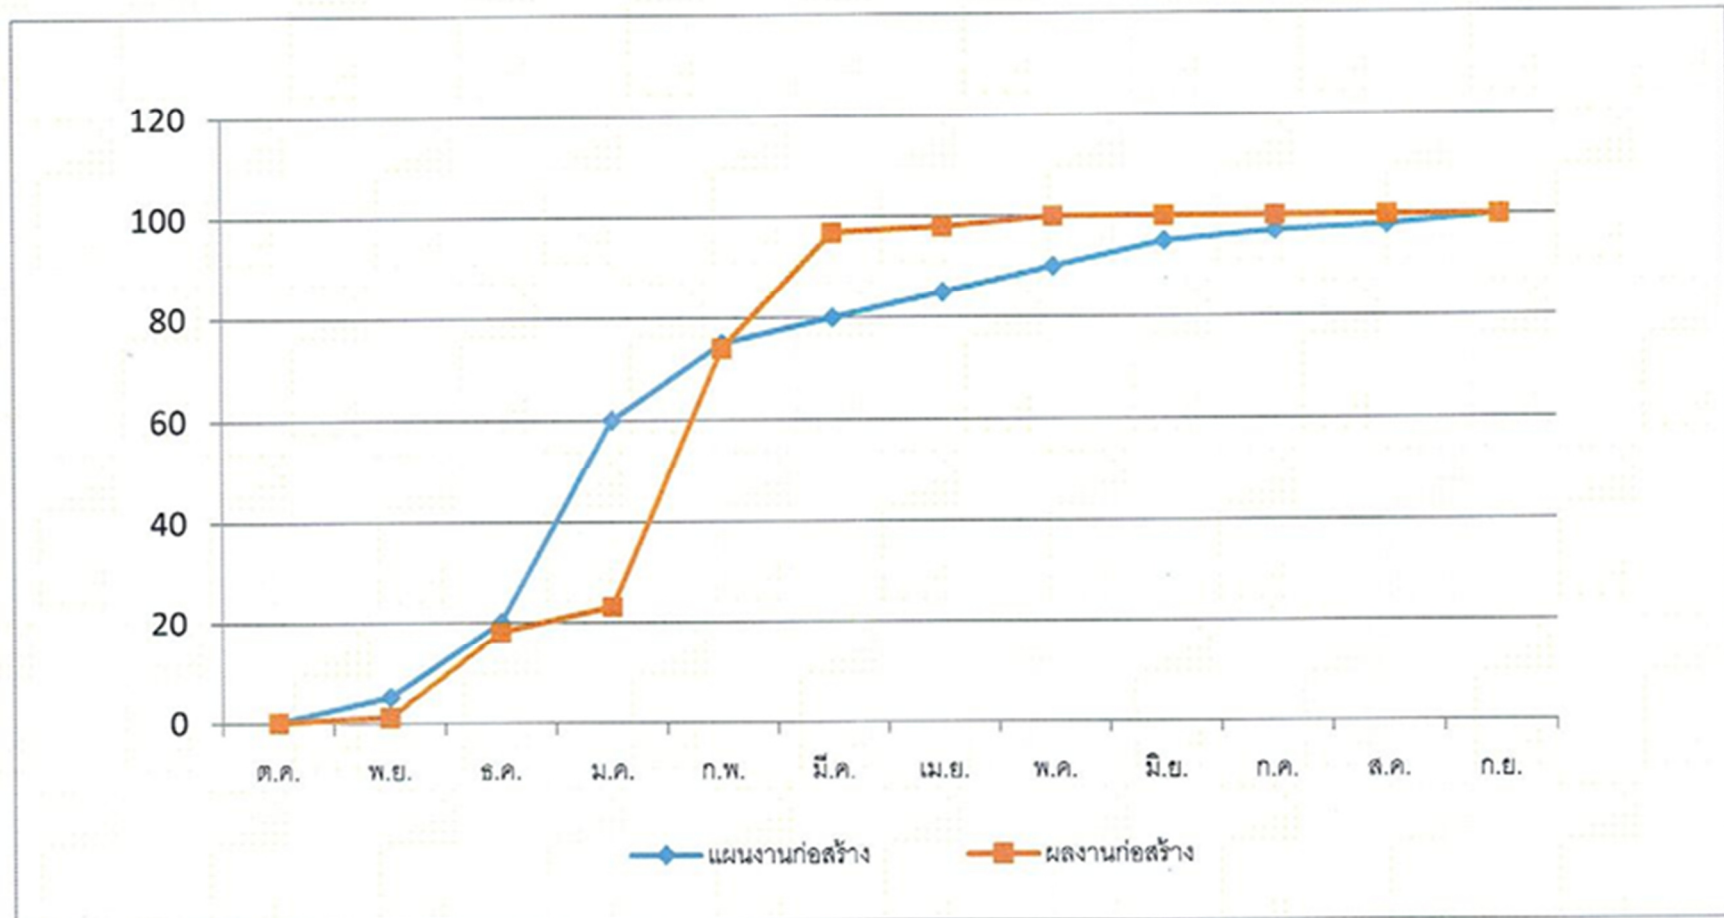

ผลงานครบถ้วนตามแบบรูป

ลำดับ ที่	คู่งน้ำ	ความยาว						ถนน แบบ R	รวม ความ ยาว	หมายเหตุ
		TC1	TC1R	TC3	TC3R	TC4	TC4R			
1	1(RMC)						1150		1150	
2	1.1(RMC)					100			100	
3	1.2(RMC)		180					30	210	
4	1.3(RMC)						355		355	
5	1.5(RMC)		155						155	
6	1.7(RMC)		180					30	210	
7	2(LMC)			500	260				760	
8	2.2(LMC)				170				170	
9	2.6(LMC)			210					210	
10	2.6.1(LMC)			80	90				170	
11	4(LMC)	410	320						730	
12	4.2(LMC)	55							55	
13	6(LMC)	100							100	
14	8(LMC)		390						390	
15	8.2(LMC)		180						180	
16	10(LMC)	270						130	400	
17	12(LMC)	415							415	
รวม		1250	1405	790	520	100	1505	190	5760	

- การทดสอบการส่งน้ำ (วันที่ 24 พฤษภาคม 2561)



- การจัดทำรายงานปิดงาน




- ภาพงานส่งมอบภารกิจบริหารจัดการน้ำให้กลุ่มผู้ใช้น้ำ
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561)



หมวด 3 การบริหารจัดการน้ำ

► การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกับฝ่ายส่งน้ำ/มีกติกากลุ่ม/คณะกรรมการกลุ่ม
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561)

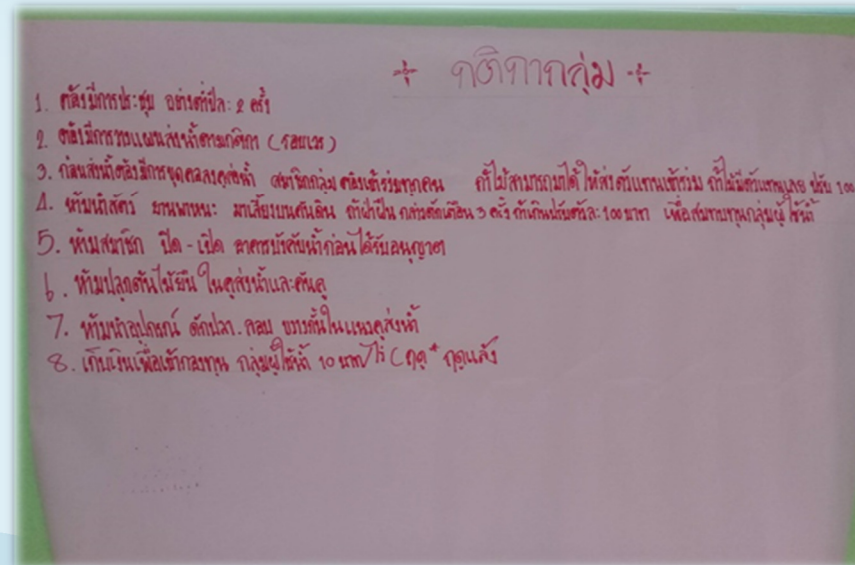

- การจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561)



- เกษตรกรศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย (วันที่ 25 พฤษภาคม 2561)




หมวด 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต


► การจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561)



- ▶ การใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) มาวางแผนการปลูกพืชในพื้นที่(พื้นที่จัดรูปที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง S2)

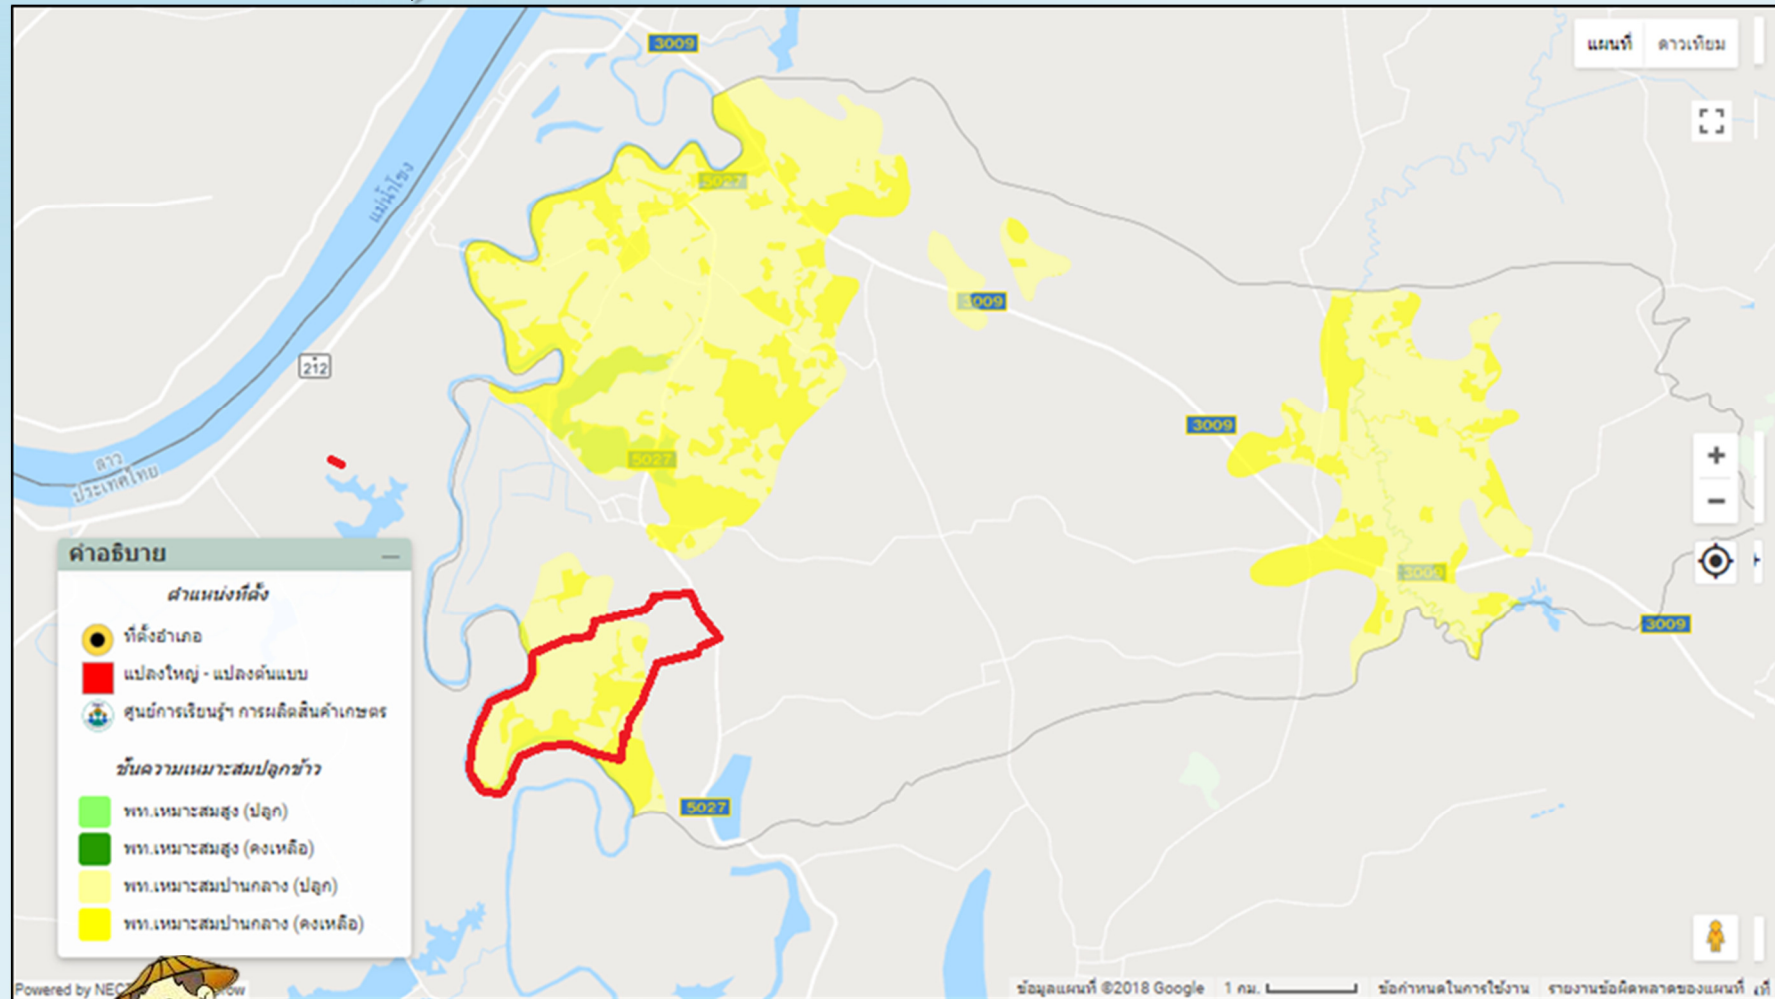

- ▶ การใช้ประโยชน์ในที่ดินมีความเหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (zoning) (พื้นที่เหมาะสมปลูกข้าว)

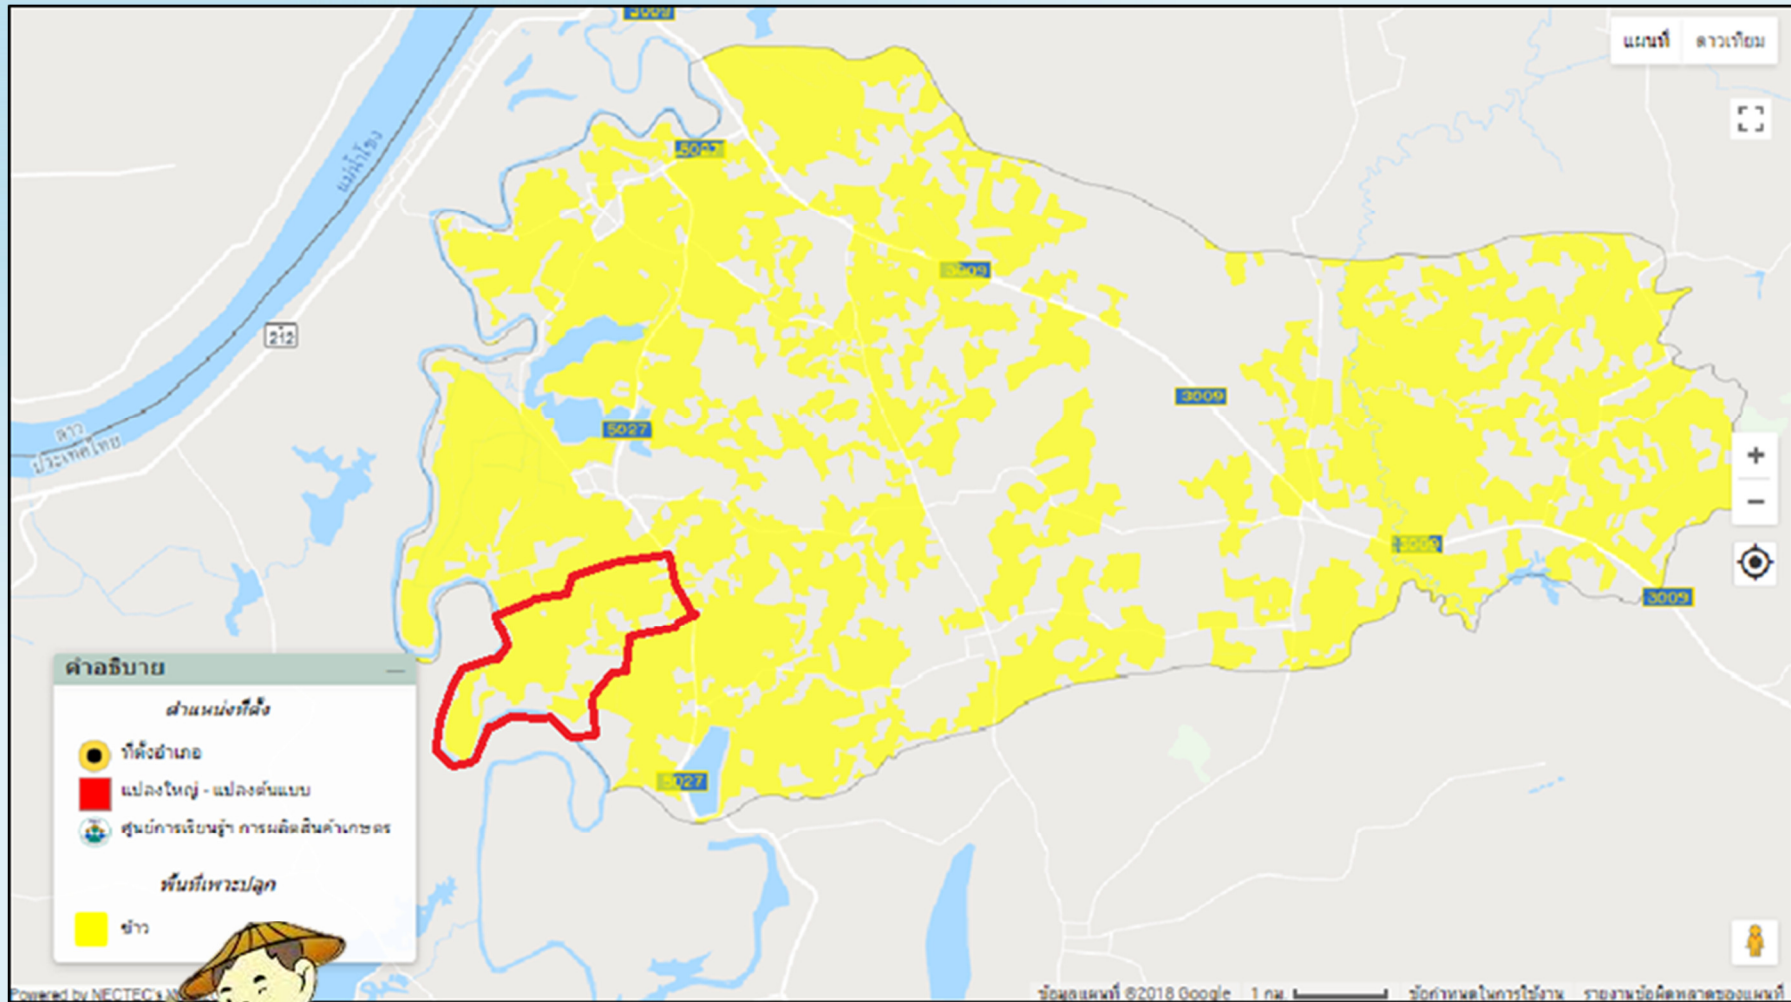

► การประสานแผนงานและบูรณาการ การดำเนินงานกับหน่วยงานใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



กษ. หนองคาย



เกษตรอำเภอ



ชลประทาน
หนองคาย



สหกรณ์จังหวัด
หนองคาย



ปศุสัตว์อำเภอ



ศูนย์วิจัยข้าว



- ▶ การประสานแผนงานและบูรณาการ การดำเนินงานใน 3 ภาคส่วน หรือ ประชารัฐ ได้แก่ รัฐ เอกชน และภาคสังคม



- ส่วนราชการ/อบต./กองทุนฟื้นฟูเกษตร/กลุ่มผู้ใช้น้ำ



- การถ่ายโอนภารกิจกิจกรรมบริหารจัดการน้ำ (วันที่ 24 พฤษภาคม 2561)



- ▶ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกรในพื้นที่
 - อบรมเกษตรกรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานจัดรูปที่ดิน



- ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่



- รับฟังความคิดเห็นเกษตรกรระหว่างงานก่อสร้าง



- เตรียมความพร้อมทดสอบส่งน้ำโดยประสานความร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการผู้ใช้น้ำ



► การสำรวจความพึงพอใจ

1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 ดังนี้
 - ความพึงพอใจมากที่สุด 39.24 ราย คิดเป็น 97.94% ของจำนวนเกษตรกร 40 ราย
 - ความพึงพอใจมาก 0.76 ราย คิดเป็น 1.91 % ของจำนวนเกษตรกร 40 ราย
2. ทัศนคติต่อการก่อสร้างก่อนดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน ดังนี้
 - เกษตรกรมีทัศนคติเห็นด้วยอย่างยิ่ง 39.08 ราย คิดเป็น 97.71% ของจำนวนเกษตรกร 40 ราย
 - เกษตรกรมีทัศนคติเห็นด้วย 0.92 ราย คิดเป็น 2.29% ของจำนวนเกษตรกร 40 ราย
3. ทัศนคติต่อการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน ดังนี้
 - เกษตรกรมีทัศนคติเห็นด้วยอย่างยิ่ง 38.71 ราย คิดเป็น 96.78% ของจำนวนเกษตรกร 40 ราย
 - เกษตรกรมีทัศนคติเห็นด้วย 1.29 ราย คิดเป็น 3.21% ของจำนวนเกษตรกร 40 ราย



- ▶ เกษตรผสมผสาน (มี 2 ราย คาดว่าต่อไปจะมีเพิ่ม มีชุดสระรายใหม่ 3 ราย)



▶ แสดงกลุ่มอาชีพและปัจจัยการผลิต

- บ้านคุยลุมพุกเกษตรกรรมส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเพียงอย่างเดียว



► การเสนอโครงการให้กับ SC/คณะกรรมการด้านการเกษตร

สำเนาฉบับ	
	
ที่ กษ ๐๓๐๙.๑๕/ ๓๖๐	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๐ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๒ ถนนมิตรภาพ นค. ๔๓๐๐๐
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑	
เรื่อง ขอสอนพื้นที่จัดรูปที่ดินเข้าแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย	
เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารข้อมูล	จำนวน ๑ ชุด
ด้วย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๐ ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการจัดรูปที่ดินพื้นที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยมุมทุก ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เนื้อที่ ๑,๗๕๐ ไร่ ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยคูส่งน้ำ ๗ สาย ยาว ๕.๕๗๐ กิโลเมตร ทางลำเลียง ๖ สาย ยาว ๓.๖๒๐ กิโลเมตร เกษตรกรได้รับประโยชน์ ๖๙ ราย ๘๔ แปลง เพื่อให้การบูรณาการพัฒนากิจการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคายเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายด้านการเกษตรของจังหวัดหนองคาย สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๐ ขอสอนพื้นที่จัดรูปที่ดินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยมุมทุก ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายพิจารณานำเข้าแผนพัฒนากิจการเกษตรของจังหวัดหนองคายต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ  (นางมณี วงศ์พาน) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๐	
ฝ่ายวิศวกรรม โทร.๐ ๔๒๔๑ ๓๙๓๘	ร่าง..... พิมพ์..... ตรวจ.....
หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”	



หมวด 5 ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

► ปัญหาอุปสรรค

โครงการจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยมุก ตำบลชุมช้าง อำเภอพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พื้นที่ 1,750 ไร่ การดำเนินงานก่อสร้างพบปัญหาเจ้าของที่ดินไม่อยู่ในพื้นที่ ทำให้การทำงานล่าช้าต้องรอพบเจ้าของที่ดินเพื่อขอความยินยอม แนวก่อสร้าง เจ้าของที่ดินบางรายไม่ยอมให้ก่อสร้างจำเป็นต้องย้าย แนวก่อสร้าง



▶ ข้อเสนอแนะ

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 (สำนักงานจัดรูปที่ดินหนองคาย) ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการจัดรูปที่ดินปีพ.ศ.2551เกษตรกรรมมีความต้องการให้จัดรูปที่ดินจัดประชุมชี้แจงแบบเบื้องต้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ดำเนินการประชุมชี้แจงแบบก่อนก่อสร้างวันที่ 18 ตุลาคม 2560 และดำเนินการก่อสร้างจัดรูปที่ดินตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 แล้วเสร็จ 31 พฤษภาคม 2561

ขอให้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางจัดงบประมาณและบุคลากรดำเนินการสำรวจ ออกแบบให้รวดเร็วกว่านี้ เกษตรกรรอคอยนานมา ซึ่งส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์หน่วยงาน



จบการนำเสนอ

สวัสดีครับ

