



๑๑๖ ปี

ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

งานประกวดโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2561

งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P5 ระยะที่ 4

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

กรมชลประทาน



๑๑๖ ปี

ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

หมวด ๑

ข้อมูลโครงการ

❖ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ ๗ เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ๑๔๘/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๑ โดยกรมฯมีคำสั่งอนุมัติตั้งโครงการ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ และขึ้นตรงกับ สชป.๗ ในขณะนั้น มีที่ทำการตั้งอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแซ่ บ.ม่วงเดียด ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี มีหน้าที่รับผิดชอบพัฒนางานจัดระบบน้ำและจัดรูปที่ดินในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๗ ต่อมาได้ทำการแบ่งส่วนราชการโดยไปขึ้นตรงกับสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็น **สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๕** จนถึงปัจจุบัน



❖ พื้นที่รับผิดชอบ


- รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ ๒ จังหวัด คือ ๑. จังหวัดอุบลราชธานี ๒. จังหวัดยโสธร

❖ อัตรากำลัง

- ข้าราชการ จำนวน ๖ คน
- ลูกจ้างประจำ จำนวน ๒ คน
- พนักงานราชการ จำนวน ๘ คน
- พนักงานกองทุน จำนวน ๒ คน
- ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒๘ คน
- (รวมอัตรากำลังทั้งหมด จำนวน ๔๖ คน)

❖ เป้าหมายในการพัฒนา

- พื้นที่ทั้งหมด ๘๓๖,๑๓๘ ไร่
 - ดำเนินการพัฒนาแล้ว ๓๔๔,๙๙๙ ไร่
 - แบบจัดระบบน้ำ ๓๔๒,๙๙๙ ไร่
 - แบบจัดรูปที่ดิน (Ext) ๒,๐๐๐ ไร่
 - คงเหลือพื้นที่เป้าหมาย ๔๙๑,๑๔๔ ไร่
- (พท.ที่เหมาะสมพัฒนาต่อไป ๔๐๙,๖๓๒ ไร่)



- พท.ได้รับการพัฒนาระบบแล้ว จำนวน 344,999 ไร่
- พท.ไม่เหมาะสมต่อพัฒนา จำนวน 86,552 ไร่
- พท.เหมาะสมต่อการพัฒนาต่อไป จำนวน 404,632 ไร่



๑๑๖ ปี
ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของโครงการเขื่อนยโสธร P๕ ระยะที่ ๔



- [สจจ15 animation 3.avi](#)



๑๑๖ ปี

ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

หมวด ๒

ผลสำเร็จของงาน

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๕ ได้รับงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างงานจัดระบบน้ำ จำนวน ๔ โครงการ และงานสนับสนุนโคกหนองนา จำนวน ๑ โครงการ

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ลำดับที่	รายการ / โครงการ	โอนจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ทำเอง (บาท)	เบิกจ่าย สะสม (บาท)	ผลเบิกจ่าย สะสม (%)	ผลงาน สะสม (%)
<u>แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2561</u>						
1	งานจัดระบบน้ำ โครงการเชื่อมธาตุน้อย P2 (ระยะที่ 4) จ.อุบลราชธานี	10,000,000.00	10,000,000.00	9,934,575.75	99.35	99.13
2	งานจัดระบบน้ำ โครงการเชื่อมยโสธร P5 (ระยะที่ 4) จ.ยโสธร	20,000,000.00	20,000,000.00	17,771,617.17	88.86	89.11
3	งานจัดระบบน้ำ โครงการเชื่อมยโสธร P6/1 (ระยะที่ 4) จ.ยโสธร	20,000,000.00	20,000,000.00	18,209,455.49	91.05	91.01
4	งานจัดระบบน้ำ โครงการเชื่อมธาตุน้อย P1 (ระยะที่ 4) จ.ยโสธร	5,000,000.00	5,000,000.00	4,968,766.03	99.38	99.15
<u>แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1</u>						
1	งานจัดระบบน้ำ โครงการเชื่อมปะอาว PR3 จ.อุบลราชธานี	10,000,000.00	10,000,000.00	2,327,212.25	23.27	25.68

กระบวนการในการดำเนินการของงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P๕ ระยะที่ ๔



๑๑๖ ปี
ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

- ที่ตั้ง สถานีสูบน้ำ P๕ บ.คูสองชั้น ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ในเขตพื้นที่ชลประทาน เขื่อนยโสธร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลำและเซบายล่าง
- เป็นอาคารทดน้ำ ตั้งในลำน้ำชี
- ลักษณะบานเป็น Radial Gate ขนาด ๑๒.๕x๗.๗๕ m. จำนวน ๘ ช่อง
- ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก ๒๒.๔๐ ล้าน ลบ.ม.
- สนับสนุน พท.ขป.ได้ ๗๔,๑๒๓ ไร่
- ส่งน้ำแบบ Pumping เข้าระบบคลองส่งน้ำ จำนวน ๒ สถานี คือ P๕ และ P๖/๑

สถานีสูบน้ำ P๕

- เครื่องสูบน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ ม.
- จำนวน ๕ เครื่อง
- อัตราการสูบสูงสุด ๑.๖๐ ลบ.ม/วินาที/เครื่อง
- สนับสนุน พื้นที่ชลประทาน ๒๕,๕๐๐ ไร่
- พื้นที่ชลประทานของโครงการเขื่อนยโสธร P๕ รวมทั้งสิ้น ๒๕,๕๐๐ ไร่
- ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว จำนวน ๑๘,๒๖๔ ไร่
- คงเหลือพื้นที่ จำนวน ๗,๒๓๖ ไร่
- (เป้าหมายในการก่อสร้าง ปี พ.ศ ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๑๐๐ ไร่)



๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนดำเนินการก่อสร้าง



๒. การสำรวจดินแนว/ตรวจสอบสภาพพื้นที่



๓. ขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง

๓.๑ งานขุดเปิดน้ำดิน



๓.๒ งานดินถมบดอัดแน่น



๓.๓ งานขุดคูส่งน้ำ



๓.๔ งานดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ



๓.๕ คูส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำต่างๆ



๓.๖ การตักแต่งดินคันคลองส่งน้ำ



๓.๗ การทดสอบการส่งน้ำ





๑๑๖ ปี

ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

หมวด ๓

การบริหารจัดการน้ำ



๑๑๖ ปี
ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑



การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกับฝ่ายส่งน้ำ/มิกติกากลุ่ม/คณะกรรมการกลุ่ม

บันทึกแสดงความยินยอมการใช้น้ำและบำรุงรักษา
ของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
โครงการฝายยโสธร P๕ อำเภอ มหาชนะชัย จังหวัด ยโสธร

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้าพเจ้าตั้งมีรายชื่อแนบท้ายข้อตกลงนี้ เป็นผู้ใช้น้ำจากคูส่งน้ำสาย 16 คลอง MC-6R
โครงการ ฝายยโสธร P๕ ได้เลือก นาย ดินจันต์ เหมรัก อายุ ๕๕ ปี
บ้านเลขที่ ๕๔ บ้าน ลำไย หมู่ที่ ๕ ตำบล ลำไย
อำเภอ มหาชนะชัย จังหวัด ยโสธร เป็นหัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำ ข้าพเจ้าทุกคน ซึ่งใน ข้อตกลง
ต่อไป เรียกว่าสมาชิกผู้ใช้น้ำและหัวหน้ากลุ่ม ผู้ใช้น้ำ ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลง กลุ่ม
ผู้ใช้น้ำ โดยมีผลให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นผู้เปิดหรือปิดอาคารบังคับน้ำ จัดสรรน้ำแบ่งปันน้ำแก่สมาชิก
สมาชิกผู้ใดฝ่าฝืน จะต้องถูกปรับ ครั้งละ ๑๐๐ บาท ยกเว้นได้รับอนุญาตจากหัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำ

ข้อ ๒ การกำหนดให้รับน้ำแบบรอบเวร ผู้ใดลักเปิดน้ำ ปิดกั้นคูน้ำ เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นที่อยู่ถัดไป
ได้รับน้ำไม่สะดวกตามปกติ ในเมื่อยังไม่ถึงกำหนดรับน้ำ หรือเมื่อพ้นกำหนดรับน้ำของตนไปแล้ว
ถ้าฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับครั้งละ ๑๐๐ บาท และจะต้องรื้อถอนสิ่งปิดกั้นทางน้ำออกให้เสร็จ

ข้อ ๓ ผู้ใดขุด ตัดฟัน ทำลายคันคลอง คูน้ำ หรือทำให้อาคารแบ่งน้ำ อาคารบังคับน้ำหรืออาคาร
ใดๆ ก็ตามในระบบส่งน้ำเสียหาย จะต้องถูกปรับครั้งละ ๕๐๐ บาท และต้องซ่อมแซมให้ดังเดิม
ถ้ายังฝ่าฝืนให้หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำ ดำเนินการซ่อมแซม โดยคิดค่าเสียหาย จากผู้ฝ่าฝืนนั้นและเรียกปรับ
ผู้ฝ่าฝืน วันละ ๕๐๐ บาท จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ข้อ ๔ สมาชิกต้องมีส่วนร่วมในการขุดลอก คลอง และคูน้ำซ่อมแซมและดูแลรักษา คัน - คูน้ำ
ตามกำหนดเวลาที่หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำกำหนด ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับวันละ ๑๐๐ บาท เว้นแต่ส่งคนมา
ทำงานแทน ซึ่งผู้มาทำงานแทน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี และอายุไม่เกิน ๕๐ ปี

ข้อ ๕ กรณีผู้ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ข้อหนึ่งข้อใดเป็นหัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำ หรือผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำ
จะต้องถูกปรับ ๑ เท่า ของสมาชิกและบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนให้รวมถึงการกระทำของบุคคลซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของสมาชิกด้วย

ข้าพเจ้า ผู้เป็นสมาชิกทุกคนยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ทุกประการและยินยอมให้ข้อตกลงนี้
เป็นหลักฐานในการดำเนินการทางกฎหมายที่อาจจะพึงมี จึงลงลายมือชื่อรับรองไว้ท้ายข้อตกลงนี้เพื่อ
เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน (คูส่งน้ำสาย 16 คลอง MC-6R)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลายมือชื่อ	หมายเลขแปลง	ตำแหน่ง
1	นาย ดินจันต์ เหมรัก		26/4	
2	นาย จรัส ศรีสมพร		23/4	
3	นาย นวช พันธุ์		60/4	
4	นาย ทนตอง พันพวง		59/4	
5	นาย ทนตอง พันพวง			
6	นาย วิชาญ ศรีแก้ว			
7	นาย จอรรณ ศรีพวง		27/4	
8	นาย ชลวิทย์ ศรีพวง		30/4	
9	นาย ทนตอง พันพวง			
10	นาย ทนตอง พันพวง			
11	นาย ชลวิทย์ ศรีพวง		33/4	
12	นาย จอรรณ ศรีพวง			
13	นาย ชัยวัฒน์ ศรีพวง			
14	นาย วิชาญ ศรีพวง		98/4	
15	นาย วิชาญ ศรีพวง		47/4	
16	นาย ชัยวัฒน์ ศรีพวง		105/4	

ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของบุคคลข้างต้นจริง

(ลงชื่อ) หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำ

(นาย ดินจันต์ เหมรัก)

(ลงชื่อ) พยานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

(นาย นวช พันธุ์)

(ลงชื่อ) พยาน เจ้าหน้าที่ชลประทาน

(นาย จอรรณ ศรีพวง)

(นาย ชัยวัฒน์ ศรีพวง)


❖ การจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ



❖ การบริหารจัดการน้ำในระดับคูส่งน้ำ/รอบเวร

- การบริหารจัดการน้ำของงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P๕ ระยะที่ ๔ ได้แบ่งพื้นที่การส่งน้ำ แบ่งออกเป็น ๔ โซน การส่งน้ำโดยแบ่งรอบเวร โซนละ ๑๐-๑๕ วัน
- โซน ๑ พื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลหัวเมือง ๑๒ หมู่บ้าน คือ บ้านนาดี หมู่ ๗ นาอุดม หมู่ ๑๔ บ้านหัวเมือง หมู่ ๑,๘,๙ บ้านหนองยาง หมู่ ๓,๑๐ บ้านคูสองชั้น หมู่ ๑๓,๑๔ บ้านกุดพันเขียว หมู่ ๕, ๑๑ บ้านหนองบัว หมู่ ๒ บางส่วน และพื้นที่ตำบลพระเสาร์ ๔ หมู่บ้าน คือ บ้านโนนยาง หมู่ ๑๐,๑๓ บ้านหัวดง หมู่ ๖,๙
- โซน ๒ พื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลคูเมือง ๑๐ หมู่บ้าน คือ บ้านคูเมือง หมู่ ๑,๑๑ บ้านคุ้ม หมู่ ๒,๖,๙ บ้านพลไวก หมู่ ๓,๘, บ้านสำโรง หมู่ ๗,๑๐ บ้านขาม หมู่ ๕
- โซน ๓ พื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตำบลฟ้าหยาด ๑๐ หมู่บ้าน คือ บ้านฟ้าหยาด หมู่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙ บ้านเหมือดหมู่ ๕ บ้านป่าตอง หมู่ ๗ บ้าน โนนธาตุ หมู่ ๖ บ้านดงเจริญหมู่ ๑๐
- โซน ๔ พื้นที่ครอบคลุม พื้นที่ตำบลผือฮี ๒ หมู่บ้าน คือ บ้าน ผือฮี หมู่ ๑,๘

โครงการเขื่อนลือธร P.5 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

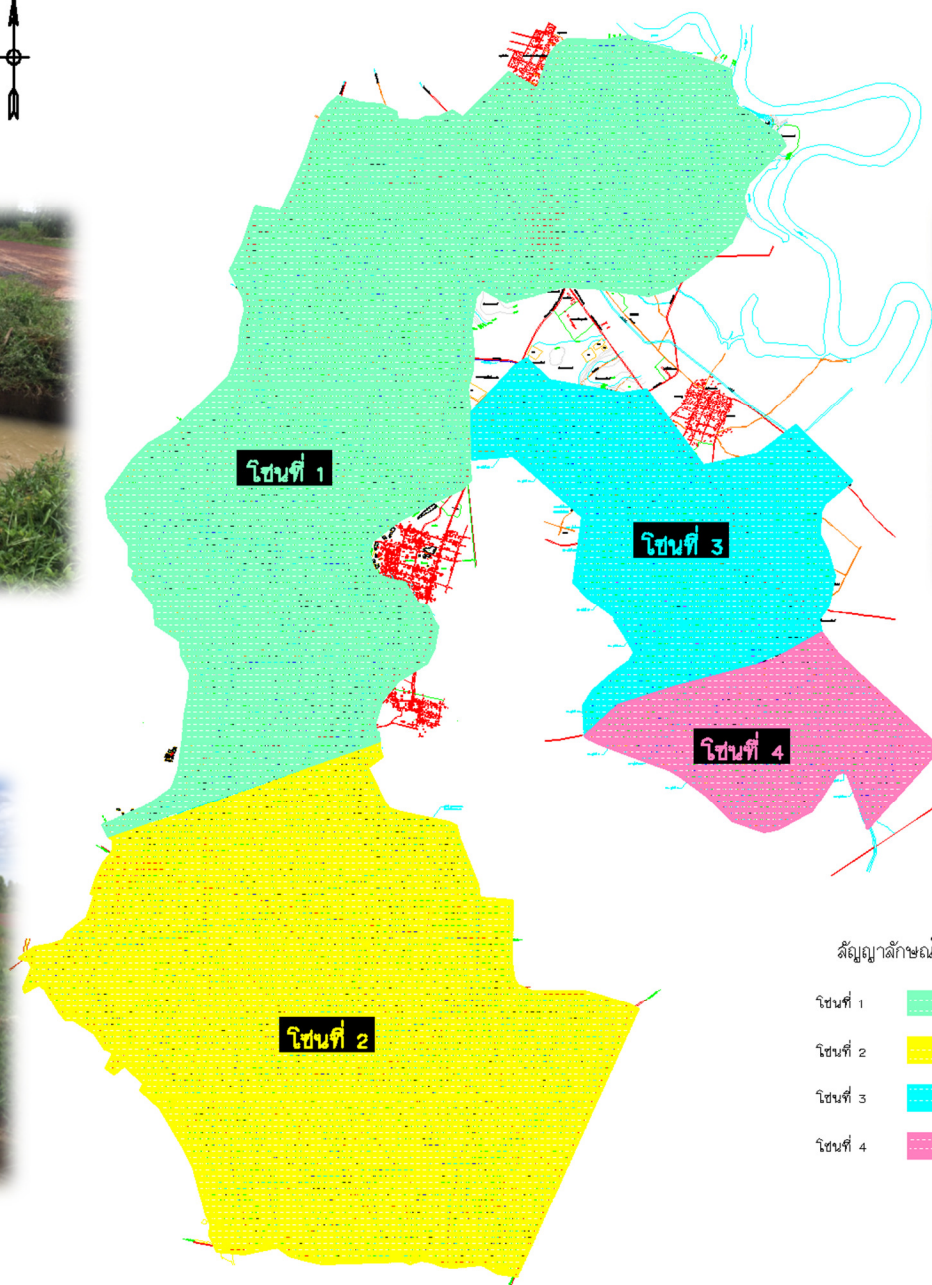

❖ ด้านความพึงพอใจของเกษตรกร



❖ DSCN๑๐๑๑~๑.mp๔

❖ สอบถามความคิดเห็นในการสร้างคลองเพิ่ม.mp๔

❖ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำและโครงการจัดระบบน้ำฯ ร่วมกันขุดลอกตะกอนที่อยู่ในคลองเพื่อทำ
ความสะอาดคลองส่งน้ำ



❖ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา



❖ [ชุดลอกคลองส่งน้ำ.mp4](#)



๑๑๖ ปี

ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

หมวด ๔

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำ การผลิตในระดับแปลงเกษตร ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ



การประสานแผนงาน และ บูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
หน่วยงานนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาให้ความรู้กับเกษตรกร



ปริมาณการผลิต

ข้าว ในปี 2559/60 ตำบลหัวเมือง. มีการผลิต

ข้าวเจ้า พื้นที่ปลูก 19,189 ไร่ ผลผลิต 7,675.60 ตัน

ข้าวเหนียว พื้นที่ปลูก 7,913 ไร่ ผลผลิต 3,323.46 ตัน

รวมผลผลิตทั้งหมด 10,999.16 ตัน

ใช้บริโภคในครัวเรือน 3,366 คัน

ใช้ทำพันธุ์ 222 ต้น

เลียงสัตว์ 82 ตัน

จำหน่าย 7,329.16 คัน

ถั่วลิสง ปริมาณการผลิต 3 ดัน เพื่อการจำหน่ายเป็นส่วนใหญ่

ข้าวนาปรัง ปริมาณการผลิต 4,725 ตัน เก็บไว้บริโภคและจำหน่ายบางส่วน

ปลูกล้วย ปริมาณผลผลิต โค 1,538 ตัว กระบือ 625 ตัว สุกร 636 ตัว เป็ด 4,746 ตัว

[illegible]

ตารางสรุปตัวชี้วัดการเพิ่มผลผลิต

ผลการประเมินตามกรอบดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการจัดรูปที่ดิน

เขตพื้นที่ โครงการเขื่อนยโสธร P๕ ระยะที่ ๔ ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ดัชนี	หน่วย	พื้นที่จัดรูปที่ดินแล้ว	พื้นที่ยังไม่จัดรูปที่ดิน	เขตชลประทานยังไม่จัดรูปที่ดิน	หมายเหตุ
๑. อัตราการใช้ดิน	%				
๒. ผลผลิตข้าว					
๒.๑ ข้าวนาปี	กก./ไร่	๕๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	
๒.๒ ข้าวนาปรัง	กก./ไร่	๖๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	
๒.๓ ผลผลิตข้าว (รวม)	กก./ไร่	๑,๑๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๘๓๐.๐๐	
๓. รายได้สุทธิจากข้าว					
๓.๑ ข้าวนาปี	บาท/ไร่	๗,๕๐๐.๐๐	๖,๗๕๐.๐๐	๖,๗๕๐.๐๐	
๓.๒ ข้าวนาปรัง	บาท/ไร่	๙,๐๐๐.๐๐	๖,๗๕๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	
๓.๓ รายได้สุทธิจากข้าว (รวม)	บาท/ไร่	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๒,๔๕๐.๐๐	
๔. ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต					
๔.๑ ข้าวนาปี	บาท/ไร่	๓,๕๗๕.๐๐	๕,๕๒๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	
๔.๒ ข้าวนาปรัง	บาท/ไร่	๓,๗๗๕.๐๐	๕,๗๒๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	
๕. ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ					
๕.๑ หอมแดงสด	กก./ไร่	๗,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
๕.๒ หอมแดงแห้ง	กก./ไร่	๓,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
๕.๓ ถั่วลิสงแห้ง	กก./ไร่	๓๐๐ กก.	๒๕๐ กก.	๒๗๐ กก.	

ผลสัมฤทธิ์

๑. ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น
๒. เกษตรใช้พื้นที่เพาะปลูกได้ปีละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง
๓. รายได้สุทธิของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น
๔. ลดต้นทุน จากค่าแรง/ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานฯลฯ
๕. ลดความเสี่ยงในการทำเกษตรกรรม เสริมสร้างความมั่นคงทางน้ำ
๖. เกษตรกรมีความสุข





๑๑๖ ปี

ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

หมวด ๕

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวความคิด การนำเสนอ และอื่นๆ

❖ ปัญหา

เดิมการก่อสร้างคลองส่งน้ำมีการได้รับเงินเวนคืนที่ดินจากกรมชลประทาน แต่การก่อสร้างของงานระบบจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ไม่มีการจ่ายเงินค่าที่ดินให้กับเกษตรกรซึ่งทำให้เกษตรกรไม่ยอมเข้าร่วมโครงการงานจัดระบบน้ำในเขตพื้นที่ของตนเอง

❖ วิธีแก้ปัญหา

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานควรลงพื้นที่บ่อยครั้งให้มากกว่าที่เคยปฏิบัติเพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร



❖ ข้อเสนอแนะ

- ความรวดเร็วในการก่อสร้างคูส่งน้ำทำอย่างไร
 - ตรวจสอบแนวก่อสร้างในสายคลองต่างๆที่ได้รับงบประมาณ
 - ตรวจสอบพื้นที่เขตก่อสร้างว่าเราสามารถทำในพื้นที่ไหนก่อนได้
 - ประสานผู้นำชุมชนในการที่เกษตรกรรายใดที่จะบริจาคดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
- เมื่อเกษตรกรไม่ยินยอมให้ก่อสร้างคูส่งน้ำมีวิธีแก้ไขอย่างไร
 - พุดคุยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรที่ไม่ยินยอม โดยประสานกับผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียในสายคลองที่เกษตรกรไม่ยินยอม



๑๑๖ ปี
ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

จบการนำเสนอ



สวัสดี
เจ้าของค่ะ
